



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



L'attuazione della "legge obiettivo"

*6° Rapporto per la VIII Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici*

*in collaborazione con
l'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

n. 268/3
Tomo VI

5 settembre 2011

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

L'attuazione della "legge obiettivo"

*Schede relative agli
interventi deliberati dal CIPE*

*6° Rapporto per la VIII Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici*

n. 268/3

Tomo VI

5 settembre 2011

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

☎ 066760-4548 / 066760-9253 – ✉ st_ambiente@camera.it

Il presente Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 16 dicembre 2010.

I testi e le tabelle sono stati redatti dall'Istituto di ricerca CRESME, in collaborazione con l'Istituto NOVA.

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

per il CRESME: Alfredo Martini, Mercedes Tascedda, Marco Paolacci, Gianni Stifani, Alessandra Santangelo;

per NOVA: Piero Fazio, Anna Nota.

Documentazione e ricerche:

- L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, n. 268 , 5 settembre 2011
- L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici - Tabelle sullo stato degli interventi, n. 268/1 , 5 settembre 2011
- L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Opere strategiche e contesto regionale, n. 268/2 , 5 settembre 2011
- L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici - Schede relative agli interventi deliberati dal CIPE, n. 268/3 , 5 settembre 2011 (tomo I, II, III, IV, V e VI)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0244c.doc

In copertina: Walter Valentini, "Costellazione I", collezione della Camera dei deputati

INDICE

TOMO I

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	1	Galleria di sicurezza (parte italiana)	1
CLO	2	Frejus ferroviario - Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione	13
CLO	3	Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero	31
CLO	4	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Lotti 1, 2	49
CLO	5	Linea AV/AC Milano-Verona	59
CLO	6	Potenziamento della linea Seregno-Bergamo (Gronda ferroviaria nord est di Milano)	77
CLO	7	AV/AC Verona-Padova	83
CLO	8	Nodo AV Verona	91
CLO	9	Riqualficazione della linea ferroviaria Saronno – Seregno	97
CLO	10	Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato	103
CLO	11	Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina	111
CLO	12	Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate	117
CLO	13	Opere connesse all'EXPO: tratta Rho-Gallarate e Raccordo Y per la connessione diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa	129
CLO	14	Nuovo collegamento ferroviario nodo urbano di Torino: potenziamento linea ferroviaria Torino Bussoleno e cintura merci	145
CLO	15	Ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino a Villesse	153

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	16	Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale	173
CLO	17	Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia	179
CLO	18	Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari	189
CLO	19	Tronco 2 - Novara - Milano esclusa variante di Bernate Ticino	199
CLO	20	Variante di Bernate (dal km 98+027 al km 103+220)	211
CLO	21	SS n. 38 : Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano -1° Lotto	219
CLO	22	Collegamento tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino	231
CLO	23	Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara	239
CLO	24	Autostrada Asti-Cuneo 4. Massimini-Cuneo: Lotto 1.6. Tangenziale di Cuneo	245
CLO	25	Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse	251
CLO	26	Collegamento Lecco-Bergamo: variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte	265
CLO	27	Collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco	275
CLO	28	Collegamento Lecco-Bergamo: Calusco d'Adda-Terno d'Isola	281
CLO	29	Pedemontana Veneta - Montecchio	287

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
		Maggiore (Vi) - Spresiano (TV)	
CLO	30	Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (BreBeMi)	295
CLO	31	Passante esterno di Mestre e opere complementari	303
CLO	32	Tangenziale est esterna di Milano	311
CLO	33	(P) Ammodernamento del tratto da Peschiera Borrono a Spino d'Adda (escluso ponte)	319
CLO	34	(P) Riqualifica Viabilità ex S.S. 415 "Paullese" - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda	327
CLO	35	(P) Autostrada Medio Padana Veneta - Nogara (VR)-Mare Adriatico	333
CLO	36	Raddoppio Pontremolese: completamento	339
CLO	37	Raccordo autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Pr) – Nogarole Rocca (Vr)	357
CLO	38	Tratta Andora - Finale Ligure	369

TOMO II

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	39	"Terzo valico dei Giovi" linea AV/AC Milano-Genova	375
CLO	40	Potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole	387
CLO	41	Completamento raddoppio Messina-Catania: potenziamento della linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo	399
CLO	42	Velocizzazione linea Catania Siracusa 1ª fase funzionale - tratta Bicocca-Targia	405
CLO	43	Opere connesse al Ponte sponda calabrese - Variante alla linea ferroviaria	411

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
		Salerno-Reggio Calabria in località "Cannitello"	
CLO	44	Adeguamento S.S. 28 - Variante tra Pieve di Teco e Ormea, con traforo di valico Armo-Cantarana	419
CLO	45	Adeguamento S.S. 28 - Variante all'abitato di Imperia - Aurelia bis	427
CLO	46	Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	433
CLO	47	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	457
CLO	48	Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia	463
CLO	49	Adeguamento SS. 156 dei Monti Lepini - 2° lotto Pontinia-Sezze	477
CLO	50	Itinerario A 12-Pontina-Appia: Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia	483
CLO	51	Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma-Latina e Cisterna-Valmontone	489
CLO	52	S.S. 7 quater Domitiana - Lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone	501
CLO	53	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	511
CLO	54	Autostrada Messina - Palermo: completamento	637
CLO	55	Nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa: tratto compreso tra Passo Martino e il km 130+400 della SS 114	741

TOMO III

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	56	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle	747
CLO	57	Itinerario Ragusa – Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	757
CLO	58	SS 121 - Ammodernamento a quattro corsie - Tratta Palermo innesto con la SS 189 (Lercara Friddi)	765
CLO	59	Collegamento Orte-Falconara con la Linea Adriatica - Nodo di Falconara	777
CLO	60	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari – Taranto - Tratta Bari Sant'Andrea-Bitetto	789
CLO	61	Ammodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria Di Leuca)	795
CLO	62	Completamento funzionale SS 16 – SS 613 - Variante esterna di Lecce	803
CLO	63	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse	809
CLO	64	Progetto per la salvaguardia della laguna e della città' di Venezia: sistema MO.S.E.	817
CLO	65	Ponte sullo Stretto di Messina	829
CLO	66	Raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano	837
CLO	67	Raddoppio Terni-Spoleto	843
CLO	68	Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	849
CLO	69	Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	859
CLO	70	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotti 5-6-7-8	865
CLO	71	Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna	871
CLO	72	Nodo stradale di Perugia	931

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	73	Strada della Tre Valli - Tratto Eggi-S. Sabino	935
CLO	74	Strada della Tre Valli - Tratto Eggi (Spoleto) – Acquasparta	941
CLO	75	Direttrice Civitavecchia – Orte – Terni – Rieti - Tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale	947
CLO	76	Tronco Antrodoco-Navelli: Variante Sud all'abitato di L'Aquila Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la SS 17ter - 2° Lotto	957
CLO	77	Benevento-Caserta A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta - Itinerario Caianello (A 1) - Benevento - Adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900	963
CLO	78	Benevento-Caserta A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta - Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero	969
CLO	79	SS 106 Jonica - Megalotto 5bis-Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto (quattro corsie) - Dal Km 49+485 al Km 51+750	983
CLO	80	SS 106 Jonica - Megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace (km 178+350) a Simeri Crichi (km 191+500) e prolungamento della SS 280; SS 106 lotti 1, 2, 3, 4, 5 (quattro corsie); SS 280 lotti 1, 2 (quattro corsie)	989
CLO	81	SS 106 Jonica - Megalotto 4 - Tratto 9° - Variante di Nova Siri, tra i km 414+080 e km 419+300 (quattro corsie)	995
CLO	82	SS 106 Jonica - Megalotto 3 - Tratto 7° da Mandatoriccio a Amendolara, lotti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (quattro corsie); tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotto 1 stralci 1 e 2 (quattro corsie)	1003
CLO	83	Programma Grandi Stazioni	1011

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	84	Metrotranvia di Milano Parco Nord-Desio-Seregno	1037
CLO	85	Prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate	1043
CLO	86	Prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato a Paullo	1049
CLO	87	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Linate - Lotto 1 San Cristoforo-Sforza Policlinico	1055
CLO	88	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Linate - Lotto 2 Sforza Policlinico-Linate	1063
CLO	89	Prolungamento della linea metropolitana M5 da Garibaldi a San Siro	1073
CLO	90	Prolungamento della linea metropolitana M1 dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho compresa l'acquisizione di materiale rotabile (13 treni)	1081
CLO	91	Accessibilità Fiera di Milano - Nodo d'interscambio AC/SFR/MM trasporto pubblico e privato su gomma	1087
CLO	92	Accessibilità stradale Fiera di Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Pero" e della SS 33 del Sempione - Realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di 6 svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale.	1095

TOMO IV

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	93	Torino metropolitana - Linea 1 - Prolungamento sud -Tratta funzionale 4: Lingotto-Nizza-Bengasi	1111
CLO	94	Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto Fs-Monza Bettola	1119
CLO	95	Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - Tratta Garibaldi-Bignami compresa variante Stazione Garibaldi F.S.	1127
CLO	96	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino-S.Eufemia	1135
CLO	97	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - II fase tratte Vicenza/Castelfranco, Treviso/Conegliano, Quarto d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice	1143
CFI	98	Aeroporto di Vicenza	1149
CFI	99	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	1157
CFI	100	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	1167
CLO	101	Bologna metropolitana - Linea 1 Fiera Michelino - Stazione FS - Ospedale Maggiore -Capolinea Normandia Borgo Panigale	1179
CLO	102	Trasporto rapido costiero (TCR) Rimini Fiea – Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini Fs - Riccione Fs	1193
CLO	103	Allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino	1201
CLO	104	Completamento G.R.A. di Roma	1209
CLO	105	Linea C della metropolitana di Roma	1231

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	106	Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Dante - Garibaldi - Centro direzionale	1249
CLO	107	Completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli	1257
CLO	108	Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Centro Direzionale-Capodichino	1269
CLO	109	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interramento Stazione di Pompei e completamento raddoppio binario	1277
CLO	110	Collegamento linea Alifana - Linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Aversa Centro-Piscinola	1283
CLO	111	Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola - Aversa Centro	1293
CLO	112	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento su ferro tra le linee Circumflegrea e Cumana a servizio della città universitaria di Monte Sant'Angelo, 3° lotto - 1° stralcio tratta parco San Paolo - via Terracina	1301
CLO	113	Ferrovia Circumflegrea Tratta Soccavo - Traiano - Pianura: Risanamento statico della vecchia Galleria Camaldoli - Adeguamento impiantistico ed opere complementari	1311
CFI	114	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	1319
CLO	115	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli - Progetto esecutivo Vallone S. Rocco	1325
CLO	116	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli - Consolidamento dei costoni e dei versanti della Collina dei Camaldoli - lato Soccavo	1335
CFI	117	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - interventi di automazione dei passaggi a livello	1343

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CFI	118	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - eliminazione dell'inquinamento acustico lungo le linee	1349
CFI	119	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - impianti di segnalamento e sicurezza	1355
CFI	120	Ferrovie sud-est: elettrificazione della linea ferroviaria a 3 kV cc tra le progressive Km 77+780 e Km 112+630	1361
CLO	121	Nodo di Catania - Interramento stazione centrale e raddoppio bivio Zurria-Catania Acquicella	1367
CLO	122	Completamento Circumetnea - Tratta Stesicoro-Librino-Aeroporto	1373
CFI	123	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino	1378
CFI	124	Interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila	1391
CFI	125	Programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'Università de L'Aquila	1451
CFI	126	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma - Ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia	1471

TOMO V

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	127	S.S. 131 "Carlo Felice" Cagliari – Sassari - Lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000	1481
CLO	128	Collegamento viario tra il Porto di Ancona e la grande viabilità	1491
CLO	129	Hub portuale di Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	1497
CLO	130	Hub portuale di Taranto	1525
CLO	131	Variante SS 1 Aurelia Bis tra	1541

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
		Savona/Torrente Letimbro e Albisola Superiore	
CLO	132	Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale	1547
CLO	133	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1533
CLO	134	Hub portuale di Trieste - Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali	1559
CLO	135	Hub interportuale di Gioia Tauro - Interventi di tipo infrastrutturale ed industriale	1571
CLO	136	Interporto di Nola: adeguamento infrastrutturale del complesso interportuale di Nola - potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso	1601
CLO	137	Hub interportuale di Battipaglia - 1° lotto funzionale: ferrovia intermodale, impiantistica generale e sistemazione delle aree esterne, capannone C3, ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray	1609
CLO	138	Hub interportuale di Battipaglia - 2° lotto funzionale - Lotto di completamento	1615
CLO	139	Piastra Logistica di Civitavecchia	1623
CLO	140	Hub interportuale di Novara - Completamento terminale Ovest e nuovo ponte sul Terdoppio	1637
CLO	141	Hub interportuale di Catania	1683
CLO	142	Interporto di Termini Imerese	1705
CLO	143	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guasticce	1711
CLO	144	Piastra logistica umbra	1723
P: INT:	145	Hub Interportuale Porto di Cremona (ex Nuova conca di accesso al porto di Cremona)	1735
CLO	146	Collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia	1743

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
P: INT:	147	Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma	1749
CLO	148	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	1757
CLO	149	MOL - Acquedotto Molisano Destro	1765
CLO	150	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	1773
CLO	151	ABR – potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran sasso lato Teramo - 1° lotto funzionale	1779
CLO	152	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	1785
CLO	153	CAM – Sistema irriguo della Campania occidentale – Piana del Sele - Nuova galleria Pavoncelli Bis	1805
CLO	154	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	1813
CLO	155	BAS – Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S: Giuliano" – Ginosa (progetto BAS3) - 2° lotto: completamento della ristrutturazione del sistema di adduzione	1821
CLO	156	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	1827
CLO	157	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	1833
CLO	158	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	1843

TOMO VI

Classificazione intervento	N. scheda	Denominazione	Pag.
CLO	159	BAS – Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, di	1853

Classificazione	N. scheda	Denominazione	Pag.
		serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - 1° lotto funzionale	
CLO	160	BAS – Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale	1858
CLO	161	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni	1865
CLO	162	PUG - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III Lotto	1871
CLO	163	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	1885
CLO	164	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	1893
CLO	165	CAL – schema idrico sulla diga del torrente Menta - 1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento	1899
CLO	166	CAL – schema idrico sulla diga del torrente Menta - 2° lotto	1905
CLO	167	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	1919
CLO	168	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	1925
CLO	169	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	1931
CLO	170	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1°, 2° e 3° lotto	1939
CLO	171	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile	1951

Classificazione	N. scheda	Denominazione	Pag.
		dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1)	
CLO	172	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) – Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA – 2° e 3° lotto	1957
CLO	173	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla	1963
CLO	174	Giacimenti di idrocarburi - Inseidamento produttivo di Tempa Rossa	1969
CLO	175	Linea a 380 kV "S.Fiorano (I) – Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia – Svizzera	1979
CLO	176	Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo – Rho	1989
CLO	177	Elettrodotto a 380 kV Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	1999
CLO	178	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)	2007
CLO	179	Elettrodotti 380 kV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse	2021
CLO	180	Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza di complessi immobiliari sedi di istituzioni e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali (Art.4, comma 151, Legge 350/2003 - Finanziaria 2004)	2031
CLO	181	Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (Art. 3, comma 91, Legge 350/2003 - Finanziaria 2004)	2083

Classificazione	N. scheda	Denominazione	Pag.
CFI	182	Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma	2107
CFI	183	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009	2113
CLO	184	Piano per l'edilizia penitenziaria	2119
CLO	185	Venezia - Palazzo del cinema	2153
CLO	186	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico	2161
CFI	187	Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese	2169
CLON	188	Firenze - Parco della musica	2175

Legenda

CLO	Cipe Legge obiettivo
CFI	Cipe Fondo Infrastrutture
CLON	Cipe Legge obiettivo non confermato nell'8° e nel 9° Allegato Infrastrutture
P.INT	Procedimenti interrotti

Legenda delle sigle utilizzate nelle schede

Dati economici opere deliberate

Le *previsioni di costo al 30 Aprile 2011* indicano il costo più aggiornato dal CIPE (ultima delibera di attuazione relativa all'opera specifica con informazioni in merito), fatta eccezione per alcune opere per le quali il costo è stato aggiornato con informazioni più recenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dei soggetti competenti.

I **costi al 21 Dicembre e al 6 Aprile 2006** invece sono quelli indicati nell'allegato 1 alle corrispondenti delibere 121 e 130, mentre il **costo al 30 Giugno 2008** è l'aggiornamento del costo di cui alla delibera 130/2006 riportato nel DPEF 2009-2013. Il costo ad **aprile 2011** è quello riportato nella tabella 1 dell'allegato al DEF 2012-2014.

Tipologia di opera

Rete stradale
Rete ferroviaria
Ferrovie metropolitane
Opera aeroportuale
Opera portuale
Interporti
Ponte sullo Stretto di Messina
Rete idrica
Comparto energetico
Telecomunicazioni
Edilizia scolastica
Edilizia penitenziaria
Altra edilizia pubblica
Altre opere
MO.S.E.

Stato di attuazione dell'opera

SdF	Studio di fattibilità
PP	Progettazione preliminare
PD	Progettazione definitiva
PE	Progettazione esecutiva
Selezione di proposte in PF	Selezione di proposte ai sensi dell'art. 37 bis L. 109/94
Gara in corso	Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato
Gara non aggiudicata	Gara non aggiudicata
Contratto stipulato	Opere con esecutore individuato
Contratto rescisso	Contratto rescisso
Lavori in corso	Lavori in corso
Lavori sospesi	Lavori sospesi
Lavori conclusi	Lavori conclusi
Misto	Opere costituite da più lotti funzionali con stato di avanzamento differente
Procedimento interrotto	Procedimento interrotto

N.B. :


Ogni riferimento al **DPEF, alla DFP e al DEF** deve intendersi al Programma Infrastrutture ad esso allegato

Per **fondi residui** si intende la differenza tra risorse disponibili e costo.

SCHEMI IDRICI

**BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri
1° lotto funzionale**

SCHEDA N. 159

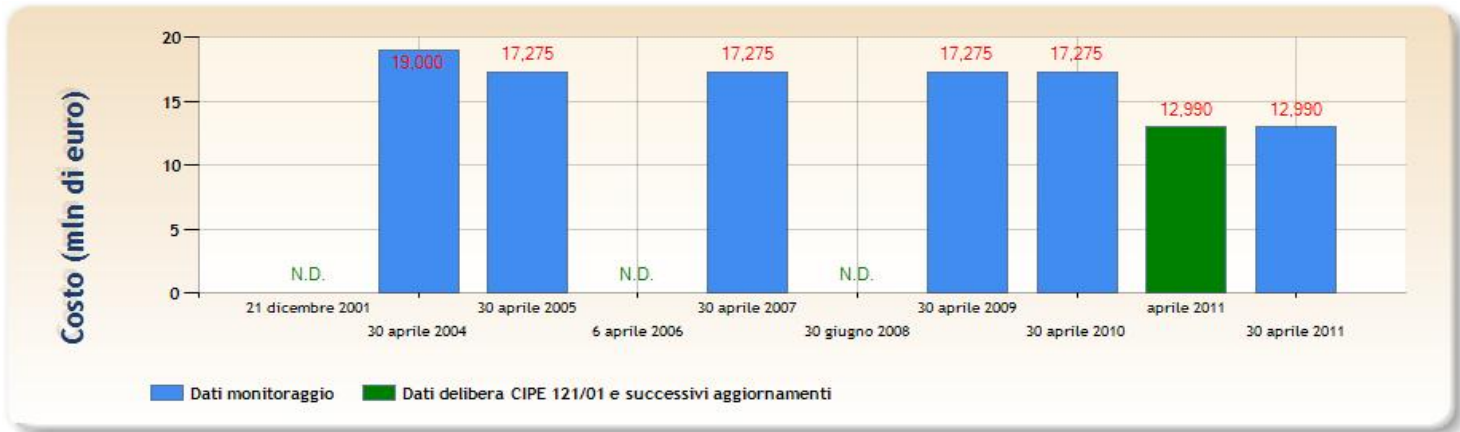

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G99J04000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Regione Basilicata

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori sospesi

DELIBERE CIPE

53/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

Il 1° lotto funzionale delle "Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri" comprende i seguenti lavori:

- sistemazione gruppo sorgentizio Oscuriello
- ripristino continuità idraulica di una tubazione esistente
- sistemazione area Montemurro
- aumento della capacità idrica di tre serbatoi
- rete idrica di Sant'Arcangelo
- rifacimento di vari partitori
- posa in opera di apparecchiature di controllo
- regolazione e misura dell'intero Acquedotto dell'Agri

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata.

2002

E' sottoscritta l'IGQ tra Governo e Regione Basilicata ove sono comprese le opere idriche dell'Agri.

2003

La Regione Basilicata, il 16 giugno, si esprime positivamente con prescrizioni.

Il RUP attesta che i manufatti non ricadono in aree sensibili e/o sottoposte a vincoli (attestazione del 9 luglio 2003).

Il MIT ha convocato la CdS che si conclude positivamente in data 24 novembre.

La Regione Basilicata, con nota del 2 dicembre, esprime parere di conformità in relazione alla localizzazione.

2004

Il RUP, in data 28 gennaio, dichiara concluso il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Nella nota del 23 febbraio, il MIT trasmette la relazione istruttoria sulle "Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie - 1° lotto funzionale", proponendo l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Il CIPE, con delibera n. 53, prende atto che l'opera è stata esclusa dalla procedura di VIA e che la Regione Basilicata ha trasmesso il progetto definitivo alle amministrazioni interessate ed agli enti gestori delle interferenze, i quali hanno rilasciato nulla osta di massima sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze. Il costo complessivo è di 17,3 Meuro, di cui 1,8 per IVA. Il CIPE approva il progetto definitivo e assegna alla Regione Basilicata l'importo complessivo di 17,3 Meuro a valere sulla legge n. 166/2002 (11 Meuro nell'anno 2005 e 6,3 nell'anno 2006).

2005

La società Acquedotto Lucano Spa, il 27 settembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori delle opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - 1° lotto funzionale", per un importo complessivo dei lavori di 12,8 Meuro

2006

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Acquedotto Lucano Spa, in data 26 settembre, informa che è ancora in corso la fase di negoziazione.

2007

Il 6 aprile Acquedotto Lucano Spa aggiudica la gara all'Ati Marottoli Costruzioni e Servizi Srl; Ing.Ram Srl.

2009

L'opera compare nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 58%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva un avanzamento dei lavori del 68,20%. La conclusione è prevista per il 31 dicembre 2011, nonostante i lavori siano parzialmente sospesi.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	19,000 Fonte: Regione Basilicata
Previsione di costo al 30 aprile 2005	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2011
Previsione di costo al 30 aprile 2009	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Previsione di costo al 30 aprile 2010	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Costo ad aprile 2011	12,990 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	12,990 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	17,280 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	17,275
Fondi Legge Obiettivo	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004

Fondi residui:	-4,285
-----------------------	---------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	12.563.243,78
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	529.190,52
Nome aggiudicatario:	Acquedotto Pugliese SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00347000721
Data inizio:	
Data fine:	16/06/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Regione Basilicata
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	900 giorni
Data bando:	23/09/2005
CIG/CUI:	2029282879
Data aggiudicazione:	06/04/2007
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	A.T.I. MAROTTOLI Costruzioni e Servizi S.r.l. - Ing. RAM S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	01468210768
Data contratto:	21/09/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	12.177.558,70
Importo oneri per la sicurezza:	424.557,91
Importo complessivo a base di gara:	12.602.116,61
Importo aggiudicazione:	9.533.726,06
Somme a disposizione:	4.673.166,15
Totale:	14.206.892,21
% Ribasso di aggiudicazione:	30,47
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	31/12/2011
Stato avanzamento importo:	6.072.892,31
Stato avanzamento percentuale:	68,20

Data effettiva inizio lavori: 29/09/2008
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 3
Totale giorni sospensione:
Note: numero 1 sospensione totale di 93 giorni
numero 2 sospensioni parziali di cui 1 in corso

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:


NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002
Voto n. 344 CTAR Regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità del 16 Giugno 2003
Attestazione n.2286/8013 del 9 Luglio 2003
Delibera CIPE 53/2004
del 29 Settembre 2004
Bando di gara Acquedotto Lucano Spa del Settembre 2005
Avviso di aggiudicazione Acquedotto Lucano Spa del Settembre 2007


SCHEMI IDRICI

BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico 1° lotto funzionale

SCHEDA N. 160

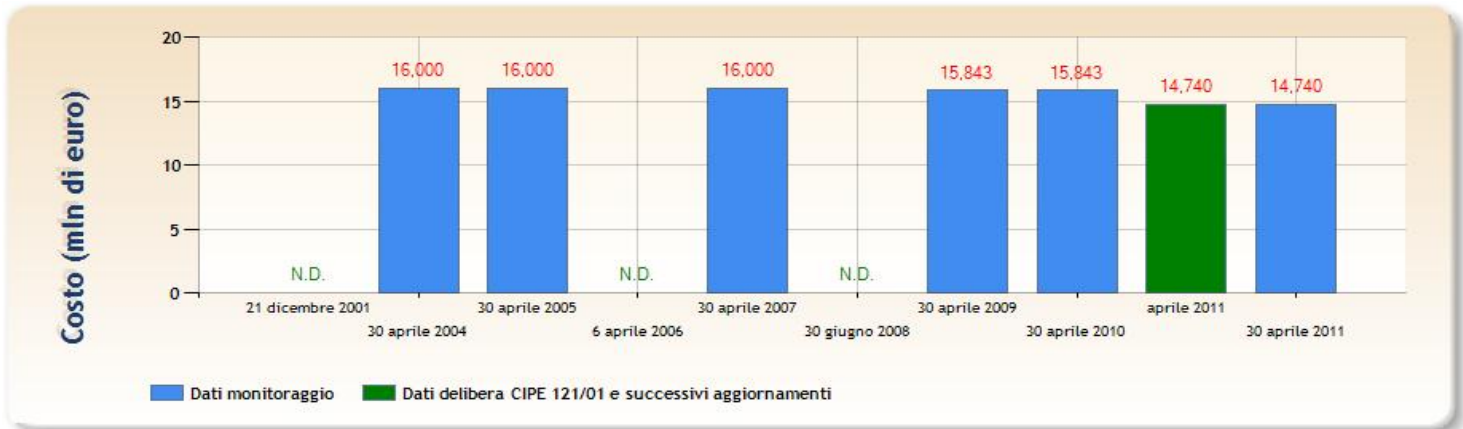

LOCALIZZAZIONE

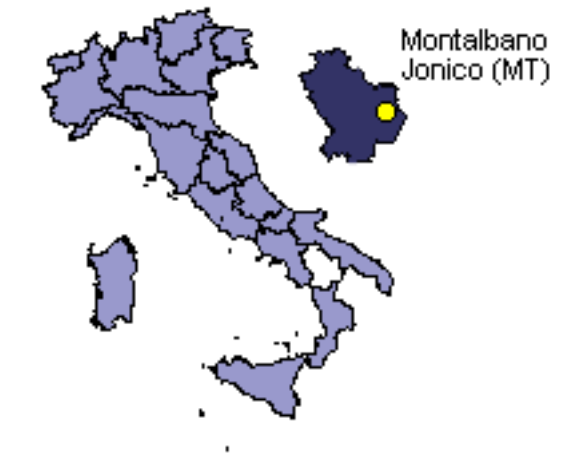

CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Rete idrica

Regione Basilicata

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

139/2002

ULTIMAZIONE LAVORI

2009

DESCRIZIONE

L'intervento riguarda il completamento del 1° dei due lotti relativi all'impianto di potabilizzazione esistente. Prevede la realizzazione di due linee di trattamento, che vanno ad aggiungersi all'unica esistente, e che consentiranno di trattare tutta la portata programmata di 1050 l/sec.

DATI STORICI

1999

Viene sottoscritto un Accordo di Programma tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici il 5 agosto 1999 in cui si individuano le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due regioni e di conseguenza le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato.

2001

La Delibera 121/2001 riporta nel sottosistema schemi idrici gli "Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare", per un costo complessivo di 4.641,398 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 Meuro. Nell'allegato 3 riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla Regione Basilicata la quota di 821,166 Meuro. Tra gli interventi è previsto l' "Acquedotto Frida Sinni e Pertusillo, completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano jonico".

2002

Le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n.3187 e n.3188 del 22 marzo 2002, stabiliscono che tutti gli interventi in materia idrica inclusi in Accordi di Programma, Intese Istituzionali Stato - Regioni e nella programmazione regionale o statale devono essere compresi in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica, redatto dal commissario delegato-Presidente della Regione Basilicata e dal commissario delegato-Presidente della Regione Puglia, ognuno rispettivamente per la Regione di propria competenza.

Il DPEF 2003-2006, colloca tra le opere chiave gli "Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare".

Il MIT, con nota n.13312/20027SP del 18.12.2002, trasmette la relazione istruttoria sull'"Acquedotto Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano jonico – 1° lotto funzionale", proponendo un finanziamento di 16,00 Meuro a carico delle risorse della Legge n. 166/2002.

Il CIPE, con Delibera n.139 del 19 dicembre 2002, prende atto che l'opera non necessita di VIA e che è disponibile il progetto definitivo. Il soggetto aggiudicatore è la Regione Basilicata e il costo previsto è di 16,000 Meuro. Assegna quindi l'importo di 16,000 Meuro articolato in 8,000 Meuro per il 2003 e 8,000 per il 2004, da erogare successivamente all'approvazione definitiva del progetto.

L'opera inserita nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002. Il soggetto aggiudicatore per l'opera è individuato nella Regione Basilicata.

2003

Il DPEF 2004-2007 include l'intervento tra le opere potenzialmente attivabili nel periodo di riferimento.

2004

Il DPEF 2006-2009 per l'opera "Acquedotto del Frida Sinni Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico, 1° lotto" indica un costo pari a 16 Meuro, tutti assegnati, il 2007 quale anno di completamento lavori e "gara d'appalto in corso" in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

L'Acquedotto Lucano Spa, in data 18 novembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'"Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento dell'impianto di potabilizzazione del Comune di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale" dell'importo complessivo pari a 10,4 Meuro.

2005

Il DPEF 2006-2009 per l'opera "Acquedotto del Frida Sinni Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico, 1° lotto funzionale" indica un costo pari a 16 Meuro, tutti assegnati, e "consegna dei lavori in corso" in merito allo stato di avanzamento dei lavori. Lo stesso documento inserisce l'opera tra quelle appaltate e cantierate al 30.06.2005.

In data 24 ottobre Acquedotto Lucano Spa aggiudica l'appalto all'ATI composta da Antonio e Raffaele Giuzio Srl - Sogemi Ingegneria Srl - Erroi Costruzioni e Servizi Srl.

2006

La Delibera CIPE n. 130/2006 di rivisitazione del PIS, include gli interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare per un costo complessivo di 4.678,053 Meuro e una disponibilità totale di 1.616,081 Meuro. Nell'allegato 2 invece è presente l'"acquedotto Frida, Sinni, Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale" quale sub intervento degli schemi idrici della Basilicata per il quale è intervenuta deliberazione del CIPE.

Nell'allegato Opere Legge Obiettivo al DPEF 2007-2011 l'intervento "Schemi idrici Basilicata: Acquedotto del Frida Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale" rientra tra le opere idriche "in gara", per un costo di 16 Meuro, interamente finanziato (All.3).

Il documento "Esiti tavolo di ricognizione sullo stato di attuazione della legge obiettivo", pubblicato dal CIPE il 30 ottobre 2006, per l'opera "acquedotto Frida, Sinni, e Pertusillo: completam. Impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale" conferma il costo e il quadro finanziario.

Il rapporto "Infrastrutture Prioritarie" del MI, per l'opera "Acquedotto Frida – Sinni – Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico 1° lotto funzionale" conferma il costo e il quadro finanziario e indica che, nel mese di marzo 2006, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante Acquedotto Lucano Spa, si è proceduto alla consegna dei lavori.

2007

Il DPEF 2008-2012 riporta l'opera con un costo di 16 Meuro negli allegati: A1 "Opere di legge Obiettivo approvate dal CIPE"; A2 "progettazioni definitive – SAL e previsioni di spesa"; B tabella B2 "Legge Obiettivo: Opere in corso integralmente coperte".

2008

Il Rapporto "Infrastrutture Prioritarie" del Ministero delle infrastrutture riporta l'apertura dei cantieri.

Nel DPEF 2009-2013 l'intervento è riportato nella tab.3.1 "opere istruite dalla Struttura Tecnica di Missione e sottoposte al CIPE (2002-2008)" con il costo di 16 Meuro e nella tab. 3.4 "Opere con un livello di avanzamento superiore al 20% al 31 dicembre 2007, con lo stato di avanzamento lavori (SAL) di 4 Meuro pari al 25% del costo. Nella tab. 3.5 "Opere appaltate e cantierate al 30 giugno 2006" con apertura dei cantieri in data 13/09/2006.

2009

Il CIPE, con delibera 6 marzo 2009, n.10, prende atto dei contenuti della ricognizione sullo stato di attuazione del PIS al febbraio 2009, presentato negli allegati 1 e 2, nonché della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009" del MIT. L'intervento "acquedotto Frida, Sinni, Pertusillo: compl. Impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale" è compreso nell'allegato 2, tra gli interventi degli schemi idrici, con un costo complessivo di 15,843 Meuro interamente finanziato. E' altresì compreso nell'allegato 1 tabella 7, Contratti di mutuo attivati (aggiornati al 25 febbraio 2009).

Nel DPEF 2010-2013 "Invasi e reti idriche nel Mezzogiorno" sono riportati nella "Scheda 1: il quadro finora confermato della incisività strategica" e nelle tabelle: "11: Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio della delibera del 6 marzo 2009 (delibera CIPE 26 giugno 2009)"; "12: interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 (stime di tiraggio cassa) quadro di dettaglio delibera 6 marzo 2009"; "14: La manovra Triennale 2009 – 2011". Gli "Schemi idrici Basilicata" nelle tabelle: "4: Opere avviate e completate"; "7: Stato dell'arte della programmazione: opere rientranti nel PIS deliberate dal CIPE"; "8: Stato dell'arte della programmazione: opere rientranti nel PIS in fase di preistrutturazione al CIPE". L'intervento "Acquedotto Frida, Sinni, Pertusillo: compl. Impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - 1° lotto funzionale" è inserito nella "Scheda Regioni "Intese Generali quadro"

e gli aggiornamenti –Basilicata” con un costo di 15,84 Meuro, una disponibilità di 16,00 Meuro a carico dei fondi Legge Obiettivo, e uno stato dell’arte “finanziati in corso”.

2010

Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 1° lotto funzionale" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l’accordo sull’Allegato Infrastrutture.

2011

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l’opera "Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 1° lotto funzionale" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”; “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori”.

Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che i lavori sono stati completati a giugno 2009 e collaudati a gennaio 2010.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	16,000 Fonte: Delibera CIPE 139/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	16,000 Fonte: Delibera CIPE 139/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	16,000 Fonte: Delibera CIPE 139/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	15,843 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	15,843 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	14,740 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	14,740 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	16,000 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	16,000
Fondi Legge Obiettivo	16,000 Fonte: Delibera CIPE 139/2002

Fondi residui:	-1,260
-----------------------	---------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa

Note:**Progettazione esecutiva**

CIPE:	Si
Importo lavori:	10.248.968,47
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	413.299,77
Nome aggiudicatario:	Acquedotto Pugliese SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00347000721
Data inizio:	
Data fine:	16/11/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Regione Basilicata
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	600 giorni
Data bando:	18/11/2004
CIG/CUI:	2784150143
Data aggiudicazione:	24/10/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	A.T.I. Antonio e Raffaele Giuzio S.r.l. - Erroi Costruzioni e Servizi S.r.l. - SOGEMI Ingegneria S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	00149120768
Data contratto:	30/11/2005

Quadro economico:

Importo a base gara:	9.886.754,61
Importo oneri per la sicurezza:	362.213,86
Importo complessivo a base di gara:	10.248.968,47
Importo aggiudicazione:	9.345.436,79
Somme a disposizione:	5.582.783,79
Totale:	14.928.220,58
% Ribasso di aggiudicazione:	11,01
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	13/09/2006
Data presunta fine lavori:	04/09/2009
Stato avanzamento importo:	10.564.185,37
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	13/09/2006
Data effettiva fine lavori:	20/06/2009
Data presunta fine lavori varianti:	20/06/2009
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	

Data collaudo tecnico-
amministrativo: 29/01/2010

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2

Totale giorni sospensione: 231

Note: sospensione dei lavori n. 1 per perfezionamento deposito calcoli statici
sospensione dei lavori n. 2 per redazione perizia di variante

Varianti:

Numero totale: 1

Giorni proroga totali: 90

Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

Importo: 10.146.465,61

Importo oneri sicurezza: 417.719,64

Somme a disposizione: 4.012.228,37

Totale: 14.576.413,62

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo di Programma tra Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici del 5 Agosto 1999

Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per la Protezione civile, n.3187 e n.3188 del 22 Marzo 2002

Delibera CIPE 139/2002

del 19 Dicembre 2002

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002


Bando di gara Acquedotto Lucano Spa del Novembre 2004

Avviso di aggiudicazione Acquedotto Lucano Spa del Ottobre 2005

SCHEMI IDRICI

BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni

SCHEMA N. 161

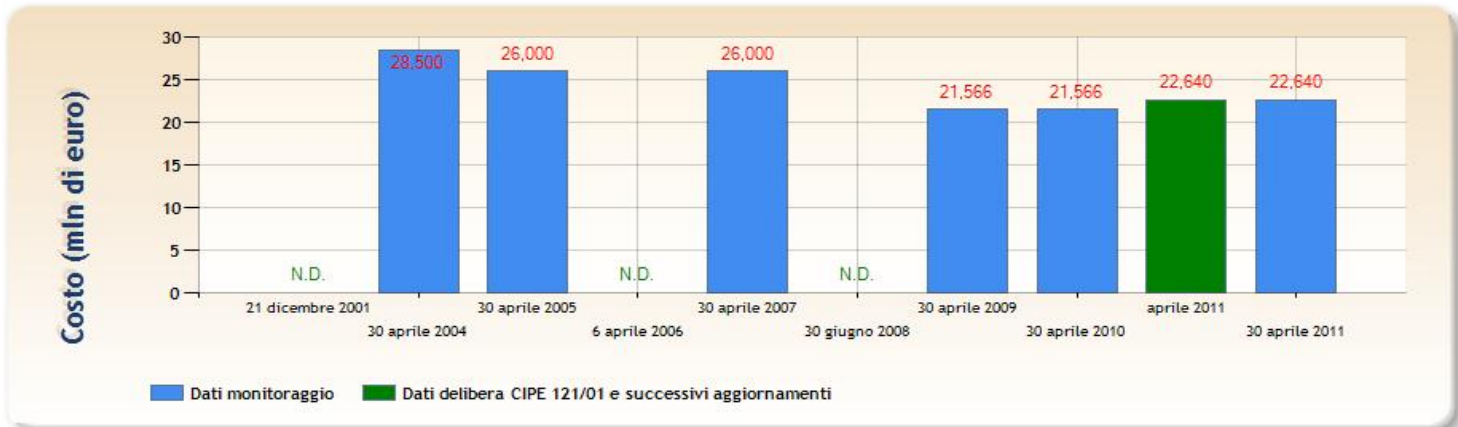

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G87H04000020001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

52/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

Le "Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni" consistono in: 44 Km circa di condotte in acciaio di vari diametri; 6 serbatoi di accumulo per complessivi 8.000 mc; ripristino del serbatoio di Lauria; 2 impianti di sollevamento; 2 bottini; 3 attraversamenti: due del Sinni ed uno del fosso Monaco; 2 fiancheggiamenti su ponti stradali; una galleria di m 200; reti idriche di 6 paesi. L'acquedotto serve circa 50.000 abitanti residenti e 40.000 fluttuanti turistici.

DATI STORICI

2000

Tra il 2000 e il 2001 l'opera viene sottoposta alla valutazione del Dipartimento Ambiente e Territorio della regione Basilicata che esprime parere favorevole e rilascia i relativi nulla osta.

2001

L'intervento è compreso nella delibera n. 121 nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata.

2002

L'opera viene inclusa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Basilicata sottoscritta il 20 dicembre. Il soggetto aggiudicatore è individuato nella Regione Basilicata.

2003

Il 17 luglio la Regione Basilicata esprime parere, con prescrizioni, in merito alla non assoggettabilità dell'intervento alla VIA.

La Regione Basilicata, con nota del 21 novembre, esprime parere favorevole, senza prescrizioni, conformemente ai nulla osta già rilasciati per le stesse opere.

Il MIT convoca la CdS che si conclude positivamente in data 24 novembre.

La Regione Basilicata, con nota del 2 dicembre, esprime parere di conformità in relazione alla localizzazione.

2004

Il RUP, in data 28 gennaio, dichiara concluso senza osservazioni ed opposizioni il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Il MIT, con nota del 23 febbraio, trasmette la relazione istruttoria sulle "Opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni", proponendo l'approvazione del progetto definitivo con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge 350/2003. Il CIPE, nella delibera n. 52, prende atto delle risultanze dell'istruttoria e dei pareri espressi e approva, con prescrizioni, il progetto definitivo. Il costo complessivo dell'intervento è di 26 Meuro di cui 3,9 per IVA. Il contributo che viene assegnato, a valere sulla legge n. 166/2002, è a copertura totale del costo. L'anno di imputazione è il 2005 per 20 Meuro e il 2006 per i restanti 6.

L'Acquedotto Lucano Spa, in data 18 novembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'"Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni" per un importo complessivo di 15,1 Meuro.

2006

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

In data 20 luglio Acquedotto Lucano Spa aggiudica l'appalto all'ATI composta da Marottoli Costruzioni e Servizi Srl -

Ing. Ram Srl - Ro.Mal.Cos Spa.

Il rapporto "Infrastrutture Prioritarie" del MIT conferma il costo e il quadro finanziario e indica che, per la copertura del finanziamento, è stato contratto il mutuo con la Cassa Depositi e prestiti.

2009

L'opera compare nella delibera CIPE n.10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 49%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori del 75,73%. La conclusione è prevista per il 16 dicembre 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	28,500 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Basilicata
Previsione di costo al 30 aprile 2005	26,000 Fonte: Delibera CIPE 52/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	26,000 Fonte: Delibera CIPE 52/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	21,566 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	21,566 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	22,640 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	22,640 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	21,570 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	21,566
Fondi Legge Obiettivo	21,566 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

Fabbisogno residuo:	1,074
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: I progettisti sono stati incaricati con Convenzione n. 23993 del 18/05/1991 dall'Acquedotto pugliese. Successivamente l'Autorità d'Ambito Ottimale della Basilicata ha assunto la titolarità del Progetto con convenzione del 24/04/2002 stipulata con l'EAAP, e i medesimi professionisti

Progettazione definitiva

CIPE: Sì
Importo lavori: 14.920.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: Arch. E. Masella, Ing. F. Di Giorgio
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 03/11/2002
Data fine: 05/05/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Acquedotto Lucano Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 10 mesi
Lavori: 269 giorni
Data bando: 10/08/2005
CIG/CUI: 1853583912
Data aggiudicazione: 20/07/2006
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Marottoli Costruzioni e Servizi - Ing. Ram. S.r.l. - RO.MAL.COS. S.p.A.,
Codice fiscale aggiudicatario: 01468210768
Data contratto: 22/11/2006

Quadro economico:

Importo a base gara: 14.920.000,00
Importo oneri per la sicurezza: 298.400,00
Importo complessivo a base di gara: 15.218.400,00
Importo aggiudicazione: 10.709.068,72
Somme a disposizione: 10.063.833,60
Totale: 20.772.902,32
% Ribasso di aggiudicazione: 30,33
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: il progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria, approvato dal CDA di Acquedotto Lucano S.p.A. nella seduta del 28.02.2008, ha rideterminando l'importo contrattuale e pertanto con il seguente quadro economico:

LAVORI +sicurezza+ progettazione esecutiva	€ 11.881.929,44;
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 9.684.070,56
TOTALE	€ 21.566.000,00

A seguito di ciò, è stato stipulato il relativo contratto aggiuntivo in data 10.06.2008, registrato a Potenza il 26.06.2008 al n° 2332 per l'importo aggiuntivo netto di € 1.172.860,72

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	16/12/2011
Stato avanzamento importo:	16.331.979,99
Stato avanzamento percentuale:	75,73
Data effettiva inizio lavori:	23/04/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	16/12/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - Realizzazione di perizia di variante per interferenze intervenute con l'autostrada Salerno Reggio Calabria e tempi necessari per acquisizione pareri ed autorizzazioni

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002

Determinazione dirigenziale Regione Basilicata n. 75F2003D797 del 17 Luglio 2003

Delibera CIPE 52/2004

del 29 Settembre 2004


Bando di gara Acquedotto Lucano Spa del Agosto 2005

Avviso di aggiudicazione Acquedotto Lucano Spa del Settembre 2006


SCHEMI IDRICI

PUG - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III Lotto

SCHEMA N. 162

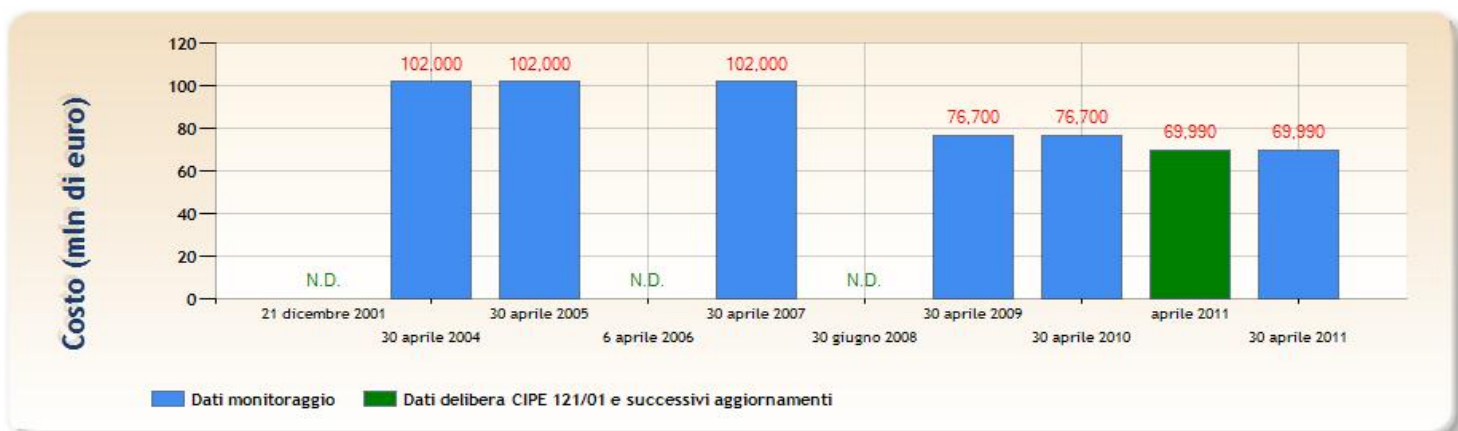

LOCALIZZAZIONE

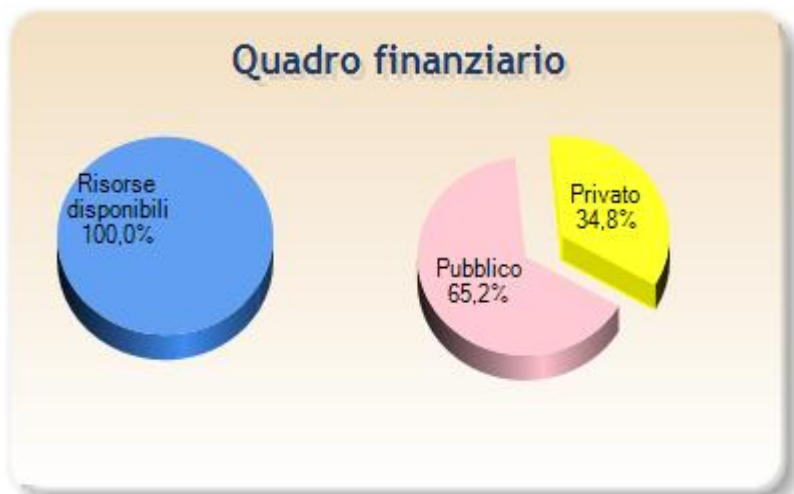

CUP:

E71B05000050003

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Acquedotto Pugliese Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

72/2007
91/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Gli interventi riguardano un 1° stralcio funzionale dell'Acquedotto del Sinni, che - in derivazione dall'esistente acquedotto del Pertusillo - convoglierà una portata di circa 1,5 mc/s a servizio del Salento. Il completamento dell'acquedotto avverrà con la realizzazione dei potabilizzatori di Statte e di San Paolo, il cui progetto preliminare è in corso di predisposizione. Lo stralcio funzionale è articolato in 3 lotti:

- 1° lotto: adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo, di ca. 23,7 Km, con tubazione in acciaio del DN 1200;

- 2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo in agro di Salice Salentino in calcestruzzo armato del tipo seminterrato, della capacità di circa 50.000 m³ e posto nelle vicinanze dell'esistente serbatoio, di ca. 18.000 mc, ma ad una quota superiore per alimentare anche il suddetto attuale serbatoio;

- 3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli, di ca. 36,5 Km con tubazione in acciaio del DN 1400.

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Puglia.

2002

Gli interventi sono compresi nel "piano d'ambito" della Regione Puglia approvato con decreto del 30 settembre dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale Regione Puglia.

La Regione Puglia sottoscrive, il 30 settembre, con l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (AP Spa) la convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato (SII) nel suddetto A.T.O. Puglia.

2003

Gli interventi sono in parte ricompresi nell'APQ-Risorse idriche sottoscritto l'11 marzo.

L'opera è inclusa nell'IGQ Governo-Regione Puglia del 10 ottobre, che individua il Commissario delegato quale "soggetto attuatore della progettazione" e l'AP S.p.A. quale "aggiudicatore dell'appalto dei lavori".

2004

I progetti preliminari dei 3 lotti vengono approvati dal Commissario delegato per l'emergenza idrica in Puglia in via meramente tecnica, con decreti del 1° marzo 2004.

L'Acquedotto Pugliese S.p.A., soggetto aggiudicatore, invia con nota del 20 dicembre, il progetto definitivo al Ministero dei trasporti e al MIT e lo inoltra ai soggetti interferenti.

2005

Il soggetto aggiudicatore, tra gennaio e maggio, fa pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità.

L'Assessorato bilancio e programmazione della Regione Puglia, con nota del 22 giugno, esprime parere favorevole sull'opera.

Nella CdS del 23 giugno sul progetto definitivo vengono acquisiti i pareri di vari enti.

Il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 24 settembre, ritiene di non assoggettare l'opera a VIA.

Il RUP, con nota del 17 ottobre, fornisce controdeduzioni alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità.

La Regione Puglia approva il progetto definitivo in linea tecnica con nota del 27 ottobre 2005.

2006

L'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ritiene non necessaria la VIA e rilascia contestualmente parere favorevole alla valutazione di incidenza, formulando alcune raccomandazioni che in seguito il MIT riterrà non accoglibili, in quanto comporterebbero una localizzazione dell'opera diversa da quella già approvata.

La delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS menziona i primi 3 lotti dell'"Acquedotto del Sinni".

L'Assessorato all'assetto del territorio della Regione Puglia, verificata la non interferenza dell'intervento con la pianificazione urbanistica e tenuto conto del parere favorevole delle amministrazioni comunali interessate, con nota

del 14 luglio, rilascia parere favorevole di massima sulla localizzazione urbanistica, subordinato all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica.

Il 31 ottobre viene stipulato l'Atto integrativo n. 1 all'APQ tra Regione e Ministeri delle infrastrutture, delle politiche agricole, dell'ambiente e dello sviluppo economico. In tale atto si conferma la validità del progetto "Acquedotto potabile del Sinni" e viene prevista la realizzazione del potabilizzatore di S.Paolo.

2007

La Giunta regionale, con delibera del 16 gennaio, rilascia l'attestazione di compatibilità paesaggistica, richiesta dall'Assessorato regionale all'assetto del territorio, ai fini del perfezionamento del parere sulla localizzazione urbanistica.

La Direzione regionale per i beni architettonici della Puglia esprime parere favorevole con prescrizioni.

L'Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia dichiara la completa copertura finanziaria dell'opera nell'ambito degli investimenti previsti nell'APQ.

La localizzazione dell'opera viene approvata dalla Regione il 16 giugno.

Il MIT, il 26 luglio, trasmette al CIPE l'istruttoria sul progetto definitivo proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto stesso, che comprende anche il Programma interferenze.

Il CIPE, con delibera n. 72, prende atto che gli enti interessati dall'esecuzione delle opere hanno espresso pareri favorevoli e i necessari nulla osta e che solo il Consorzio speciale di bonifica di Arneo ha formulato alcune osservazioni che sono state ritenute non accoglibili. Approva quindi, con prescrizioni, il progetto definitivo dei 3 lotti. Il costo complessivo dell'intervento è di 76,7 Meuro al netto dell'IVA; la copertura economica sarà assicurata nel seguente modo:

- il 1° lotto (del costo di 22 Meuro, inserito nel richiamato 1° Atto integrativo dell'APQ "Risorse idriche") trova copertura nelle economie di detto APQ, di cui 6,6 Meuro a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia con delibera n. 84/2000, a valere sui fondi per le aree depresse recati dalla legge n. 488/1999; 9,5 a carico dei fondi POR Puglia e 5,9 dai fondi S.I.I. (fondi privati dell'Acquedotto Pugliese);

- il 2° lotto (del costo di 17,2 Meuro, inserito nell'APQ del marzo 2003 e nella rimodulazione del 16/6/05) è coperto, per 10,6 Meuro dai fondi POR Puglia e, per 6,5 dai fondi S.I.I.;

- il 3° lotto (del costo di 37,5 Meuro, inserito nell'APQ del marzo 2003 e nella rimodulazione del 16/6/05) è coperto, per 23,2 Meuro, dai fondi POR Puglia e, per 14,3 dai fondi S.I.I..

2008

Acquedotto Pugliese Spa, il 4 luglio, pubblica 2 distinti bandi di gara per l'affidamento dei lotti I e II.

2009

La Regione Puglia, con nota del 12 febbraio, comunica ad Acquedotto Pugliese Spa che, a seguito della perdita dell'aliquota dei finanziamenti comunitari, la Regione intende comunque dare attuazione al completamento dell'opera. L'opera è inclusa nella delibera CIPE n.10 sull'attuazione del PIS.

Acquedotto Pugliese Spa, il 19 marzo, aggiudica l'appalto integrato per i lavori di ampliamento del serbatoio di San Paolo in agro di Salice Salentino-Acquedotto del Sinni- II° Lotto all'Ati Intercantieri Vittadello Spa. e Antonio e Raffaele Giuzio.

A seguito di verifiche effettuate in cui sono state rilevate numerose interferenze, Acquedotto Pugliese Spa modifica parzialmente il tracciato originario del III° lotto. Il 30 luglio il nuovo progetto viene inviato per i pareri di competenza a tutti gli Enti interessati .

Con nota del 7 settembre, Acquedotto Pugliese Spa trasmette il nuovo progetto al MIT.

In data 28 settembre Acquedotto Pugliese Spa pubblica l'avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità su due quotidiani.

Il 6 novembre 2009 sottoscritto l'Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia. Nel documento non si fa riferimento agli schemi idrici.

2010

Il 22 aprile si svolge la CdS relativa alla variante del III lotto.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di

Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" articolata in 3 lotti: 1 lotto Condotta; 2 lotto serbatoio S.Paolo; 3 Lotto serbatoio di Secli.

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 91, approva l'aggiornamento del progetto definitivo, che prevede una variante del III lotto, consistente nella realizzazione di una condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio esistente di Secli. Le modifiche non comportano un aumento di costo.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera " Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori". Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" articolata in 3 lotti: 1 lotto Condotta; 2 lotto serbatoio S.Paolo; 3 Lotto serbatoio di Secli.

Nei primi giorni di giugno, Acquedotto Pugliese Spa pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione dell'Acquedotto del Sinni - III lotto, ovvero della condotta adduttrice dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Secli, ivi comprese le camerette di interconnessione con lo schema esistente e tutte le opere di linea di scarico e sfiato. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 25 luglio.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta il seguente avanzamento attuativo:

- lotto I, avanzamento lavori del 86% e ultimazione prevista per il 16 settembre 2011;
- lotto II, avanzamento lavori del 63%.e ultimazione prevista per il 10 novembre 2011;
- lotto III, bando di gara pubblicato il 3 giugno 2011, avvio dei lavori programmato per luglio 2012 e ultimazione prevista, dopo circa 2 anni, a giugno 2014.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	102,000 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Previsione di costo al 30 aprile 2005	102,000 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	102,000 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	76,700 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
Previsione di costo al 30 aprile 2010	76,700 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
Costo ad aprile 2011	69,990 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	69,990 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	76,700 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	76,700
Regione Puglia	49,985 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
Acquedotto Pugliese Spa	26,715 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
<hr/>	
Fondi residui:	-6,710

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
 Conferenza di servizi: Conclusa
 Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
 Modalità di selezione:
 Procedura:
 Sistema di realizzazione:
 Criterio di aggiudicazione:
 Fase progettuale a base di gara:
 Tempi di esecuzione:
 Progettazione:
 Lavori:
 Data bando:
 CIG/CUI:
 Data aggiudicazione:
 Tipo aggiudicatario:
 Nome aggiudicatario:
 Codice fiscale aggiudicatario:
 Data contratto:
Quadro economico:
 Importo a base gara:
 Importo oneri per la sicurezza:
 Importo complessivo a base di gara:
 Importo aggiudicazione:
 Somme a disposizione:
 Totale: 0,00
 % Ribasso di aggiudicazione:
 % Rialzo di aggiudicazione:
 Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
 Data presunta inizio lavori:
 Data presunta fine lavori:
 Stato avanzamento importo:
 Stato avanzamento percentuale:
 Data effettiva inizio lavori:
 Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto n. 294/2002 del Commissario per l'emergenza socio-economico-ambientale Regione Puglia del 30 Settembre 2002

Convenzione Regione Puglia-Acquedotto Pugliese Spa2002 del 30 Settembre 2002

Accordo di programma Quadro-Risorse idriche del 11 Marzo 2003

IGQ tra Governo e Regione Puglia del 10 Ottobre 2003

Decreti nn. 36-37-38/CD/I Commissario delegato per l'emergenza idrica in Puglia del 1 Marzo 2004

I° Atto integrativo all'APQ del Ottobre 2006

Delibera CIPE 72/2007

del 3 Agosto 2007

Bandi di gara Acquedotto Pugliese Spa del 4 Luglio 2008

Avviso di aggiudicazione Acquedotto Pugliese Spa del Aprile 2009

Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia del 6 Novembre 2009

Delibera CIPE 91/2010 del 18 Novembre 2010

Bandi di gara Acquedotto Pugliese Spa (III lotto) del 30 Maggio 2011

1° lotto - adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Trattandosi di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, l'ATI aggiudicatario ha redatto il progetto esecutivo

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 19.269.664,06
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 19.269.664,06
Importo di aggiudicazione: 13.673.023,26
Nome aggiudicatario: ATI: Simeone Nicola & Figlio s.r.l. - Salvatore Matarrese s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario: 01998440711
Data inizio: 22/05/2009
Data fine: 17/08/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 90 giorni
Lavori: 300 giorni
Data bando: 02/07/2008
CIG/CUI: 01813495EC
Data aggiudicazione: 02/12/2008
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI: Simeone Nicola & Figlio s.r.l. - Salvatore Matarrese s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario: 01998440711
Data contratto: 26/06/2009

Quadro economico:

Importo a base gara: 19.335.122,02
Importo oneri per la sicurezza: 194.542,04
Importo complessivo a base di gara: 19.529.664,06
Importo aggiudicazione: 13.856.739,26
Somme a disposizione: 4.219.808,27
Totale: 18.076.547,53
% Ribasso di aggiudicazione: 29,34
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	15/01/2010
Data presunta fine lavori:	20/03/2011
Stato avanzamento importo:	12.310.373,89
Stato avanzamento percentuale:	86,00
Data effettiva inizio lavori:	15/01/2010
Data effettiva fine lavori:	16/09/2011
Data presunta fine lavori varianti:	18/06/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - E' in fase di redazione la perizia di variante n. 2 che comporterà una proroga di ulteriori 90 gg
Data collaudo statico:	15/03/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/03/2012
Note:	15/01/10 consegna parziale dei lavori x indisponibilità aree x necessità saggi arch. preventivi. 24/05/10: consegna definitiva da cui decorrono i tempi contrattuali di 300 gg fino al 20/03/2011.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	90
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	Art. 132 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006
Importo:	14.277.197,71
Importo oneri sicurezza:	194.542,04
Somme a disposizione:	3.604.807,78
Totale:	18.076.547,53
Note:	E' in fase di approvazione la perizia di variante n. 2 per la realizzazione di nuovo by-pass fuori terra all'acquedotto del Pertusillo a seguito di manovra di apparecchiature idrauliche esistenti e della loro non funzionalità

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	2011

2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Trattandosi di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, il progetto esecutivo è stato redatto dall'ATI aggiudicataria

Progettazione esecutiva

CIPE: Sì
Importo lavori: 16.391.464,88
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 16.391.464,88
Importo di aggiudicazione: 12.287.452,21
Nome aggiudicatario: ATI: INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. - ANTONIO E RAFFAELE GIUZIO S.R.L.
Codice fiscale aggiudicatario: 00222300287
Data inizio: 26/06/2009
Data fine: 25/09/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 90 giorni
Lavori: 300 giorni
Data bando: 02/07/2008
CIG/CUI: 0181352865
Data aggiudicazione: 12/01/2009
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. - ANTONIO E RAFFAELE GIUZIO S.R.L.
Codice fiscale aggiudicatario: 00222300287
Data contratto: 11/05/2009

Quadro economico:

Importo a base gara: 16.161.107,74
Importo oneri per la sicurezza: 460.357,14
Importo complessivo a base di gara: 16.621.464,88
Importo aggiudicazione: 11.997.844,77
Somme a disposizione: 1.948.136,30

Totale: 13.945.981,07
% Ribasso di aggiudicazione: 25,76
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 17/02/2010
Data presunta fine lavori: 13/07/2011
Stato avanzamento importo: 7.658.632,97
Stato avanzamento percentuale: 63,00
Data effettiva inizio lavori: 17/02/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 10/11/2011
Tempi realizzazione: In ritardo - E' in fase di redazione la perizia di variante per i collegamenti idraulici che potrà comportare uno slittamento dei termini contrattuali di circa 120 giorni.
Data collaudo statico: 08/05/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo: 08/05/2012
Note: I lavori sono stati consegnati parzialmente il 17/02/2010. La consegna definitiva dei lavori da cui decorrono i tempi contrattuali di 300 gg è avvenuta il 16/09/2010

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	2011
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	<p>La prima versione del progetto definitivo è stata approvata con delibera CIPE del 03/08/2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31.01.2008). Nel corso dello svolgimento delle attività propedeutiche alla fase di appalto (art. 71 co.1 del DPR n. 554/99), il Direttore dei Lavori ha constatato la presenza di numerose interferenze (manufatti di nuova costruzione e taluni ancora in fase di realizzazione) interessanti le aree oggetto dell'intervento.</p> <p>Conseguentemente questa Società ha provveduto ad aggiornare il progetto, modificando parzialmente il tracciato originario nel territorio dei comuni di Galatone e di Nardò, il quale è stato trasmesso al Ministero delle II e TT con nota n. 113643 del 07/09/2009. In data 22.04.2010 è stata convocata dalla Struttura Tecnica di Missione, presso il Ministero delle II e TT, la conferenza di servizi relativa al progetto in variante.</p> <p>Con la Deliberazione CIPE n.91/2010 (pubblicata sulla Gazzette Ufficiale n.71 del 28.03.2011) è stata approvato il progetto di variante in argomento anche ai fini della pubblica utilità.</p>

Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	34.011.970,47
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	0,00
Data inizio:	01/03/2004
Data fine:	06/09/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	719 giorni
Data bando:	03/06/2011
CIG/CUI:	2582830ABB

Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:	33.472.980,00
Importo oneri per la sicurezza:	788.990,47
Importo complessivo a base di gara:	34.261.970,47
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	3.238.029,53
Totale:	37.500.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	02/07/2012
Data presunta fine lavori:	20/06/2014
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	17/12/2014
Data collaudo tecnico-amministrativo:	17/12/2014
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

2012

Previsione al 30/04/2010

2013


Previsione al 30/04/2011

2014


SCHEMI IDRICI

PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto

SCHEMA N. 163

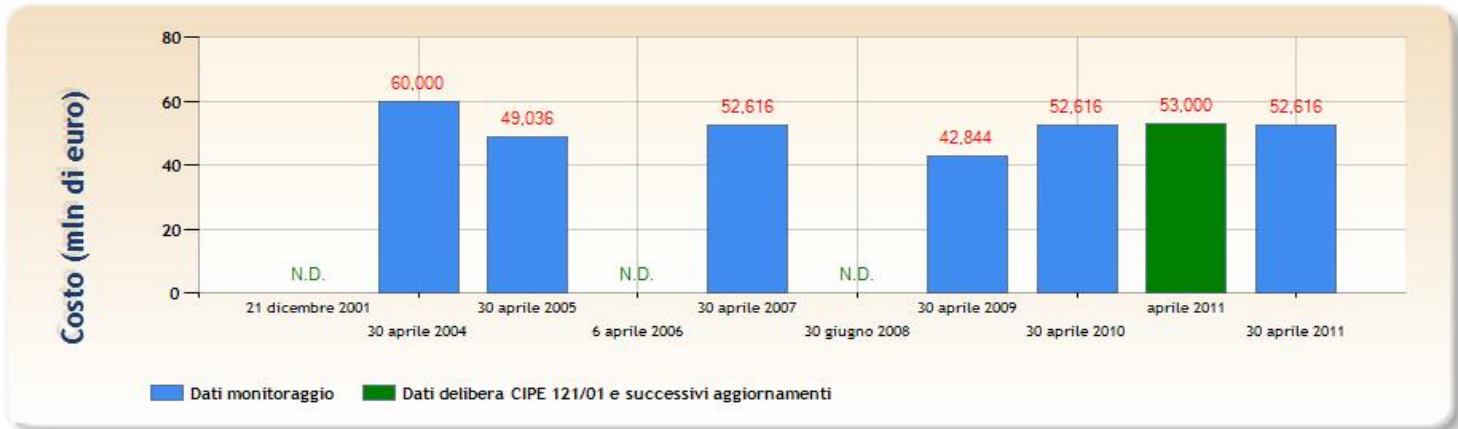

LOCALIZZAZIONE

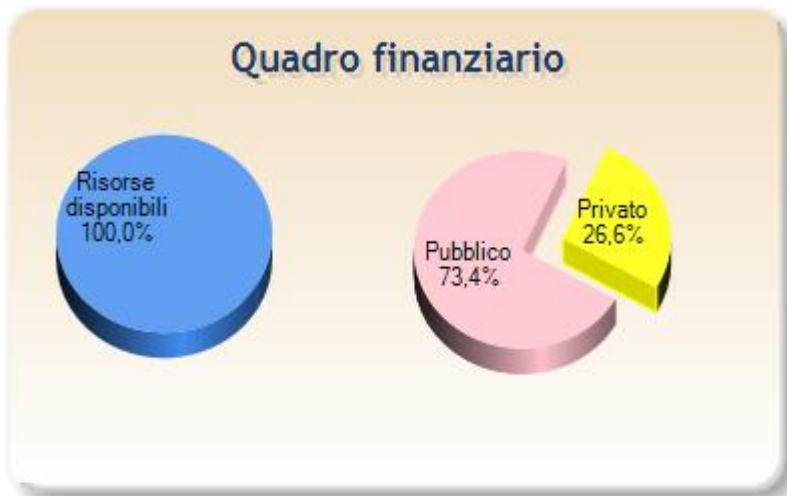

CUP:

B74E01000030001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Acquedotto Pugliese Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

96/2004
21/2004
108/2006
145/2006

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione dei "Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto". Le principali opere da realizzare sono: condotta di adduzione in acciaio del diametro di 1.200 mm; sezioni di trattamento dell'acqua grezza e dei fanghi costituenti l'impianto dimensionato per trattare la portata nominale di 1mc/sec; sistema di telecontrollo automatico per la gestione centralizzata dell'impianto; serbatoio di accumulo di acqua potabilizzata di 85.000 mc. con apparecchiature di controllo

DATI STORICI

1996

L'Ente Irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia, soggetto gestore della diga di Conza concede il nulla osta all'esecuzione delle opere.

1999

Il Servizio dighe di Napoli concede l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esecuzione di opere all'interno della galleria di scarico di fondo.

La CdS si svolge il 13 aprile e il 25 giugno per l'accertamento della conformità urbanistica e partecipano i soggetti interessati tra cui, tra l'altro, il Comune di Conza della Campania, la Regione Campania e il Ministero per i beni culturali, esprimendo parere favorevole, con osservazioni e prescrizioni.

Il Comune di Conza adotta la variante del Piano Regolatore nella quale è stata localizzata l'opera.

2001

L'opera è inclusa nella delibera n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno".

2002

Il DM del 10 giugno, n. 287 del MIT autorizza le opere valutate nella CdS.

La Regione Puglia individua l'Acquedotto Pugliese Spa (A.Q.P. Spa) quale soggetto aggiudicatore.

2003

A.Q.P. Spa, con nota 18 giugno, precisa che "il progetto preliminare è stralcio del progetto esecutivo relativo alla costruzione di un impianto di potabilizzazione delle acque rinvenienti dall'invaso di Conza per una portata di 3 mc/s. Pertanto, sotto il profilo ambientale ed urbanistico, le opere previste dal progetto preliminare sono parte di quelle già valutate ed autorizzate in sede di CdS, ratificata con il citato DM n. 287. Tale atto sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla conferenza". Viene firmata l'IGQ tra Governo e Regione Puglia del 10 ottobre nella quale si conferma l'A.Q.P. Spa quale soggetto aggiudicatore.

2004

L'opera viene esclusa dalla VIA.

A.Q.P. Spa, con nota 23 giugno, precisa che "le opere previste hanno l'identica ubicazione di quelle del progetto approvato dal MIT con il citato DM n.287, salvo la riduzione delle dimensioni di alcune".

Il MIT, con nota 22 luglio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sull'opera proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico del FAS.

Con la delibera n. 19, il CIPE ripartisce le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 riservando 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS e 288 Meuro alla "sicurezza", di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione

del PIS.

Con la delibera n. 21, il CIPE finalizza i 1.130 Meuro della delibera n. 19 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialità - ed ulteriori 200 Meuro, a disposizione dal MIT, destinandoli al finanziamento - secondo la graduatoria - di alcuni interventi, tra cui figura anche, all'11° posto, l'opera "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania", con un costo previsto di 60 Meuro.

Con delibera n. 96, il CIPE prende atto che il soggetto aggiudicatore è individuato nell'A.Q.P. Spa, che i lavori verranno affidati mediante appalto integrato sulla base del progetto definitivo e che per la loro esecuzione sono previsti 36 mesi. Il costo complessivo dell'intervento proposto è di 49 Meuro al netto di IVA. Dato che il soggetto aggiudicatore ha evidenziato la possibilità di contribuire con un importo di 12,5 Meuro, il finanziamento pubblico resta di 36,55 Meuro, che il MIT propone a valere sulla disponibilità del FAS. La relazione istruttoria del MIT, pur evidenziando un "potenziale ritorno economico", rileva una scarsa redditività derivante dalla gestione. Il CIPE approva quindi, con le prescrizioni proposte dal MIT, il progetto preliminare per un 49 Meuro al netto di IVA, di cui 12,5 a carico del soggetto aggiudicatore e 36,55 quale finanziamento pubblico. Il contributo, a valere sul FAS, è articolato in: 7,4 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2005; 24,5 Meuro sul quelle del 2006 e 4,7 su quelle del 2007. Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva è fissato in 6 mesi dalla data di pubblicazione nella GU della delibera. Entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatore procederà alla consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende defianziato.

2005

Il Registro Italiano Dighe, con nota del 30 maggio, esprime il nulla osta all'esecuzione delle opere di cui al progetto definitivo ed anche all'opera di attraversamento in sub-alveo del fiume Ofanto.

Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia esprime parere favorevole in linea tecnica ed economica sul progetto definitivo.

La Direzione Regionale Irpinia dell'Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia rilascia nulla osta all'attraversamento del fiume Ofanto tra le sez. 28 e 38 della condotta adduttrice.

La Direzione Generale di Bari dell'Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, nel confermare il nulla osta all'esecuzione delle opere, prende atto dell'ottemperanza alla prescrizione in merito alla demolizione del canale in calcestruzzo realizzato in fregio alla vasca di calma a valle dello scarico di fondo.

Il settore provinciale del Genio Civile di Avellino esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione di 2 attraversamenti, uno in subalveo del fiume Ofanto e l'altro del vallone Riofreddo del Deserto, mediante la condotta di adduzione all'impianto di potabilizzazione DN 1400, e all'occupazione di 2 aree relative agli scarichi nel medesimo fiume delle acque provenienti dal complesso potabilizzatore/serbatoio.

La Soprintendenza di Salerno e Avellino rilascia parere favorevole sul recepimento delle prescrizioni allegate alla delibera di approvazione del progetto preliminare.

A seguito della trasmissione da parte di A.Q.P. del progetto definitivo alle amministrazioni interessate viene convocata la CdS, durante la quale il Comune di Conza esprime il nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

A.Q.P. Spa, con nota del 17 novembre, giustifica l'aumento dei costi di realizzazione delle opere, pari a 4 Meuro, con le modifiche al progetto originario, tra cui la realizzazione dei filtri a carbone, a seguito delle prescrizioni contenute nella delibera di approvazione del progetto preliminare.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria sul progetto definitivo proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo con prescrizioni, per un importo di 53 Meuro e l'assegnazione del finanziamento di circa 4 Meuro a valere sui fondi della legge n. 166/2002.

A.Q.P. Spa propone di ripartire il costo aggiuntivo del progetto definitivo sulla base delle stesse quote di finanziamento del progetto preliminare.

2006

La Regione Campania esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera, limitatamente alla sola portata di 1 metro cubo per secondo, escludendo la portata relativa all'irriguo.

Il CIPE, con delibera n. 75, revoca il finanziamento a carico del FAS di 36,55 Meuro assegnato con delibera n. 96/2004, a causa del mancato rispetto del termine stabilito per l'aggiudicazione definitiva.

Il CIPE, con delibera n. 108, prende atto che il soggetto aggiudicatore è A.Q.P. Spa, approva il progetto definitivo del costo aggiornato di 53 Meuro e assegna in via programmatica al soggetto aggiudicatore un finanziamento di 39 Meuro a valere sui fondi di cui alla legge n. 166/2002. L'effettiva assegnazione del contributo è vincolata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione nella GU della delibera, "della rimodulazione del progetto, coerentemente con le disponibilità comprensive dell'assegnazione programmatica disposta. L'assegnazione definitiva del contributo sarà deliberata dal CIPE sulla base di una relazione del MIT circa l'avanzamento dell'iter procedurale.

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

A.Q.P. Spa, con nota 15 settembre, dichiara che il fabbisogno finanziario residuo, rispetto al contributo di 39 Meuro assegnato in via programmatica con la delibera n. 108, pari a 14 Meuro, sarà coperto dallo stesso A.Q.P. Spa.

Con la delibera n.145, il CIPE prende atto che, dalla relazione istruttoria del MIT risulta che, in una riunione tecnica del 5 settembre 2006, è stata confermata da parte delle regioni Campania e Puglia la volontà di pervenire ad un accordo di programma per il trasferimento delle risorse idriche e che A.Q.P. si impegna a coprire il fabbisogno finanziario residuo per l'opera. Il CIPE assegna quindi definitivamente a A.Q.P. il contributo assegnato in via programmatica per 15 anni viene articolato: in un contributo annuo massimo di 3,03 Meuro a valere sul limite d'impegno di cui alla legge n. 166/2002 decorrente dal 2003 e un contributo annuo max di 0,46 Meuro sul limite d'impegno di cui alla delibera n.967/2004 decorrente dal 2004. Il volume di investimenti complessivo risulta di 38,6 Meuro. Il restante importo di 0,38 Meuro rappresenta il max consentito per la voce imprevisti. Il residuo della copertura finanziaria dell'opera, per 14 Meuro, sarà assicurata dal A.Q.P.

2008

Il 30 giugno A.Q.P. aggiudica la gara all' Ati Degremont Spa; Lista Appalti Srl, Faver Spa, G. Putignano & Figli Srl, Desa Srl, Edilalta Srl.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Il 6 novembre viene sottoscritto Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia ove, però, non si fa riferimento agli schemi idrici.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori del 53,96% e la conclusione è prevista per il 22 agosto 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001

Previsione di costo al 30 aprile 2004

60,000 **Fonte:** IGQ tra Governo e Regione Puglia

Previsione di costo al 30 aprile 2005

49,036 **Fonte:** Delibera CIPE 96/2004

Costo al 6 aprile 2006

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 130/2006

Previsione di costo al 30 aprile 2007	52,616 Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	42,844 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	52,616 Fonte: Delibera CIPE 145/2006; DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	53,000 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	52,616 Fonte: Delibera CIPE 145/2006

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	53,000 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	52,616
Fondi Legge Obiettivo	38,616 Fonte: Delibera CIPE 145/2006
Acquedotto Pugliese Spa	14,000 Fonte: Delibera CIPE 145/2006

Fabbisogno residuo: 0,000

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Trattandosi di appalto intergato la progettazione esecutiva è stata realizzata dall'affidatario. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva, come previsto dal bando di gara, non è stato soggetto a ribasso d'asta.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	45.707.043,86
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	810.000,00
Importo di aggiudicazione:	810.000,00
Nome aggiudicatario:	ATI Degremont SpA, G. Putignano e F. Srl, Desa Srl
Codice fiscale aggiudicatario:	0081930157
Data inizio:	05/09/2008
Data fine:	03/01/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	120 giorni
Lavori:	540 giorni
Data bando:	21/06/2007

CIG/CUI: 005032597E
Data aggiudicazione: 12/05/2008
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI Degremont SpA (capogruppo), G. Putignano e F. Srl (mandante), Desa Srl (mandante), Faver SpA (cooptata), Edil Alta Srl (cooptata), Lista Appalti Srl(cooptata)
Codice fiscale aggiudicatario: 0081930157
Data contratto: 26/08/2008
Quadro economico:
Importo a base gara: 46.517.043,86
Importo oneri per la sicurezza: 1.413.619,91
Importo complessivo a base di gara: 47.930.663,77
Importo aggiudicazione: 37.774.828,49
Somme a disposizione: 15.225.171,51
Totale: 53.000.000,00
% Ribasso di aggiudicazione: 22,22
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 04/08/2009
Data presunta fine lavori: 22/08/2011
Stato avanzamento importo: 19.574.043,20
Stato avanzamento percentuale: 53,96
Data effettiva inizio lavori: 04/08/2009
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 22/08/2011
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 18/02/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo: 18/02/2012
Note: Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, Collaudo Statico in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 8
Note: I lavori sono stati ripresi in data 17/11/2010 e sono attualmente in corso. Nel corso dei lavori su richiesta dell'ATI affidataria inoltre sono state concesse n. 2 proroghe dei termini contrattuali per complessivi 185 giorni.

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Delibera del Consiglio Comunale Conza della Campania n.16

del 7 Maggio 1999

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.287

del 10 Giugno 2002

IGQ tra Governo e Regione Puglia del 10 Ottobre 2003

Delibera CIPE 21/2004

del 28 Settembre 2004

Delibera CIPE 19/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 96/2004

del 20 Dicembre 2004

Delibera CIPE 75/2006

del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 108/2006

del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 145/2006

del 17 Novembre 2006

Bando di gara Acquedotto Pugliese Spa del Giugno 2007


Avviso di aggiudicazione Acquedotto Pugliese Spa del Luglio 2008

Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia del 6 Novembre 2009

SCHEMI IDRICI

PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello

SCHEDA N. 164

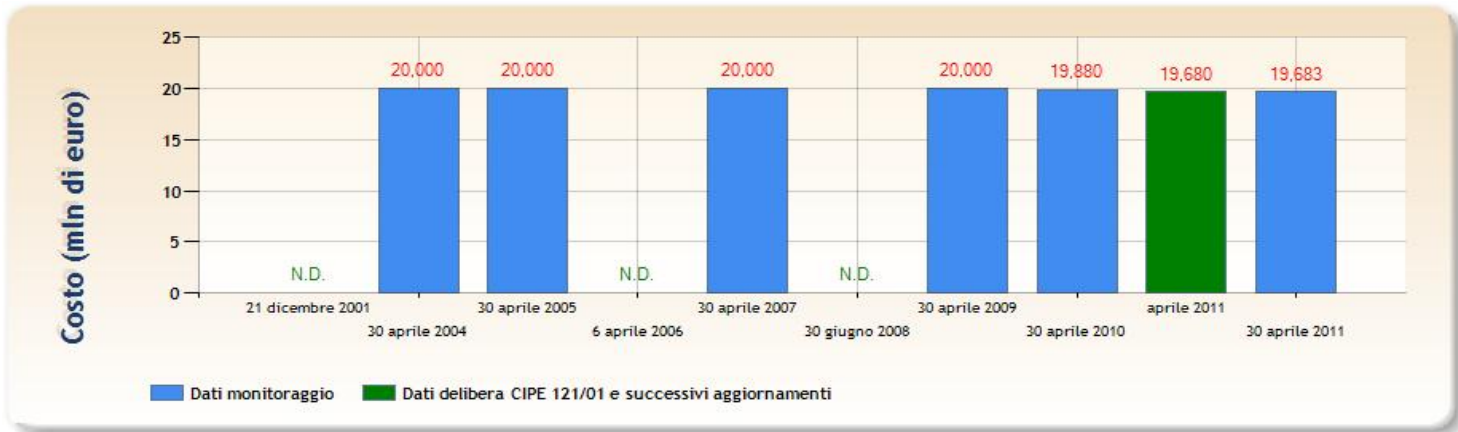

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Rete idrica

Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

140/2002

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

L'intervento riguarda l'ammodernamento del sistema irriguo gestito dal Consorzio di Bonifica e permette di recuperare le risorse dell'Ofanto per destinarle all'esigenza potabile dell'ATO Puglia.

DATI STORICI

1999

L'opera è inclusa nell'Accordo di Programma sottoscritto il 5 agosto tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici. Nello stesso accordo vengono individuate le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due Regioni e le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato.

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

Le OPCM nn. 3187 e 3188 del 22 marzo stabiliscono che gli interventi inseriti negli Accordi di Programma e nelle Intese Istituzionali Stato-Regioni, nonché gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale in materia idrica devono essere compresi in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica redatto dal commissario delegato - Presidente della Regione Basilicata e dal commissario delegato - Presidente della Regione Puglia.

La Regione Puglia, con nota del 28 ottobre, individua l'intervento come prioritario.

In data 11 dicembre viene perfezionato l'Accordo di Programma del 1999 con un Accordo attuativo per il "Completamento del riordino e dell'ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio destra Ofanto e destra Rendina in agro di Lavello", individuando quale soggetto aggiudicatore il Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano.

Il Consorzio, con nota al MIT del 16 dicembre, dichiara che il progetto è disponibile a livello esecutivo e, l'iter approvativi, fa presente che il progetto dispone di SIA e che sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie. Il MIT trasmette la relazione istruttoria dell'opera, proponendo un finanziamento di 20 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 140, assegna all'opera l'importo complessivo di 20 Meuro a valere sui fondi di cui alla legge n. 166/2002, articolato in 10 Meuro per l'anno 2003 e 10 Meuro per l'anno 2004.

2004

Il Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano pubblica il bando di gara per un importo di 11,7 Meuro, soggetto a ribasso.

2005

L'opera viene aggiudicata all'Impresa Opere Pubbliche Spa per 7,9 Meuro. Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è 1.080 gg. dalla consegna.

2006

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Il 6 novembre viene sottoscritto Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia ove, però, non si fa riferimento agli schemi idrici.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche –

Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 58%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori del 86,78 %. L'ultimazione è prevista per il 15 settembre 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	20,000 Fonte: Delibera CIPE 140/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	20,000 Fonte: Delibera CIPE 140/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	20,000 Fonte: Delibera CIPE 140/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	20,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	19,880 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	19,680 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	19,683 Fonte: Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	19,880 Fonte: DEF 2012-2014
Disponibilità al 30 aprile 2011:	19,877
Fondi Legge Obiettivo	19,877 Fonte: Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano
Fondi residui:	-0,194

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	1) Si disponeva già di progetto, esecutivo per gli standard richiesti nel 1998. 2) L'importo lavori riportato comprende gli oneri per la sicurezza. 3) Non è stato necessario tenere una conferenza dei servizi; la si è comunque indicata come conclusa

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	11.707.528,86
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	319.662,03
Data inizio:	15/01/2002
Data fine:	22/05/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	128 giorni
Lavori:	1080 giorni
Data bando:	08/04/2004
CIG/CUI:	24911165F3
Data aggiudicazione:	29/03/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Opere Pubbliche S.p.A. Via Guidubaldo del Monte, 13 Roma
Codice fiscale aggiudicatario:	00600890925
Data contratto:	26/04/2005

Quadro economico:

Importo a base gara:	11.421.055,11
Importo oneri per la sicurezza:	286.473,75
Importo complessivo a base di gara:	11.707.528,86
Importo aggiudicazione:	7.910.446,79
Somme a disposizione:	7.975.269,81
Totale:	15.885.716,60
% Ribasso di aggiudicazione:	33,25
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	06/06/2005
Data presunta fine lavori:	15/09/2011
Stato avanzamento importo:	6.943.056,73
Stato avanzamento percentuale:	86,78
Data effettiva inizio lavori:	27/02/2006
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	15/09/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - Iniziale indisponibilità delle aree. Successivamente rapporto estremamente conflittuale con l' impresa.
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	

Note: Commissione di collaudo in corso d' opera. Collaudo tecnico-amministrativo previsto entro 180 gg. dalla ultimazione; per lo statico nulla è previsto nel C.S.A.

Contenzioso:

Totale riserve definite: 8
Importo totale riserve definite: 5.752.852,18
Totale riserve da definire: 7
Note: Con nota a parte, a mezzo mail, sarà meglio chiarita la situazione "riserve"

Sospensione lavori:

Numero totale: 12
Totale giorni sospensione: 268
Note: Molte sospensioni hanno durata di 5 - 10 gg.

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 0
Motivi: Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: Motivi di cui all' art. 132 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, che però non è chiaro come inserire nel pannello.
Importo: 7.711.904,96
Importo oneri sicurezza: 288.798,03
Somme a disposizione: 11.682.094,93
Totale: 19.682.797,92
Note: Nelle somme a disposizione è stata fatta confluire la voce "economie", rideterminata in € 3.394.582,63 a seguito accordo ai sensi art. 240 del 163/2006 e riconoscimento aumento dei costi ai sensi art. 133 del medesimo decreto.

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n. 36/1994

del 5 Gennaio 1994

Accordo di Programma Regioni Puglia e Basilicata e Ministero dei Lavori Pubblici del 5 Agosto 1999

Accordo attuativo Regioni Puglia e Basilicata e Ministero dei lavori pubblici del 11 Dicembre 2002

Delibera CIPE 140/2002

del 19 Dicembre 2002

Bando di gara Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano del 1 Aprile 2004

Avviso di aggiudicazione Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano del 27 Aprile 2005


Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia del 6 Novembre 2009

SCHEMI IDRICI

CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta

1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento

SCHEMA N. 165

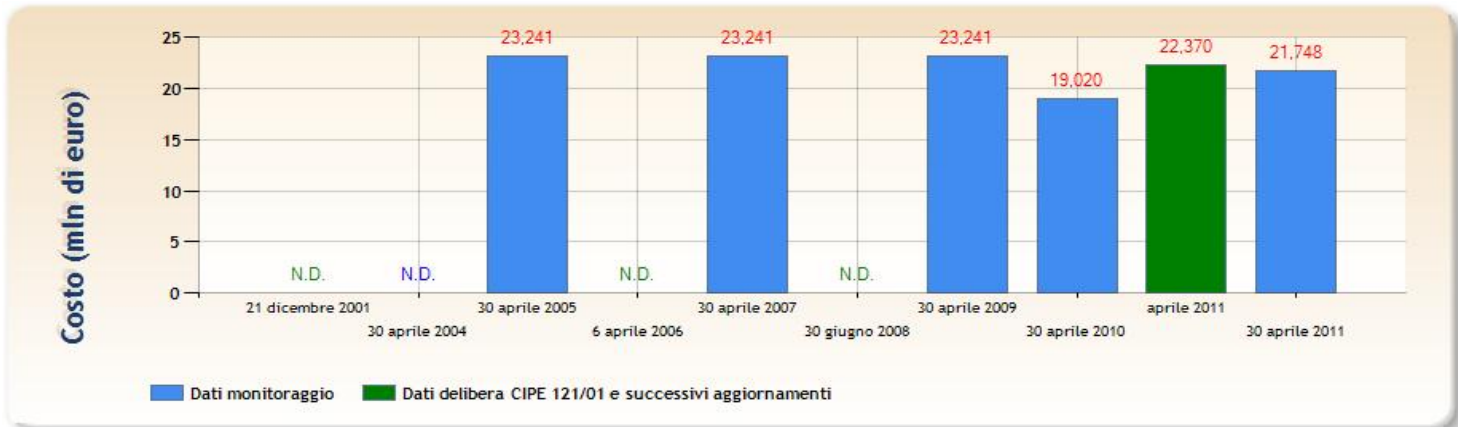

LOCALIZZAZIONE



CUP:

J94E04000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Sorical Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

49/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

2012

DESCRIZIONE

L'intervento, riferito alla realizzazione del primo lotto di completamento dello schema idrico della diga sul torrente Menta, prevede:

- il completamento e la piena funzionalità della galleria di derivazione, già realizzata, compresa la captazione/adduzione delle principali venute d'acqua che insistono sulla galleria per un eventuale uso potabile;
- la costruzione del pozzo piezometrico, ubicato nel massiccio del Monte Cendri, con diametro interno di 2,60m ed un'altezza di ca. 120m, di cui 3m fuori terra;
- la fornitura in opera di tutte le apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;
- l'esecuzione della camera a valvole in testa alla condotta forzata, da realizzare con un successivo lotto.

DATI STORICI

1999

L'Accordo di Programma Quadro siglato in data 27 ottobre tra Stato e Regione Calabria inserisce il progetto dello schema idrico del Menta tra le opere strategiche necessarie a completare lo schema idrico della Regione Calabria e, in particolare, della fascia reggina.

2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 tra gli interventi per l'emergenza idrica in Calabria.

2002

L'opera è compresa nell'IGQ tra Governo e Regione Calabria sottoscritta il 16 maggio.

Con nota della Regione Calabria dell'11 novembre si individua come soggetto aggiudicatore il Dipartimento 6° LL.PP. ed Acque-Settore Servizi Idrici Integrati della stessa Regione.

2003

Il Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria del Corpo Forestale dello Stato esprime parere favorevole, con prescrizioni, ai lavori di realizzazione del pozzo piezometrico, unica opera al di fuori delle precedenti autorizzazioni amministrative.

La Consulta Tecnica Regionale (COTER) della Regione Calabria esprime parere favorevole, con prescrizioni, demandando al responsabile del procedimento la verifica puntuale dei relativi adempimenti.

2004

Il responsabile del procedimento di verifica rende noto che sono in corso di adempimento le prescrizioni della COTER e che esse saranno completate prima della procedura di affidamento.

Con nota del 3 marzo la Regione Calabria comunica di aver raggiunto un accordo bonario con l'unica ditta esproprianda interessata ai lavori.

La Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria esprime parere favorevole affinché l'opera sia esclusa dalla VIA essendo soggetta solo all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del torrino esterno del pozzo piezometrico dell'altezza di circa 3 m, in quanto le altre opere sono previste all'interno della galleria e dentro l'invaso. Con la nota del 12 marzo il MIT trasmette la relazione istruttoria proponendo l'approvazione del progetto esecutivo con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico della legge n. 166/2002.

Nella delibera CIPE n. 49 si prende atto che il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, acquisito il parere positivo del Comune di Cardato, unico interessato alle opere, ha espresso parere favorevole e che il costo complessivo dell'intervento è di 23,2 Meuro, di cui 3,7 per IVA e che non è prevedibile un ritorno economico dalla gestione. Viene quindi approvato il progetto esecutivo del "Completamento dello schema idrico della diga sul Menta-1° lotto-Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico" e assegnato alla regione Calabria l'importo complessivo di 23,2 Meuro, a valere sulla legge n. 166/2002, da imputare all'anno 2005 per 11,2 Meuro e all'anno 2006 per ca. 12 Meuro.

2005

La Regione Calabria, in data 31 gennaio, pubblica il bando di gara n.1007 per Opere di adduzione dell'invaso sul torrente Menta-1° lotto Opera di presa e Galleria di derivazione - Lavori di completamento. L'importo complessivo d'appalto è 16,5 Meuro, di cui a corpo 10,8 e a misura 5,6. Gli oneri per la sicurezza sono circa 0,7 Meuro. Fissa in 650 gg. il termine d'esecuzione, mentre quello per la presentazione della domanda è il 25 marzo 2005. La gara indetta dalla Regione Calabria viene annullata e poi nuovamente indetta a cura della Società Risorse Idriche Calabresi (So.Ri.Cal. Spa), società mista a capitale pubblico maggioritario, in data 3 novembre 2006.

2006

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il 3 novembre la So.Ri.Cal. Spa pubblica il bando di gara per l'"affidamento dei lavori di completamento del I lotto delle opere di adduzione dall'invaso sul Torrente Menta da realizzare per il completamento della galleria di derivazione e opera di presa dell'invaso", per un importo complessivo di 13,8 Meuro.

2007

Il 22 marzo la So.Ri.Cal. Spa invia alla GUCE l'avviso di avvenuta aggiudicazione dei lavori all'Ati Consorzio Idrotecna con Luigi Notari Spa e Esi Costruzioni Sas.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Completamento galleria di derivazione ed opera di presa diga torrente Menta; pozzo piezometrico (I lotto)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Completamento galleria di derivazione ed opera di presa diga torrente Menta; pozzo piezometrico (I lotto)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 71%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento lavori dell'85 %. L'ultimazione è prevista nel mese di aprile 2012

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	23,241 Fonte: Delibera CIPE 49/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	23,241 Fonte: Delibera CIPE 49/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	23,241 Fonte: Delibera CIPE 49/2004
Previsione di costo al 30 aprile 2010	19,020 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	22,370 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	21,748 Fonte: Sorical Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011 20,600 **Fonte:** DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011: **23,241**
Fondi Legge Obiettivo 23,241 **Fonte:** Delibera CIPE 49/2004

Fondi residui: **-1,493**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: Sì
Importo lavori:
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 0,00
Data inizio: 08/06/2001
Data fine: 05/05/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Sorical Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 0 giorni
Lavori: 650 giorni
Data bando: 26/10/2006
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 27/02/2007
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI IDROTECNA - LUIGI NOTARI SPA - E.S.I COSTRUZIONI SAS
Codice fiscale aggiudicatario: 07597411003
Data contratto: 29/08/2007
Quadro economico:
Importo a base gara: 13.452.059,65
Importo oneri per la sicurezza: 389.726,70
Importo complessivo a base di gara: 13.841.786,35
Importo aggiudicazione: 10.841.786,35
Somme a disposizione: 12.443.795,78
Totale: 23.285.582,13
% Ribasso di aggiudicazione: 22,64
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 05/04/2007
Data presunta fine lavori: 14/01/2009
Stato avanzamento importo: 13.165.418,63
Stato avanzamento percentuale: 85,00
Data effettiva inizio lavori: 04/04/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/04/2012
Tempi realizzazione: In ritardo - N. 3 PROROGHE ULTIMAZIONE LAVORI - PRIMA DAL 20/01/2009 GG.223 - SECONDA: DAL 10/08/2009 GG.137 - TERZA DAL 31/12/2010 GG. 150
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: COLLAUDA TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO STATICO 31/05/2001 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO 30/11/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 108
Note: FATTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI IMPREVISTI DI NATURA GEOLOGICA CON CONSECUTIVA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 241
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 15.324.914,34
Importo oneri sicurezza: 550.177,52
Somme a disposizione: 25.872.872,17
Totale: 41.747.964,03
Note: DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL DIRETTORE COSTRUZIONI N. 339 DEL 06/08/2009

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo Programma Quadro Regione Calabria del 27 Ottobre 1999

IGQ tra Governo e Regione Calabria del 16 Maggio 2002

COTER Regione Calabria voto n. 548 del 11 Dicembre 2003

Delibera CIPE 49/2004

del 29 Settembre 2004

Bando di gara n.1007 Regione Calabria (gara annullata)


del Gennaio 2005

Bando di gara So.Ri.Cal. Spa del Novembre 2006

Avviso di avvenuta aggiudicazione So.Ri.Cal. Spa del Marzo 2007

SCHEMI IDRICI
CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta
2° lotto

SCHEMA N. 166

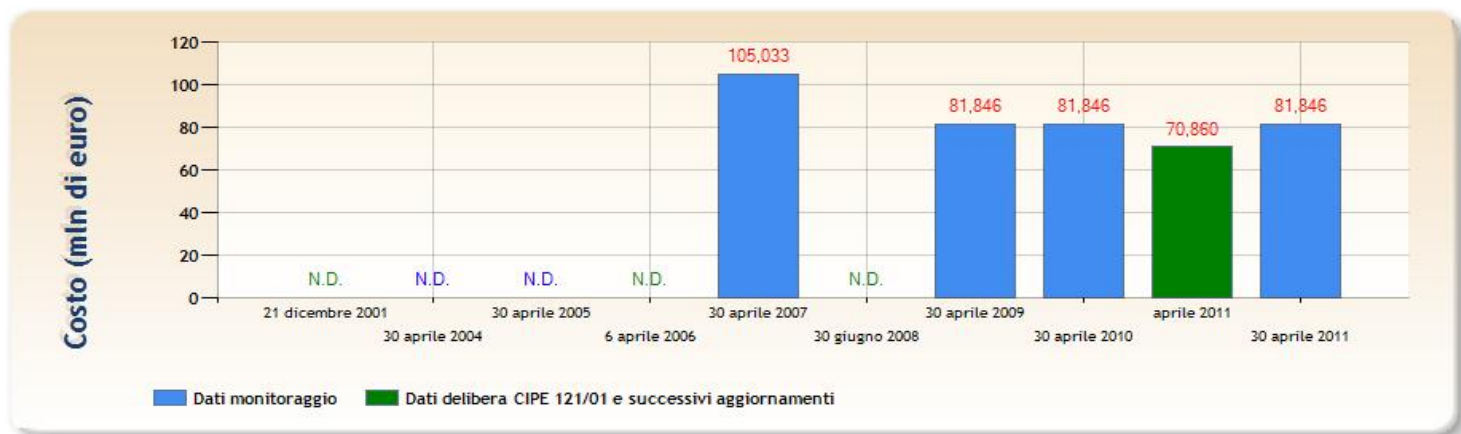

LOCALIZZAZIONE



CUP:

J94E04000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Sorical Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

154/2005
7/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

2012

DESCRIZIONE

L'intervento, riferito al II lotto di completamento dello schema idrico della diga sul torrente Menta, prevede la realizzazione di:

- una condotta forzata in acciaio di 8.932 m, in gran parte posata in trincea ed il resto in galleria;
- una centrale idroelettrica che ospiterà una turbina Pelton a due getti, con portata max di 2,5 metri cubi al secondo e potenza di 22,6 MW, con relativi quadri e servizi;
- delle opere di adduzione formate da un serbatoio di demodulazione, un impianto di potabilizzazione, una condotta di adduzione primaria e due adduttrici principali (adduttrice Nord ed adduttrice Sud) per 35 Km dalle quali si diramano le condotte di distribuzione per 30 Km.

DATI STORICI

1999

L'Accordo di Programma Quadro, siglato il 27 ottobre tra Stato e Regione Calabria, inserisce il progetto dello schema idrico del Menta tra le opere strategiche necessarie a completare lo schema idrico della Calabria e, in particolare, della fascia reggina.

2000

La Giunta regionale, con delibera del 12 gennaio, indice apposita selezione comparativa per la scelta di un socio di minoranza di una società a prevalente capitale pubblico cui affidare il completamento del complesso acquedottistico regionale e la sua gestione per il servizio di erogazione ai comuni calabresi al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, un riequilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi.

2001

L'intervento è incluso nella delibera n. 121 tra gli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Calabria.

2002

L'opera è compresa nell'IGQ tra Governo e Regione Calabria sottoscritta il 16 maggio.

La nota della Regione Calabria dell'11 novembre, individua quale soggetto aggiudicatore il Dipartimento 6° LL.PP. ed Acque – Settore Servizi Idrici Integrati della stessa Regione.

2003

A seguito della selezione comparativa per la scelta di un socio di minoranza di una società a prevalente capitale pubblico viene scelta l'ATI Enel Hydro Spa, con Acquedotto Pugliese Spa quale socio di minoranza ed si costituisce, in data 26 febbraio, la Società Risorse Idriche Calabresi Spa (SO.RI.CAL Spa). Successivamente il 46,5% della So.Ri.Cal. Spa è trasferito da Enel Hydro alla società francese Veolia - General des Eaux.

Il 13 giugno la Regione Calabria affida la realizzazione e la gestione delle opere idriche di interesse regionale alla Sorical S.p.A., società mista pubblico-privata costituita il 26 febbraio e partecipata per il 51% dalla Regione Calabria, per il 2,5% dalle Province calabresi e dall'ANCI e per il 46,5%, da Acque di Calabria Spa.

2004

Con la delibera n. 19, il CIPE ripartisce le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 riservando 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS e 288 Meuro alla "sicurezza", di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione del PIS.

Con la delibera n. 21, il CIPE finalizza i 1.130 Meuro della delibera n. 19 – al netto di 23 Meuro destinati alla premialità – ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal MIT, destinandoli al finanziamento - secondo la graduatoria – di alcuni interventi, tra cui figura anche, al 12° posto, l'opera "Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta: condotte di distribuzione e di potabilizzazione 3° lotto".

Il CIPE, con delibera n. 49, approva il progetto esecutivo del "Completamento dello schema idrico della diga sul Menta - 1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico", per 23,2 Meuro, assegnando alla Regione Calabria 23,2 Meuro e stabilendo, altresì, che il Piano economico finanziario riguardante i lotti successivi dovrà tener

conto dei rientri dell'intero schema idrico del Menta, compreso l'impianto idroelettrico.

2005

Il Ministero per i beni culturali, con nota del 24 gennaio, esprime parere favorevole.

La Commissione VIA, in data 10 maggio, esprime parere positivo con prescrizioni.

La delibera CIPE n. 98 finalizza le disponibilità residue ex delibera n. 21/2004 al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla undicesima della delibera n. 21/2004 e stabilisce che la sottoposizione al CIPE dei progetti avvenga entro ottobre 2005, pena la perdita delle disponibilità finanziarie.

Il Coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Corpo Forestale dello Stato, con nota del 24 settembre, esprime parere favorevole.

Il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, con nota del 18 ottobre, comunica che nella seduta del 28 settembre il COTER ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione, senza prescrizioni.

Il MIT, con nota del 26 ottobre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto preliminare corredata del Piano economico finanziario relativo all'intero schema idrico del Menta, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del FAS, per le opere di adduzione con un importo di 79,7 Meuro, IVA inclusa.

Il CIPE, con delibera n. 154, approva con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal MIT, il progetto preliminare, articolato in "Opere a valle della centrale idroelettrica" e "Condotta forzata e centrale idroelettrica", per un importo complessivo di 100,2 Meuro (comprensivo di IVA), di cui 20,5 (comprensivo di IVA) per le opere della condotta forzata e della centrale idroelettrica a carico del soggetto aggiudicatore, e 79,6 Meuro (comprensivo di IVA) per le opere di adduzione a valle della centrale a carico della finanza pubblica. Nella stessa seduta il CIPE assegna alla Regione Calabria un contributo max di 79,65 Meuro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del FAS.

2006

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

In data 10 maggio si svolge la CdS.

Il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole con prescrizioni, sui due progetti in cui si articola l'intervento.

La Commissione VIA esprime parere positivo con prescrizioni sul progetto definitivo.

2007

Il MIT, il 15 gennaio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto definitivo corredata da documentazione di carattere economico-finanziario relativa all'intero schema idrico del Menta, come richiesto dalla delibera n. 154/2005 di approvazione del progetto preliminare, proponendo l'approvazione del progetto definitivo con prescrizioni, e l'assegnazione definitiva del finanziamento di euro 79,6 Meuro, già assentito con delibera n. 154/2005 a carico del FAS.

La Regione Calabria, con nota dell'8 febbraio, dichiara che la realizzazione delle opere assicura piena funzionalità all'intero schema idrico, raggiungendo l'obiettivo prefissato di integrazione idro-potabile per la città di Reggio Calabria e la fascia costiera reggina da Bocale a Campo Calabro, senza necessità di realizzare ulteriori opere.

Il MIT, il 16 febbraio, trasmette al CIPE la documentazione integrativa, tra cui il piano economico-finanziario redatto in forma analitica.

La Regione Calabria, con nota del 21 febbraio, si impegna ad assicurare l'entrata in esercizio dell'intero sistema idrico del Menta entro 49 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del progetto definitivo, di cui 7 necessari per le procedure di gara, prevedendo anche la realizzazione – entro 32 mesi – di un primo lotto funzionale più urgente che permetterà di alimentare i serbatoi di Modena e Reggio Campi.

Il CIPE, con delibera n. 7, approva con le prescrizioni e raccomandazioni del MIT, il progetto definitivo articolato in "Condotta forzata e centrale idroelettrica" e "Opere a valle della centrale idroelettrica" per un importo complessivo di 105 Meuro (comprensivo di IVA), e assegna alla Regione Calabria un contributo massimo di 79,65 Meuro (comprensivo di IVA), a valere sul FAS.

2008

Il CIPE rimanda la determinazione del contributo definitivo in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera, divisa in due interventi "Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)" e "Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" articolata in 4 lotti: 1A Menta condotta forzata e c.le idroelettrica; 1B Menta c.le idroelettrica op. elettromeccaniche; 2A Menta opere a valle della c.le elettrica; 2B Menta Impianto di potabilizzazione. Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera, divisa in due interventi "Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)" e "Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori: primo intervento 66%, secondo 70%). Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" articolata in 4 lotti: 1A Menta condotta forzata e c.le idroelettrica; 1B Menta c.le idroelettrica op. elettromeccaniche; 2A Menta opere a valle della c.le elettrica; 2B Menta Impianto di potabilizzazione.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, i quattro lotti che compongono l'opera presentano un avanzamento lavori compreso tra il 90% e il 95% e la loro ultimazione è prevista entro settembre 2012.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	105,033 Fonte: Delibera CIPE 7/2007
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	81,846 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	81,846 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	70,860 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	81,846 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	70,470 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	105,033
So.Ri.Cal. Spa	25,378 Fonte: Delibera CIPE 10/2009; Delibera CIPE 7/2007.
Fondi Pubblici	79,655 Fonte: Delibera CIPE 10/2009; Delibera CIPE 7/2007

Fondi residui: **-23,187**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo Programma Quadro Regione Calabria del 27 Ottobre 1999

Delibera di Giunta Regionale n. 5

del 12 Gennaio 2000

IGQ tra Governo e Regione Calabria del 16 Maggio 2002

Legge n. 289/2002 (artt. 60 e 61)

del 27 Dicembre 2002

Convenzione Regione Calabria-SO.RI.CAL del 13 Giugno 2003

Legge n. 350/2003 (art. 4, comma 128)

del 24 Dicembre 2003

Delibera CIPE 19/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 49/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 98/2005

del 29 Luglio 2005

Delibera CIPE 154/2005

del 2 Dicembre 2005

Delibera CIPE 7/2007

del 16 Marzo 2007

Bandi di gara So.Ri.Cal. Spa del Luglio 2007

Avviso di aggiudicazione So.Ri.Cal. Spa del Novembre 2007

Avviso di aggiudicazione So.Ri.Cal. Spa del Dicembre 2007

Centrale Idroelettrica S. San Salvatore e Condotta Forzata - Opere Civili

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 13.068.344,37

Servizio: Interno

Costo progettazione interno: 0,00

Data inizio: 13/03/2007

Data fine: 06/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Sorical Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	0 giorni
Lavori:	608 giorni
Data bando:	21/06/2007
CIG/CUI:	00501698C2
Data aggiudicazione:	23/10/2007
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI SRL - IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	01533430797
Data contratto:	08/01/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	12.514.529,45
Importo oneri per la sicurezza:	553.814,92
Importo complessivo a base di gara:	13.068.344,37
Importo aggiudicazione:	8.148.919,55
Somme a disposizione:	9.583.991,21
Totale:	17.732.910,76
% Ribasso di aggiudicazione:	39,31
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	12/12/2007
Data presunta fine lavori:	11/08/2009
Stato avanzamento importo:	7.727.800,00
Stato avanzamento percentuale:	94,00
Data effettiva inizio lavori:	12/12/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/09/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo - PRIMA PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE GG. 90 DAL 31/12/2009 AL 10/03/2010
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO INN CORSO D'OPERA - DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO STATICO 01/10/2012 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO 30/12/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 629
Note: PRIMA SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DAL 22/10/2008 AL 23/02/2009 GG 124 - SECONDA SOSPENSIONE TOTALE LAVORI DAL 28/01/2010 AL 17/06/2011 GG 505 - ADEGUAMENTO PROGETTO EDIFICIO CENTRALE IDROELETTRICA

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 202
Motivi:
Altri motivi: N. 1 PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI GG. 90 DA 31/12/2009 AL 10/03/2010
Importo: 10.941.832,09
Importo oneri sicurezza: 553.814,92
Somme a disposizione: 6.062.365,30
Totale: 17.558.012,31
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009 2011
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2012

Centrale Idroelettrica S. San Salvatore - Opere elettromeccaniche

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 4.783.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 62.080,00
Importo di aggiudicazione: 80.000,00
Nome aggiudicatario: CO-VER ENERGIA SRL
Codice fiscale aggiudicatario: 01560970038
Data inizio: 13/03/2007
Data fine: 06/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Sorical Spa
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	750 giorni
Data bando:	27/11/2007
CIG/CUI:	0050303757
Data aggiudicazione:	03/01/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CO-VER ENERGIA SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	01560970038
Data contratto:	12/07/2008

Quadro economico:

Importo a base gara:	4.845.080,00
Importo oneri per la sicurezza:	92.283,00
Importo complessivo a base di gara:	4.937.363,00
Importo aggiudicazione:	4.932.283,00
Somme a disposizione:	1.902.804,31
Totale:	6.835.087,31
% Ribasso di aggiudicazione:	0,10
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: L'importo complessivo del Quadro Economico a seguito di gara è pari ad € 6.835.087,31 e non € 6.778.087,31 così come viene calcolato in automatico nella precedente finestra.
MODALITA' DI SELEZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO -
I TEMPI DI ESECUZIONE PROGETTAZIONE SONO RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	30/07/2008
Data presunta fine lavori:	30/07/2010
Stato avanzamento importo:	2.479.200,00
Stato avanzamento percentuale:	50,26
Data effettiva inizio lavori:	30/07/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/09/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGA SOSPENSIONE LAVORI

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO: 01/10/2012 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO: 31/12/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

1

Totale giorni sospensione:

334

Note:

SOSPENSIONE LAVORI DAL 29/01/2010 AL 05/07/2010 E PROROGATA DAL 09/07/2010 AL 02/01/2011 POICHE' I LAVORI A MONTE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA HANNO SUBITO RALLENTAMENTI PER CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale:

0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

2011

Previsione al 30/04/2010

2011

Previsione al 30/04/2011

2012

Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Condotte di distribuzione

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Conclusa

Note:

IL PROGETTO E' STATO REDATTO DALLA DIREZIONE TECNICA SO.RI.CAL.

Progettazione esecutiva

CIPE:

Si

Importo lavori:

46.399.034,25

Servizio:

Interno

Costo progettazione interno:

0,00

Data inizio: 13/03/2007
Data fine: 06/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Sorical Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 0 giorni
Lavori: 768 giorni
Data bando: 21/06/2007
CIG/CUI: 0050326A51
Data aggiudicazione: 23/10/2007
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI VINCENZO RESTUCCIA - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE
Codice fiscale aggiudicatario: 01533430797
Data contratto: 08/01/2008

Quadro economico:

Importo a base gara: 45.862.449,91
Importo oneri per la sicurezza: 536.584,35
Importo complessivo a base di gara: 46.399.034,26
Importo aggiudicazione: 26.851.291,39
Somme a disposizione: 23.104.863,53
Totale: 49.956.154,92
% Ribasso di aggiudicazione: 42,62
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 12/12/2007
Data presunta fine lavori: 28/02/2012
Stato avanzamento importo: 26.675.200,00
Stato avanzamento percentuale: 90,00
Data effettiva inizio lavori: 12/12/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 01/03/2012
Tempi realizzazione: In ritardo - SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DAL 14/10/2010 AL 31/05/2011 GG. 229
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera - Collaudo Statico data prevista inizio: 01/03/2012 data prevista fine: 30/06/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	300
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	29.097.865,87
Importo oneri sicurezza:	536.584,34
Somme a disposizione:	20.321.704,71
Totale:	49.956.154,92
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	2011
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2012

Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Impianto di potabilizzazione

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 10.726.695,68

Servizio: Esterno

Importo a base gara: 191.582,11

Importo di aggiudicazione: 100.019,59

Nome aggiudicatario: ACCIONA AGUA S. A. - COSTRUZIONI GENERALI SICLARI AGOSTINO

Codice fiscale aggiudicatario: 04694710965

Data inizio: 12/12/2007

Data fine: 29/12/2008

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Sorical Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	190 giorni
Data bando:	21/06/2007
CIG/CUI:	0050297265
Data aggiudicazione:	13/10/2007
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ACCIONA AGUA S. A. - COSTRUZIONI GENERALI SICLARI AGOSTINO
Codice fiscale aggiudicatario:	04694710965
Data contratto:	08/01/2008

Quadro economico:

Importo a base gara:	10.764.132,20
Importo oneri per la sicurezza:	154.145,59
Importo complessivo a base di gara:	10.918.277,79
Importo aggiudicazione:	8.149.737,25
Somme a disposizione:	5.071.563,15
Totale:	13.221.300,40
% Ribasso di aggiudicazione:	25,72
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: L'importo complessivo del Quadro Economico a seguito di gara è pari ad € 15.428.039,17 e non ad € 15.798.258,83 così come risulta dal calcolo effettuato in automatico nel riquadro precedente.
I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE SI RIFERISCONO AL PROGETTO ESECUTIVO.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	12/12/2007
Data presunta fine lavori:	29/11/2008
Stato avanzamento importo:	8.057.475,94
Stato avanzamento percentuale:	94,39
Data effettiva inizio lavori:	12/12/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/11/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - N. 3 PROROGHE TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI - 1: DAL 28/11/2008 - GG. 57 2: 30/01/2009 GG.40 3: 09/03/2009 GG. 30

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO 01/12/2011 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO 31/03/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

1

Totale giorni sospensione:

763

Note:

SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DAL 07/04/2009 AL 10/05/2011

Varianti:

Numero totale:

1

Giorni proroga totali:

10

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

8.374.949,66

Importo oneri sicurezza:

161.732,75

Somme a disposizione:

4.684.617,99

Totale:

13.221.300,40

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

2011

Previsione al 30/04/2010

2011



Previsione al 30/04/2011

2011

SCHEMI IDRICI

SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio

SCHEDA N. 167

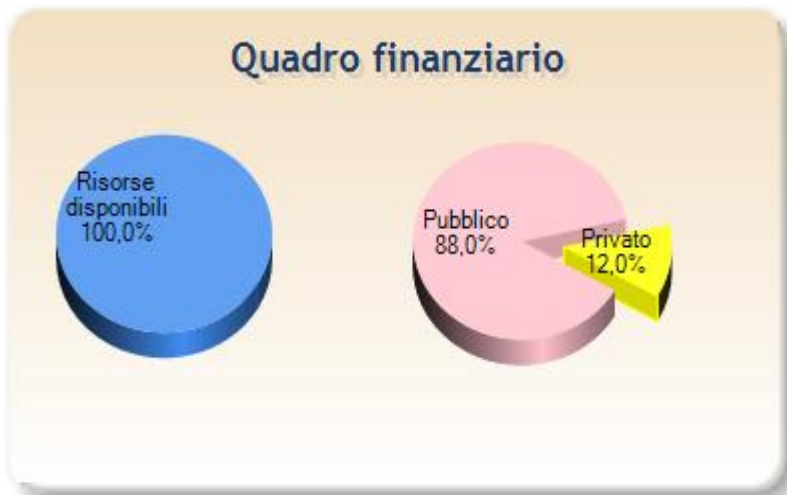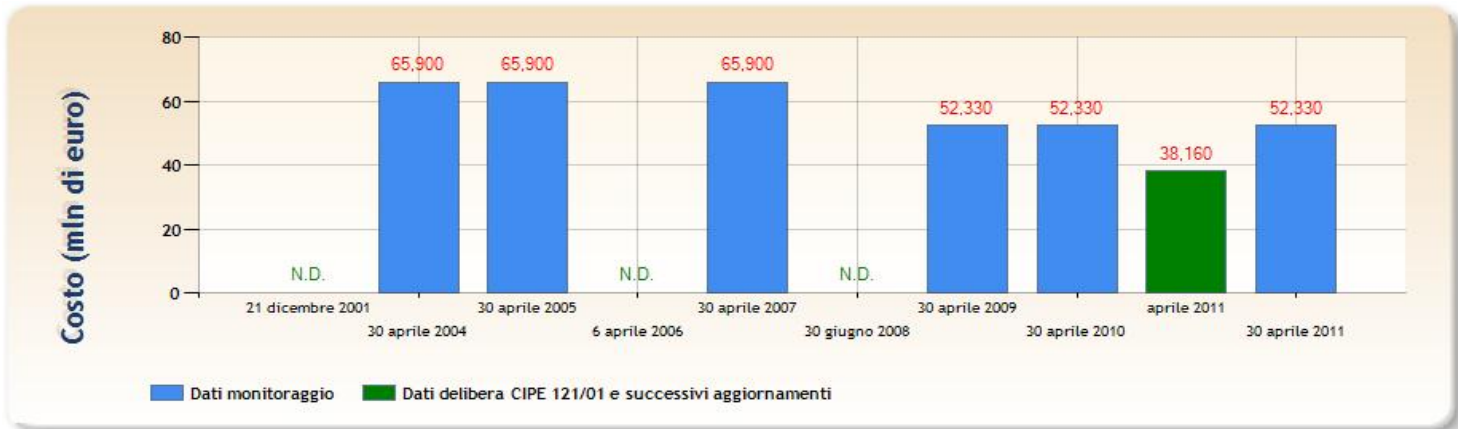

LOCALIZZAZIONE



CUP:

J17H02000090004

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

137/2002
53/2007
76/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

2008

DESCRIZIONE

L'intervento riguarda il rifacimento ex novo dell'attuale acquedotto Favara di Burgio di Km 50 ca., costruito negli anni '50, e delle opere di adduzione, nonché il collegamento con i serbatoi comunali e con l'acquedotto Dissalata Gela-Aragona, per rendere possibile l'interscambio di portate fra i due sistemi.

DATI STORICI

2000

Con OPCM n. 3052 l'intervento per l'acquedotto di Favara di Burgio viene dichiarato prioritario per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario.

2001

In data 5 ottobre viene firmato l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione siciliana, nel quale l'acquedotto Favara di Burgio è compreso tra gli interventi individuati come prioritari e strategici con un fabbisogno finanziario di 26,3 Meuro.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

La progettazione esecutiva viene affidata con bando di gara e la consegna è fissata al gennaio 2003.

Il progetto preliminare redatto dall'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) prevedeva una spesa di 26,3 Meuro, di cui il 30% a carico dell'EAS e il 70% a valere sui finanziamenti UE.

Il progetto definitivo viene trasmesso all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica il 16 settembre.

Il Commissario delegato convoca la CdS per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed i nulla-osta, dichiarando conclusi i lavori il 7 novembre.

Nella stessa data, la Commissione regionale dei lavori pubblici approva il progetto definitivo.

Con la nota del 18 dicembre, il MIT trasmette la relazione istruttoria sull' "Acquedotto Favara di Burgio" proponendo un finanziamento di 39,6 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 137, prende atto che esiste il progetto definitivo con le richieste approvazioni e che è in corso di preparazione il progetto esecutivo. Il nuovo costo indicato dal progetto definitivo è di 65,9 Meuro, dei quali 26,3 già disponibili nell'APQ Risorse idriche. Il CIPE assegna quindi all'opera un contributo di 39,6 Meuro a valere sulla legge n. 166/2002, articolati in 20 Meuro per il 2003 e 19,6 per il 2004.

2003

Il progetto esecutivo viene approvato dalla CdS il 4 marzo.

L'OPCM n. 3299 dispone che Il Presidente della regione Siciliana, in qualità di Commissario delegato, provveda alla realizzazione, con somma urgenza, di alcuni interventi, tra cui l'acquedotto Favara di Burgio. Il Commissario può inoltre affidare, in deroga alla disciplina ordinaria, la progettazione delle opere necessarie al superamento dell'emergenza idrica.

2004

La Società Siciliacque Spa (Società mista che sostituisce l'Ente Acquedotti Siciliani) bandisce la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'Acquedotto Favara di Burgio per un importo complessivo di 50,8 Meuro. La scadenza è fissata al 25 novembre.

2005

Siciliacque Spa, il 15 settembre, aggiudica la gara all'ATI, composto dal Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro con Uniland Srl, per un importo di 38,4 Meuro.

2006

Il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 28 febbraio attribuisce al Commissario delegato le competenze relative all'acquedotto.

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

L'OPCM n. 3533 delega il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario straordinario, all'attuazione e al completamento delle iniziative programmate entro il 31 dicembre 2006. A decorrere da tale termine il Commissario trasferirà beni e attrezzature alle amministrazioni ordinariamente competenti

Il 31 dicembre, a seguito della scadenza dell'ordinanza n. 3533, le competenze attribuite al Commissario delegato vengono trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Sicilia.

2007

L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, con nota del 20 aprile, chiede di essere individuata come soggetto aggiudicatore dell'opera.

Il MIT, con nota del 27 giugno, trasmette al CIPE "la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore", esprimendosi favorevolmente sulla richiesta formulata in tal senso dall'Agenzia regionale per i rifiuti

Il CIPE, con delibera n. 53, individua per l'opera "Acquedotto Favara Burgio" quale nuovo soggetto aggiudicatore l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana. L'opera dovrà essere ultimata e posta in esercizio entro la fine del 2008.

2008

Il 14 settembre viene rilasciato il certificato di fine lavori.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Il CIPE, con delibera n. 76, prende atto che i lavori sono stati ultimati e che dal 1 gennaio 2010 è stata soppressa l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Le funzioni e compiti dell'Agenzia sono stati trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, che viene quindi individuato quale nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010". Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 100%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che i lavori sono stati completati nel 2008 e collaudati nel 2009.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	65,900 Fonte: Delibera CIPE 137/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	65,900 Fonte: Delibera CIPE 137/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	65,900 Fonte: Delibera CIPE 137/2002

Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	52,330 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	52,330 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	38,160 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	52,330 Fonte: DPEF 2010-2013; Delibera CIPE 10/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte:
Risorse disponibili ad aprile 2011	65,890 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	65,898
Fondi Pubblici	18,438 Fonte: Delibera CIPE 137/2002
Fondi Legge Obiettivo	39,560 Fonte: Delibera CIPE 137/2002
Fondi Privati	7,900 Fonte: Delibera CIPE 137/2002

Fondi residui: **-13,568**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Il compenso per la prestazione è stato determinato applicando alle tariffe professionali vigenti i ribassi percentuali offerti

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	50.949.000,00
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	573.000,00
Nome aggiudicatario:	A.T.I. Studio Galli S.r.l. (capogruppo); Studio Tecnico D'Alessandro Associati; Kappa Progetti F.lli Carlino; Noesis Italia S.r.l.; Ing. Gaetano Chiapparo
Codice fiscale aggiudicatario:	01155390287
Data inizio:	13/02/2002
Data fine:	06/05/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia-Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	96 giorni

Lavori: 24 mesi
Data bando: 15/10/2004
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/09/2005
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (capogruppo) e UNILAND società consortile a responsabilità limitata (mandante)

Codice fiscale aggiudicatario: 00080170392

Data contratto: 09/11/2005

Quadro economico:

Importo a base gara: 49.982.000,00

Importo oneri per la sicurezza: 812.000,00

Importo complessivo a base di gara: 50.794.000,00

Importo aggiudicazione: 38.453.444,00

Somme a disposizione: 15.104.198,00

Totale: 53.557.642,00

% Ribasso di aggiudicazione: 24,69

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia ha individuato (nel 2004) in SICILIACQUE S.p.A. il soggetto attuatore dell'intervento demandando alla stessa anche l'espletamento delle procedure di affidamento.
Quadro Finanziario: delibera CIPE 137/02 € 39560000 e delibera CIPE 36/02 € 18438000;

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori: 15/11/2005

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo: 38.852.352,61

Stato avanzamento percentuale: 100,00

Data effettiva inizio lavori: 15/11/2005

Data effettiva fine lavori: 17/11/2008

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico: 23/02/2009

Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/11/2009

Note: i lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati dalla commissione di collaudo con atto del 30 novembre 2009

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:



NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n.3052 del 31 Marzo 2000
Accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana del 5 Ottobre 2001
Ordinanze ministeriali n.3189/02 e n.3224/02
del 2002
Delibera CIPE 137/2002
del 19 Dicembre 2002
Ordinanza n.3299 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Luglio 2003
Bando di gara Siciliacque Spa del Ottobre 2004
Avviso di aggiudicazione Siciliacque Spa del Settembre 2005
Delibera CIPE 53/2007
del 20 Luglio 2007
Delibera CIPE 76/2010 del 22 Luglio 2010

SCHEMI IDRICI

SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona

SCHEDA N. 168

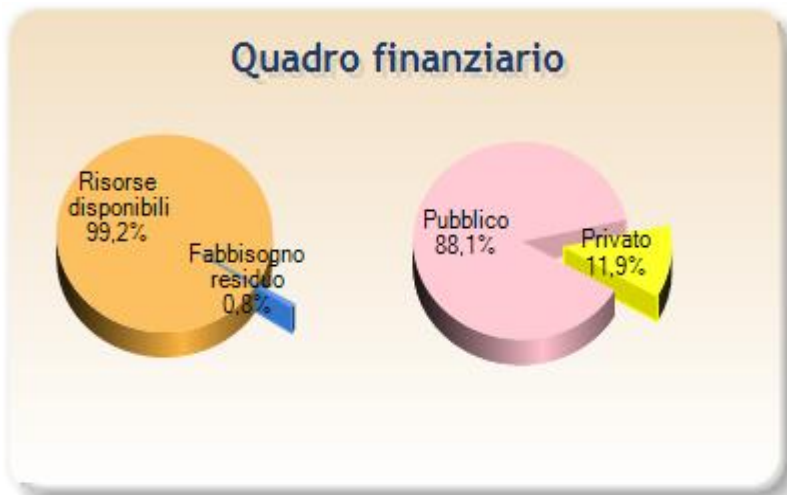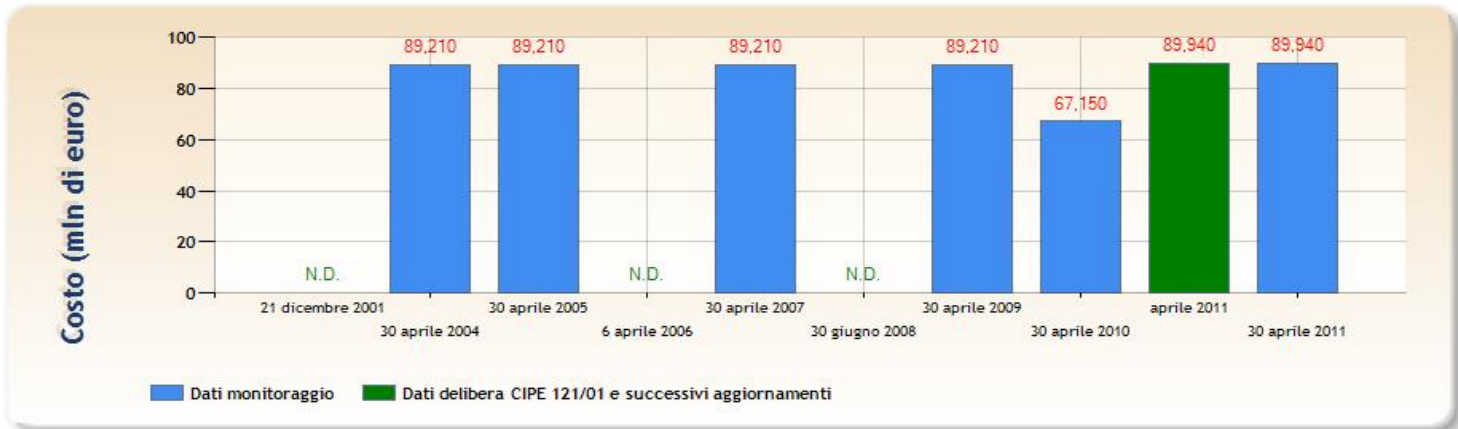

LOCALIZZAZIONE



CUP:

J17H02000080004

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

136/2002
52/2007
75/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

L'acquedotto "Dissalata Gela-Aragona", di Km 90, già ricostruito negli anni 70, consente il trasferimento di risorse idriche dall'impianto di dissalazione gestito dall'Agip nel comune di Gela (CI) al comprensorio di Agrigento ed alla stessa città di Agrigento, beneficiando, nel contempo, 5 comuni (Gela, Niscemi, Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento, Aragona) per un bacino di utenza di 205.000 abitanti. Una volta completato il serbatoio Blufi sul fiume Imera meridionale, l'acquedotto potrà convogliare sullo stesso percorso le risorse idriche provenienti anche da tale serbatoio.

L'intervento consiste in opere di adduzione, adeguamento di alcuni serbatoi e stazioni di sollevamento esistenti, realizzazione di due nuovi serbatoi di linea aventi funzione di compenso e di disconnessione, collegamento con i serbatoi comunali e con l'acquedotto Favara di Burgio, al fine di rendere possibile l'interscambio di portate fra i due sistemi.

DATI STORICI

2000

Con OPCM n. 3052 l'intervento per l'acquedotto Gela-Aragona viene dichiarato prioritario ed urgente per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario.

2001

In data 5 ottobre viene firmato l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione siciliana, nel quale l'acquedotto Gela Aragona è compreso tra gli interventi prioritari con un fabbisogno finanziario stimato di 35,6 Meuro.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

Il progetto definitivo viene trasmesso all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica in data 14 settembre. Il Commissario delegato convoca la CdS per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e i nulla-osta, dichiarando conclusi i lavori in data 16 dicembre.

Lo stesso giorno, la Commissione regionale dei lavori pubblici approva il progetto definitivo.

Il 18 dicembre il MIT trasmette la relazione istruttoria sull' "Acquedotto Gela-Aragona" proponendo un finanziamento di 53,6 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 136, prende atto che esiste il progetto definitivo con le richieste approvazioni e che è in preparazione il progetto esecutivo. Il nuovo costo indicato dal progetto definitivo è di 89,2 Meuro, dei quali 35,6 già disponibili nell'APQ Risorse idriche. Il CIPE assegna quindi all'opera un contributo di 53,6 Meuro, a valere sulla legge n. 166/2002, articolati in 27 Meuro per l'anno 2003 e 26,6 per il 2004.

2003

L'OPCM n. 3299 dispone che Il Presidente della regione Siciliana, in qualità di Commissario delegato, provveda alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di alcuni interventi, tra cui l'acquedotto Gela Aragona. Il Commissario delegato può inoltre affidare, in deroga alla disciplina ordinaria, la progettazione delle opere per il superamento dell'emergenza.

2004

La Società Siciliacque Spa (Società mista che sostituisce l'Ente Acquedotti Siciliani) bandisce la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona, per complessivi 69,5 Meuro. La scadenza è fissata al 29 novembre.

2006

Il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio attribuisce al Commissario delegato le competenze relative all'acquedotto.

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

L'OPCM n. 3533 delega il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario straordinario, all'attuazione e al completamento delle iniziative programmate, entro il 31 dicembre 2006. Dopo tale termine il Commissario trasferirà beni e attrezzature alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Il 31 dicembre, a seguito della scadenza dell'ordinanza n. 3533, le competenze attribuite al Commissario delegato vengono trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana.

2007

L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, con nota del 20 aprile, chiede di essere individuata come soggetto aggiudicatore dell'opera.

Il 26 giugno Siciliacque aggiudica l'opera all'Ati Tecnis Spa, Si.Gen.Co. Spa per un importo totale dell'appalto di 47,45 Meuro.

Il MIT, con nota del 27 giugno, trasmette al CIPE la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore esprimendosi favorevolmente sull'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Il CIPE, con delibera n. 52, individua il nuovo soggetto aggiudicatore nell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana. L'opera dovrà essere ultimata ed essere posta in esercizio entro la fine del 2009.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Il CIPE, con delibera n. 75, prende atto che i lavori, il cui termine era stato fissato al 31 dicembre 2009, non sono stati ultimati e che dal 1 gennaio 2010 è stata soppressa l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Le funzioni e compiti dell'Agenzia sono stati trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, che viene quindi individuato quale nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto Gela - Aragona" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2014 l'opera "Acquedotto Gela - Aragona" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento dei lavori dell'84%. L'ultimazione è prevista per luglio 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	89,210 Fonte: Delibera CIPE 136/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	89,210 Fonte: Delibera CIPE 136/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	89,210 Fonte: Delibera CIPE 136/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	89,210 Fonte: Delibera CIPE 136/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2010	67,150 Fonte: DPEF 2010-2013

Costo ad aprile 2011 89,940 **Fonte:** DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011 89,940 **Fonte:** DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011 89,200 **Fonte:** DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	89,210
Fondi Pubblici	25,000 Fonte: Delibera CIPE 136/2002
Fondi Legge Obiettivo	53,570 Fonte: Delibera CIPE 136/2002
Fondi Privati	10,640 Fonte: Delibera CIPE 136/2002

Fabbisogno residuo: **0,730**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: l'importo della prestazione è definito applicando alle Tariffe Professionali vigenti, le percentuali di ribasso offerte;

Progettazione esecutiva

CIPE: Sì
Importo lavori: 69.514.243,65
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: A.T.I studio Altieri S.p.A. (capogruppo); Technital S.p.A.; Omniservice Engineering S.r.l.; Ingegneria e Servizi S.r.l.; Ing. Manno Zagarella Diego
Codice fiscale aggiudicatario: 03100790249
Data inizio: 22/08/2002
Data fine: 11/04/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia-Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 24 mesi
Data bando: 22/10/2004
CIG/CUI: 24082842D3
Data aggiudicazione: 26/06/2007

Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: TECNIS S.p.A. (capogruppo) - SI.GEN.CO. (cooptata)
Codice fiscale aggiudicatario: 02766640870
Data contratto: 20/09/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 67.214.000,00
Importo oneri per la sicurezza: 2.300.000,00
Importo complessivo a base di gara: 69.514.000,00
Importo aggiudicazione: 47.454.365,20
Somme a disposizione: 19.691.000,00
Totale: 67.145.365,20
% Ribasso di aggiudicazione: 32,82
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia ha individuato (nel 2004) in SICILIACQUE S.p.A. il soggetto attuatore dell'intervento demandando alla stessa anche l'espletamento delle procedure di affidamento.
Quadri finanziario: delibera CIPE 136/2002 € 53570000+ delibera CIPE 84/00 € 24944868;

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 15/10/2007
Data presunta fine lavori: 01/07/2011
Stato avanzamento importo: 39.969.693,53
Stato avanzamento percentuale: 84,00
Data effettiva inizio lavori: 15/10/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: in corso di nomina da parte della Regione Siciliana

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:

Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3052 del 31 Marzo 2000

Accordo di Programma Quadro Stato-Regione siciliana del 5 Ottobre 2001

Ordinanze ministeriali n.3189/02 e n.3224/02

del 2002

Delibera CIPE 136/2002

del 19 Dicembre 2002

Ordinanza n.3299 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Luglio 2003

Bando di gara Siciliacque Spa del Ottobre 2004

Avviso di aggiudicazione Siciliacque Spa del Luglio 2007

Delibera CIPE 52/2007 del 20 Luglio 2007


Bando Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque del 11 Luglio 2008

Delibera CIPE 75/2010 del 22 Luglio 2010

SCHEMI IDRICI

SIC - Acquedotto Montescuro Ovest

SCHEMA N. 169

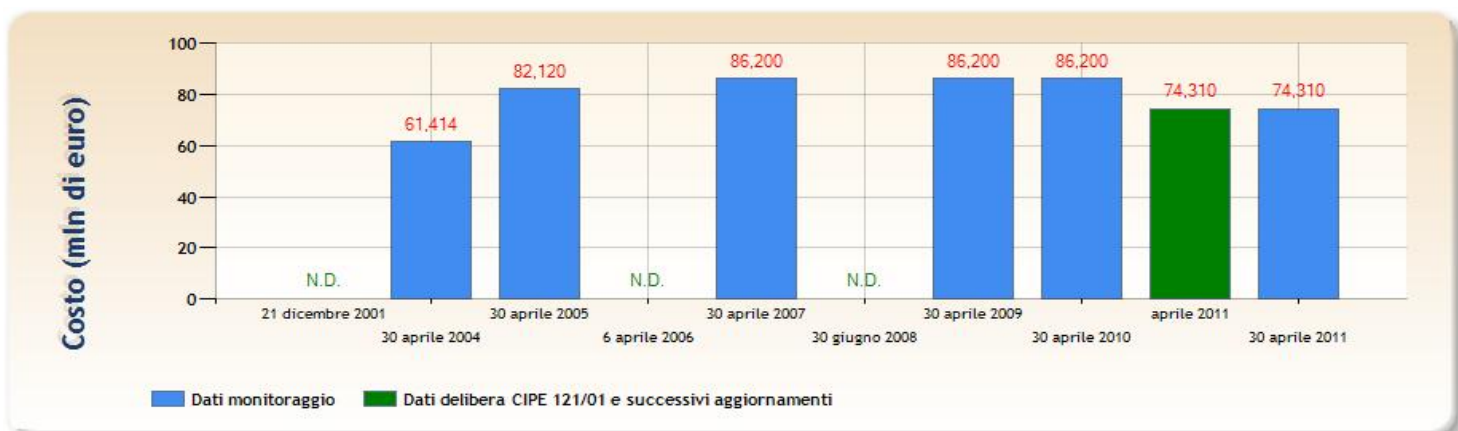

LOCALIZZAZIONE



CUP:

J15F04000050004

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana

STATO DI ATTUAZIONE

Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato

DELIBERE CIPE

114/2004
88/2006
54/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

Il contratto d'appalto è stato risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DPR 252/98 a seguito di informativa della Prefettura di Roma. In corso il riaffidamento dei lavori di completamento.

DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione dell'Acquedotto Montescuro Ovest che servirà 24 Comuni per un totale di 441.060 abitanti. In particolare il progetto prevede: la ricostruzione dell'acquedotto esistente dalle sorgenti Montescuro fino a Salemi per 69,3 Km di condotte in acciaio DN 250 – 500 mm; la costruzione della nuova adduttrice "Montescuro Ovest Basso" dal nodo di Menfi a Trapani per 71 Km di condotte in acciaio DN 400 - 800 mm; la ricostruzione delle adduttrici dalle sorgenti Montescuro, Madonna della Scala, Fontana Grande e Grancio verso il Montescuro Ovest per circa 13 Km di condotte in acciaio DN 250 mm; la ricostruzione delle principali diramazioni verso i Comuni serviti per 63 Km di condotte in acciaio DN 100 – 400 mm; la costruzione di partitori, scarichi, vasche di sconnessione, impianti di sollevamento, opere di attraversamento, protezione catodica ed altre opere minori; la manutenzione straordinaria delle varie opere; la predisposizione di un sistema di telecontrollo sull'intero acquedotto.

DATI STORICI

2000

Con l'OPCM n. 3052 l'intervento per l'acquedotto di Montescuro Ovest viene dichiarato prioritario ed urgente per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario.

2001

In data 5 ottobre viene firmato l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione Siciliana, nel quale l'acquedotto Montescuro Ovest è compreso tra gli interventi individuati come prioritari e strategici con un fabbisogno finanziario stimato di 61,9 Meuro. La progettazione sarà curata dalla Sogesid Spa. Il soggetto proponente è l'Ente Acquedotti Siciliani, in attesa della costituzione di una società mista Regione - privati (Siciliacque). Deve essere garantito il cofinanziamento con fondi propri. Viene inoltre istituita la figura di soggetto responsabile del singolo intervento. L'intervento compare nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

La delibera CIPE n. 36 del 3 maggio, in attuazione della legge finanziaria 2002, assegna all'Acquedotto Montescuro Ovest 43 Meuro.

Il Presidente della Giunta Regionale della Sicilia, con nota del 6 dicembre, individua il soggetto aggiudicatore nel Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia.

2003

L'OPCM n. 3299 dispone che Il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario delegato, provveda alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di alcuni interventi, tra cui l'acquedotto Montescuro Ovest. Il Commissario delegato può inoltre affidare, in deroga alla disciplina ordinaria, la progettazione delle opere necessarie al superamento dell'emergenza idrica.

In data 24 settembre si svolge la prima seduta della CdS consultiva e la seconda seduta il 28 ottobre.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 14 ottobre.

2004

L'Assessorato territorio della Regione Siciliana, con nota del 14 ottobre, formula parere favorevole con prescrizioni.

Il Presidente della Regione Siciliana, con nota del 18 ottobre, esprime il consenso ai fini della localizzazione dell'opera.

Nello stesso giorno il Commissario delegato si esprime favorevolmente, con prescrizioni.

Il MIT, con nota del 18 novembre, trasmette la relazione istruttoria proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare, con prescrizioni e raccomandazioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse della legge n.166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003.

Il CIPE, con delibera n. 114, approva il progetto preliminare per un importo di 82,1 Meuro, assegnando un contributo di 20,5 Meuro a valere sulle risorse della legge n. 166/2002. Richiede, altresì, una versione aggiornata del piano economico finanziario, in grado di offrire elementi di maggiore dettaglio sulle determinanti della redditività del progetto, da presentare in sede di approvazione del progetto definitivo.

2005

In data 20 luglio, il soggetto aggiudicatore pubblica l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Il Commissario delegato, in concomitanza con la CdS, indice tre sedute di CdS a carattere consultivo (21 settembre, 10 novembre e 21 dicembre). Le risultanze delle CdS consultive sono raccolte nel parere n. 54 della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici.

L'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Regione Siciliana competente per la provincia di Trapani, con nota del 18 ottobre, rilascia il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico.

In data 24 ottobre viene convocata la CdS.

L'Acquedotto Montescuro Ovest è compreso tra le "Infrastrutture strategiche. Intesa generale Quadro 2^a fase. Schema concordato con il MIT", come indicato dalla delibera della Giunta regionale della Regione Siciliana del 26 ottobre.

La Soprintendenza di Agrigento esprime parere favorevole con prescrizioni.

2006

Il MIT, con nota del 22 febbraio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto definitivo proponendo l'approvazione con prescrizioni, raccomandazioni e il programma delle interferenze. Ridetermina, altresì, in 20,4 Meuro il finanziamento assegnato dalla delibera n. 114/2004 a carico delle risorse stanziata dalla legge n.166/2002. Il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 febbraio attribuisce le competenze relative all'acquedotto al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia.

Il MIT, con nota dell'8 marzo, trasmette al CIPE il parere dell'UTFP sul piano economico-finanziario predisposto dal soggetto aggiudicatore, dal quale risulta che i livelli di redditività del progetto sono tali da rendere necessaria la contribuzione pubblica a fondo perduto.

Il MIT, con nota del 14 marzo, trasmette al CIPE lo schema analitico del piano economico-finanziario.

Il CIPE, con delibera n. 88, approva, con il progetto definitivo con prescrizioni e raccomandazioni ed il programma di risoluzione delle interferenze proposti dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con un importo di 86,2 Meuro e ridetermina in 20,4 Meuro il contributo a valere sui fondi di cui alla legge n. 166/2002.

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

L'OPCM n. 3533 delega il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica, all'attuazione e al completamento delle iniziative programmate, entro il 31 dicembre 2006. Dopo tale termine il Commissario trasferirà beni alle Amministrazioni ordinariamente competenti

Il 31 dicembre, a seguito della scadenza dell'OPCM n. 3533, le competenze del Commissario delegato vengono trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Sicilia.

2007

L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, con nota del 20 aprile, chiede di essere identificata quale soggetto aggiudicatore dell'opera.

Siciliacque S.p.A., in data 8 giugno, pubblica il bando di gara per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva, l'espletamento delle procedure espropriative e l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest.

Il MIT, con nota del 27 giugno, trasmette al CIPE "la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore", esprimendosi favorevolmente sulla richiesta formulata in tal senso dall'Agenzia regionale.

Il CIPE, con delibera n. 54, individua nell'Agenzia regionale il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera, che dovrà essere ultimata e posta in esercizio entro la fine del 2010.

2008

Il 6 giugno viene aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. Il valore totale inizialmente stimato dell'appalto è di 61,8 Meuro, IVA esclusa, e il valore finale di 50,8 Meuro, IVA esclusa. Risulta aggiudicataria SAFAB Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche per Azioni.

2009

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

A novembre il Prefetto della Provincia di Roma rilascia un'informativa antimafia negativa nei confronti della Safab Spa, capogruppo dell'ATI aggiudicataria dei lavori. Di conseguenza, Siciliacque Spa, rescinde il contratto finalizzato al completamento dei lavori dell'acquedotto Montescuro Ovest. Il ricorso presentato dalla Safab Spa al TAR del Lazio viene respinto con decreto del 15 dicembre del 2009 e successiva ordinanza del 15 gennaio 2010 (Atto n. 10558).

2010

Il Consiglio di Stato, con decreto del 22 gennaio ed ordinanza del 22 febbraio, sospende l'efficacia dell'interdittiva prefettizia, sia a difesa dei lavoratori impegnati nel cantiere dell'acquedotto, che per l'intervento di talune modifiche nell'assetto societario della Safab Spa. I giudici chiedono di verificare "se permangano o meno i presupposti per l'emissione dell'informativa antimafia".

Il 23 novembre dalla Prefettura di Roma viene emessa un'interdittiva antimafia verso la nuova Safab Spa.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto Montescuro Ovest" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Acquedotto Montescuro Ovest" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che il contratto d'appalto è stato risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DPR 252/98 a seguito di informativa della Prefettura di Roma e che la stazione appaltante sta procedendo al riaffidamento dei lavori di completamento. La percentuale di avanzamento è del 14,57%.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	61,414 Fonte: IGQ tra Stato e Regione Siciliana
Previsione di costo al 30 aprile 2005	82,120 Fonte: Delibera CIPE 114/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	86,200 Fonte: Delibera CIPE 88/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	86,200 Fonte: Delibera CIPE 88/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2010	86,200 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	74,310 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	74,310 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
---	---

Risorse disponibili ad aprile 2011

86,200 **Fonte:** DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	86,200
Fondi Legge Obiettivo	20,410 Fonte: Delibera CIPE 88/2006
Fondi Pubblici	47,200 Fonte: Delibera CIPE 88/2006
Fondi Privati	18,590 Fonte: Delibera CIPE 88/2006

Fondi residui:	-11,890
-----------------------	----------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	La redazione del progetto è stata effettuata da sogesid sulla base di apposita convenzione stipulata con la regione siciliana e con costi a gravare sul D.Lgs. 96/93. L'importo di aggiudicazione del servizio di progettazione è comprensivo di IVA ed è relativo alla progettazione preliminare ed a quella definitiva. Il progetto è stato predisposto per procedere all'affidamento mediante appalto integrato. L'importo lavori comprende sia gli oneri per sicurezza che le somme per procedure espropriative e per progettazione esecutiva da redigere a cura dell'impresa aggiudicataria.

Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	61.779.814,62
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	sogesid s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	04681091007
Data inizio:	28/05/2002
Data fine:	31/03/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	24 mesi
Data bando:	07/06/2007
CIG/CUI:	004330115CB
Data aggiudicazione:	06/06/2008
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	S.A.F.A.B. s.p.a. - GE.CO.PRE. s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	03512171004
Data contratto:	09/07/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	60.656.172,56

Importo oneri per la sicurezza:	1.123.642,06
Importo complessivo a base di gara:	61.779.814,62
Importo aggiudicazione:	50.797.680,15
Somme a disposizione:	24.423.589,71
Totale:	75.221.269,86
% Ribasso di aggiudicazione:	17,22
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: L'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque ha individuato in Siciliacque s.p.a. il soggetto attuatore dell'intervento, ivi incluso l'espletamento delle procedure di affidamento.
Nel quadro economico sono state riportate le somme a disposizione del progetto definitivo posto a base di gara.
Gli importi del quadro finanziario non contemplano l'IVA, fatta esclusione per le somme a carico del D.Lgs. 96/93 che invece la contempla.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	17/03/2011
Stato avanzamento importo:	7.220.535,04
Stato avanzamento percentuale:	14,57
Data effettiva inizio lavori:	18/03/2009

Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	

In ritardo - Il contratto d'appalto è stato risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del DPR 252/98 a seguito di informativa della Prefettura di Roma. La stazione appaltante sta procedendo al riaffidamento dei lavori di completamento.

Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n.3052 del 31 Marzo 2000

IGQ tra Stato e Regione Siciliana del 5 Ottobre 2001

Delibera CIPE 36/2002

del 3 Maggio 2002

Ordinanza 3299 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Luglio 2003

IGQ tra Governo e Regione Siciliana del 14 Ottobre 2003

Delibera CIPE 114/2004

del 20 Dicembre 2004

Delibera della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 489

del 26 Ottobre 2005

Delibera CIPE 88/2006

del 29 Marzo 2006

Bando di gara Siciliacque Spa del 8 Giugno 2007

Delibera CIPE 54/2007


del 20 Luglio 2007

Avviso di aggiudicazione gara Siciliacque Spa del Giugno 2008

SCHEMI IDRICI

SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1°, 2° e 3° lotto

SCHEDA N. 170

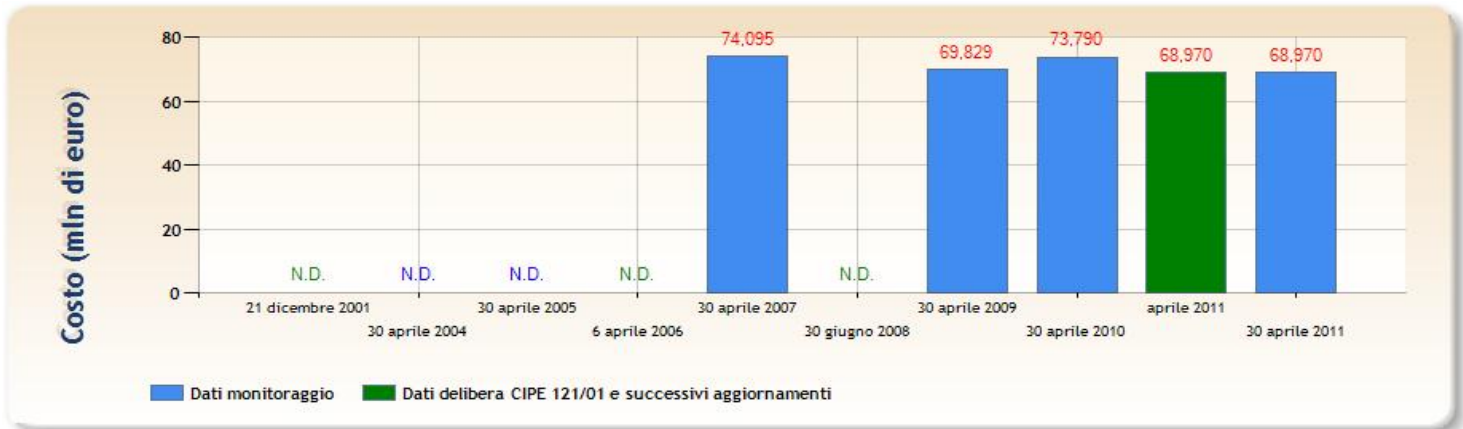

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Rete idrica

ENAS - Ente Acque della Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

60/2003
8/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

Il progetto per la realizzazione della interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro si compone di 2 interventi:

- 1° e 2° lotto - linea di adduzione principale e opere di derivazione del Rio Mogoro e adeguamento di prese irrigue esistenti

- 3° lotto – completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara

L'analisi di dettaglio è stata, pertanto, condotta anche in modo distinto per ciascuno di essi.

L'opera assolve la funzione di trasferimento di risorsa dal bacino del Tirso all'area del Flumendosa Campidano, caratterizzata da un gravoso deficit idrico. Il progetto delle opere è articolato in 3 lotti:

- gli interventi relativi ai lotti 1 e 2 sono stati realizzati e sono in esercizio. Le opere consentono di trasferire dal sistema Tirso al sistema Flumendosa, e a ritroso dal sistema Flumendosa al sistema Tirso, i deflussi non utilizzati dei bacini del Fluminimannu di Pabillonis, Mogoro e Tirso a valle della diga di Cantoniera.

- con il 3° lotto sono invece previste opere finalizzate a: migliorare l'efficienza funzionale e la flessibilità gestionale, anche dal punto di vista energetico, del trasferimento idrico bi-direzionale tra i sistemi Tirso e Flumendosa realizzato con le opere di 1° e 2° lotto; collegare al sistema Tirso i distretti irrigui già attrezzati di Zeppara, Pabillonis e San Gavino attualmente alimentati dal sistema Medio Flumendosa, liberando risorse del sistema Flumendosa che potranno essere destinate all'irrigazione della Marmilla meridionale; collegare alla linea di trasferimento Tirso-Flumendosa e, in senso inverso, in pressione dall'invaso di Sa Forada la presa per uso potabile della vasca di carico di Zeppara a servizio dell'impianto di potabilizzazione di Sant'Antonio di Santadi; collegare i distretti irrigui di Zeppara, San Gavino e Pabillonis e il potabilizzatore di Sant'Antonio di Santadi alla linea Sa Forada – Sardara, con la possibilità di disconnettere il canale nord-ovest dell'Ente autonomo Flumendosa, attualmente la sola linea di vettoriamento di tali utenze, che presenta un notevolissimo valore di perdita delle portate convogliate in relazione alla vetustà ed al precario stato di conservazione.

DATI STORICI

2000

L'opera è compresa nel documento di base per la definizione dell'accordo di programma quadro Stato-Regione sulle risorse idriche, sottoscritto il 26 febbraio.

2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

Il Piano d'Ambito viene approvato con ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 30 settembre.

L'Assessorato ai beni culturali della provincia di Cagliari autorizza la realizzazione dell'intervento con prescrizioni.

Il Piano stralcio di bacino è approvato con ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 31 dicembre.

Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR esprime parere favorevole sul progetto definitivo, indicando le prescrizioni per le opere di derivazione.

2003

La Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari conferma parere favorevole con prescrizioni.

L'Assessorato ai beni culturali della provincia di Oristano autorizza la realizzazione con prescrizioni.

L'ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 20 marzo approva il progetto definitivo e disciplina il rapporto di affidamento dell'intervento: "Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa - Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro 1° e 2° lotto". Il progetto prevede un costo

di 71,5 Meuro comprensivo di un premio di accelerazione di 4,4 Meuro per ridurre i tempi di realizzazione da 18 a 12 mesi.

Viene pubblicato il bando di gara dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla linea di adduzione principale. Viene indicato un costo di 44,7 Meuro.

I lavori vengono aggiudicati alla Opere Pubbliche Spa per 30,7 Meuro.

Il Commissario per l'emergenza idrica, con ordinanza n. 353, per accelerare i tempi di esecuzione, utilizza, a titolo di anticipazione, i fondi commissariali, con l'intento di reintegrare la dotazione con un finanziamento a valere sulle risorse di cui alla legge n. 166/2002. La stessa ordinanza dispone che la valutazione delle prescrizioni del progetto preliminare delle opere di derivazione di Rio Mogoro venga effettuata prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria aggiornata e propone un finanziamento di 67,1 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 60, prende atto che l'iter autorizzativo è stato espletato a cura dell'EAF in tempi precedenti alla presentazione del progetto al MIT e che le opere non sono state ritenute da assoggettare a VIA nazionale o regionale.

L'EAF invia copia del progetto definitivo alle amministrazioni interessate e ai gestori di opere interferenti e le amministrazioni interessate rilasciano regolare concessione edilizia (il Comune di Pabillonis rilascia il nulla osta e il Comune di Terralba parere favorevole al progetto).

Per l'iter autorizzativo del progetto preliminare delle opere complementari di derivazione, le autorizzazioni delle amministrazioni interessate, nonché quelle relative alle interferenze vengono acquisite insieme al progetto della linea di adduzione principale. Il progetto definitivo delle opere di derivazione del Rio Mogoro dovrà essere approvato previa la verifica di incidenza.

Il CIPE, per l'“Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa - Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso - Fluminimannu di Pabillonis - Mogoro 1° e 2° lotto”, per il biennio 2003-2004, assegna un contributo complessivo di 67,1 Meuro a valere sui fondi della legge n. 166/2002, di cui 50,6 per l'anno 2002 e 16,5 per il 2003.

2004

La Cassa depositi e prestiti, con nota del 29 settembre, comunica all'Ente autonomo Flumendosa la concessione, a valere sui limiti di impegno della legge n. 166/2002, di un importo max di 6,1 Meuro, del mutuo di euro 66,45 Meuro decorrente dall'1 gennaio 2005.

L'OPCM n. 3386 conferma il Presidente della Regione Sardegna Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006, con potere di provvedere, in regime ordinario, al completamento degli interventi del programma commissariale definito per il superamento dell'emergenza stessa.

2006

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il Commissario Governativo per l'emergenza idrica, con ordinanza n. 437, approva il programma di opere per il superamento dell'emergenza-fse di completamento n. 2, comprensivo, del “cofinanziamento del completamento dell'interconnessione Tirso-Flumendosa-3° lotto” per un importo di euro 5 Meuro.

Il Sub Commissario governativo per l'emergenza idrica approva il progetto definitivo dei “lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto”.

2007

Il MIT, con nota del 16 febbraio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria relativa alla “proposta di assegnazione di finanziamento al progetto definitivo” relativa alla “Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro. Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara- 3° lotto”.

Il CIPE con delibera n. 8, approva il progetto definitivo del 3° lotto e autorizza l'utilizzo della disponibilità finanziaria residua di euro 13,6 Meuro corrispondente alle economie realizzate sulle risorse assegnate con la delibera n. 60/2003, quale cofinanziamento del progetto definitivo del 3° lotto.

Ente Acque della Sardegna (E.N.A.S.) pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per i lavori di

completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara-3° lotto.

I lavori vengono aggiudicati alla Opere Pubbliche Spa ad un prezzo di 30,7 Meuro.

2008

E.N.A.S. aggiudica l'appalto integrato per i lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara - 3° lotto.

2009

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara), divisa in due interventi "1°e 2° lotto" e "3° lotto" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010". Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture all'IDEF 2012-2013 l'opera "Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara), divisa in due interventi "1°e 2° lotto" e "3° lotto" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risultano completati nel 2006 i lotti 1 e 2, mentre i lavori del lotto 3 risultano in corso. L'avanzamento lavori è del 22% e l'ultimazione è prevista entro novembre 2011.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte: Delibera CIPE 60/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte: Delibera CIPE 60/2003
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	74,095 Fonte: Delibera CIPE 8/2007
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	69,829 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	73,790 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	68,970 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	68,970 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	73,140 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	74,096
Fondi Legge Obiettivo	52,863 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Fondi Pubblici	2,650 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Fondi Legge Obiettivo	13,583 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Fondi Pubblici	5,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: il progetto preliminare approvato dal C.G.E.I. con ordinanza n. 314 del 28.08.2002 comprendeva i tre lotti dell'intervento: I lotto € 50.000.000,00; II lotto 11.430.000,00 e III lotto € 15.000.000,00 per complessivi 76,43 mln. Successivamente, sulla base di separati progetti definitivi, i lavori del I e II lotto sono stati (scheda 170 R.P. Sanna) sono stati realizzati e collaudati mentre quelli del III lotto sono in fase di attuazione (scheda 170 R.P. Loffredo)

Progettazione preliminare

CIPE: Sì
Importo lavori:
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio: 14/08/2002
Data fine: 28/08/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

DPR n. 357

del 8 Settembre 1997

Accordo di Programma Quadro Risorse idriche del 26 Febbraio 2000

DPCM del 13 Dicembre 2001

Piano stralcio di Bacino del 2002

Piano d'Ambito Regione Sardegna del Settembre 2002

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n. 321 del 30 Settembre 2002

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n. 334 del 31 Dicembre 2002

Bando di gara Ente Autonomo Flumendosa del Marzo 2003

Ordinanza Commissario per l'emergenza idrica n.347 del 20 Marzo 2003
Avviso di aggiudicazione del Maggio 2003
Ordinanza Commissario per l'emergenza idrica n.353 del 20 Giugno 2003
Delibera CIPE 60/2003
del 25 Luglio 2003
Delibera CIPE 8/2007
del 16 Marzo 2007
Bando di gara E.N.A.S. - Ente Acque della Sardegna del Dicembre 2007
Avviso di aggiudicazione E.N.A.S. - Ente Acque della Sardegna del Ottobre 2008

SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: il quadro economico del progetto definitivo comportava un costo complessivo di 71,7 mln euro di cui 50,34 mln di euro per lavori ed 21,36 mln per somme a disposizione

Progettazione definitiva

CIPE: Sì
Importo lavori: 50.345.888,20
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio: 01/10/2002
Data fine: 20/03/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ente Autonomo del Flumendosa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 305 giorni
Data bando: 27/03/2003
CIG/CUI: CUI 20200350500
Data aggiudicazione: 26/05/2003
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Opere Pubbliche Spa
Codice fiscale aggiudicatario: 00600890925
Data contratto: 24/06/2003

Quadro economico:

Importo a base gara:	43.708.367,38
Importo oneri per la sicurezza:	272.452,40
Importo complessivo a base di gara:	43.980.819,78
Importo aggiudicazione:	30.675.608,80
Somme a disposizione:	27.519.180,22
Totale:	58.194.789,02
% Ribasso di aggiudicazione:	32,06
% Rialzo di aggiudicazione:	0,00

Note: Nel luglio del 2004 veniva concesso all'Ente tramite Cassa D.P. mutuo di complessivi € 66.660.884,43, poi ridotto a € 66.445.638,01 con ammortamento a carico dello Stato, ad eccezione del premio di accelerazione che restava a carico delle risorse del C.G.E.I.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	35.068.463,58
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	01/12/2003
Data effettiva fine lavori:	13/01/2006
Data presunta fine lavori varianti:	14/01/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	22/03/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	22/03/2006

Note: il collaudo tecnico-amm.vo dei lavori principali (compresa 1a perizia) è stato completato in data 08.11.2005; il collaudo dei lavori della 2a perizia è stato completato in data 22.03.2006

Contenzioso:

Totale riserve definite:	7
Importo totale riserve definite:	7.095.090,61
Totale riserve da definire:	0

Note: E' stato stipulato in data 20.11.2006 con l'appaltatore un atto di accordo bonario per la definizione stragiudiziale della vertenza che ha comportato il riconoscimento ed il pagamento della somma di 1,6 mln euro a saldo e transazione di tutte le richieste

Sospensione lavori:

Numero totale:	0
Totale giorni sospensione:	0
Note:	Nessuna sospensione accordata

Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	381
Motivi:	
Altri motivi:	Tra le perizie si è incluso il premio accelerazione riconosciuto per € 2208097,56
Importo:	35.071.052,73
Importo oneri sicurezza:	

Somme a disposizione:
Totale: 35.071.052,73
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2004
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2005
Previsione al 30/04/2009	2005
Previsione al 30/04/2010	2006
Previsione al 30/04/2011	2006

SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 3° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: la data di ottobre 2001 si riferisce alla data di inizio della fase di progettazione preliminare; quella di dicembre 2006 si riferisce alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Sardegna (Commissario Emergenza Idrica Sardegna)

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 11.503.153,07
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio: 01/10/2001
Data fine: 15/12/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ENAS - Ente Acque della Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 240 giorni
Lavori: 360 giorni
Data bando: 26/11/2007
CIG/CUI: 0086978084

Data aggiudicazione: 21/07/2008
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Intercantieri Vittadello Spa
Codice fiscale aggiudicatario: 00222300287
Data contratto: 18/11/2008

Quadro economico:

Importo a base gara: 11.249.153,07
Importo oneri per la sicurezza: 254.000,00
Importo complessivo a base di gara: 11.503.153,07
Importo aggiudicazione: 8.023.452,55
Somme a disposizione: 7.079.920,40
Totale: 15.103.372,95
% Ribasso di aggiudicazione: 30,93
% Rialzo di aggiudicazione: 0,00
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 28/11/2011
Stato avanzamento importo: 1.805.429,86
Stato avanzamento percentuale: 22,00
Data effettiva inizio lavori: 07/06/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 28/11/2011
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 0
Motivi:
Altri motivi: Si tratta dell'incremento dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo che comporta migliorie
Importo: 7.878.277,86
Importo oneri sicurezza: 356.079,88
Somme a disposizione:

Totale: 8.234.357,74

Note: € 210.905,19 costituisce l'incremento dell'importo contrattuale come indicato nell'atto aggiuntivo del 18/03/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

2009

Previsione al 30/04/2009

2011

Previsione al 30/04/2010

2012


Previsione al 30/04/2011

2011

SCHEMI IDRICI

SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1)

SCHEDA N. 171

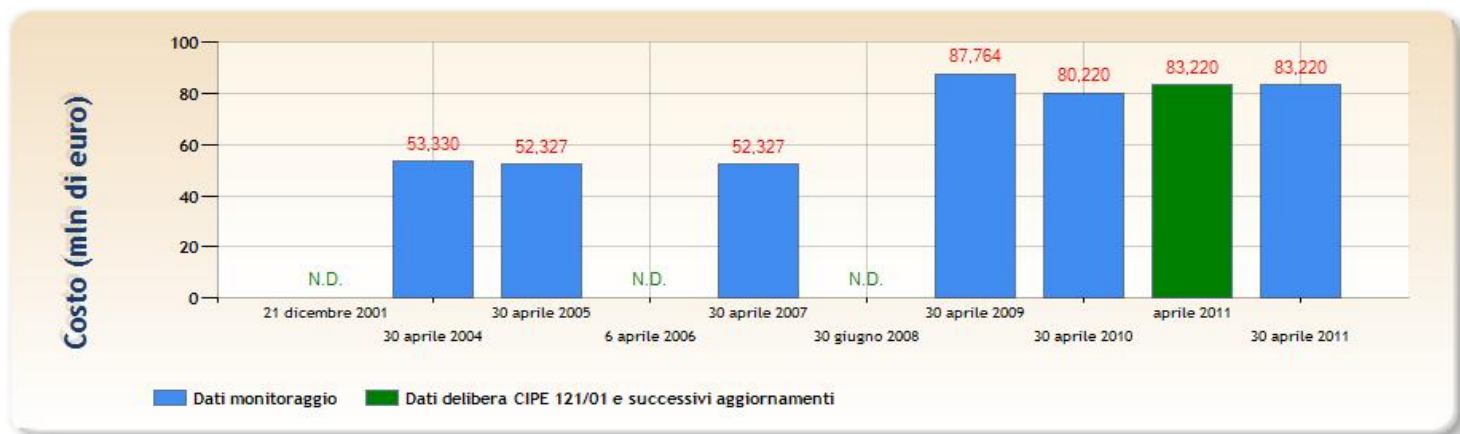

LOCALIZZAZIONE



Quadro finanziario



CUP:

C29J04000010008

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

STATO DI ATTUAZIONE

Progettazione esecutiva

DELIBERE CIPE

48/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

Oltre 2015

DESCRIZIONE

Il progetto "Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori", prevede il completamento della Diga di sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari e di valle collegate.

DATI STORICI

1996

Con l'approvazione del progetto esecutivo, in data 12 novembre, viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

2001

L'intervento è compreso nella delibera delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

L'intervento è inserito nell' APQ di settore del mese di febbraio stipulato tra il MIT e la Regione Sardegna.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro dell'11 ottobre siglata tra Governo e Regione Sardegna. Il soggetto aggiudicatore è individuato nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Un accordo preliminare relativo all'opera viene sottoscritto l'11 novembre dal Commissario governativo per l'emergenza idrica, dall'Associazione Temporanea d'Imprese Dragados Y Construccions P.O.-S.A., Fomento De Construcciones Y Contratas S.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

2003

I lavori di completamento vengono approvati dal Registro Italiano Dighe il 22 settembre.

2004

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale proroga fino al 4 febbraio 2006 la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR) dei LL.PP. della Sardegna determina il contenzioso relativo alle opere già in atto per un valore di 21,13 Meuro. Con lo stesso voto n. 894 il CTAR della Sardegna dei LL.PP approva, per un totale di 52,38 Meuro, il quadro economico per il completamento dell'opera che costituisce l'aggiornamento del progetto esecutivo originario, tenendo conto dell'impegno assunto dallo stesso Commissario Governativo nell'ambito della risoluzione del contenzioso.

La Regione esprime parere favorevole sulla conformità urbanistica, con nota del 1° marzo, rispetto ai manufatti, che riguardano il territorio dei Comuni di Villa S. Pietro e di Sarroch.

Il MIT, con nota del 12 marzo, trasmette al CIPE la relazione istruttoria proponendo l'assegnazione del finanziamento al progetto esecutivo dell'opera, che rappresenta un primo intervento rispetto a quello definito nella delibera n. 121 a carico delle risorse stanziare della legge n.166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 48, prende atto dell'istruttoria del MIT, da cui risulta che il costo delle opere da eseguire è di 52,4 Meuro, di cui 8 per l'IVA e che non è ipotizzabile un ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera. Assegna quindi al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale un contributo quindicennale annuo di 4,8 Meuro, di cui 2,7 a decorrere dal 2005 e 2,1 a decorrere dall'anno 2006. L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui alla legge n.166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualità. Il contributo è comprensivo di IVA solo se il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale non è soggetto a tale imposta e potrà essere erogato successivamente all'attestazione, da parte del Commissario Governativo per l'emergenza idrica al MIT, dell'avvenuta risoluzione del contenzioso.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'intervento compare nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS .

Il 2 ottobre 2009 viene sottoscritto l'Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Sardegna, in cui è riportato che l'intervento è finanziato con i fondi della legge obiettivo (52,3 Meuro) e con i fondi del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica (28 Meuro). Nel documento si fa inoltre presente che i lavori sono in fase di riappalto a seguito di rescissione del contratto e che è necessaria una parziale integrazione delle risorse per consentire la realizzazione della condotta pedemontana e per i danni alluvionali verificatisi (complessivamente 20 Meuro).

Con Delibera di Giunta N. 52/8 del 27.11.2009 la Regione Sardegna dispone l'assegnazione di 3,00 Meuro per l'intervento e richiede che la realizzazione venga trasferita dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale all'Ente Acque della Sardegna, secondo modalità e tempi definiti in apposito protocollo tra gli Enti, che tenga conto delle procedure in corso per l'utilizzazione del finanziamento attribuito dal CIPE.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu Is Canargius e bacini minori - lotto 1" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2013 l'opera "Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu Is Canargius e bacini minori - lotto 1" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta completata a marzo 2010 la progettazione esecutiva. La gara d'appalto non è stata ancora avviata a causa di alcuni adeguamenti agli elaborati progettuali che non necessitano di ulteriori approvazioni.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	53,330 Fonte: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
Previsione di costo al 30 aprile 2005	52,327 Fonte: Delibera CIPE 48/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	52,327 Fonte: Delibera CIPE 48/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	87,764 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	80,220 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	83,220 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	83,220 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	83,220 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	83,220
Fondi Legge Obiettivo	52,327 Fonte: Delibera CIPE 48/2004
Fondi Pubblici	27,893 Fonte: Delibera CIPE 48/2004

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 56.601.580,51

Servizio: Interno

Costo progettazione interno:

Data inizio: 01/10/2009

Data fine: 10/03/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura: Procedura aperta

Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

la gara d'appalto non è stata ancora avviata causa chiarimenti con RID in merito ad alcuni adeguamenti di elaborati progettuali che non necessitano di ulteriori approvazioni.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Delibera n. 2695 della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale del 12 Novembre 1996

Accordo di Programma Quadro Risorse idriche del Febbraio 2002

IGQ tra Governo e Regione Sardegna del 11 Ottobre 2002

Accordo preliminare del 11 Novembre 2002

Nota Registro Italiano Dighe n. 1463/UCPL del 22 Settembre 2003

Delibera n. 1068 Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale del 30 Gennaio 2004

Delibera CIPE 48/2004

del 29 Settembre 2004


Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Sardegna del 2 Ottobre 2009

Delibera Regione Autonoma della Sardegna n. 52/8 del 27 Novembre 2009

SCHEMI IDRICI

SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) – Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA – Secondo e terzo lotto

SCHEDA N. 172

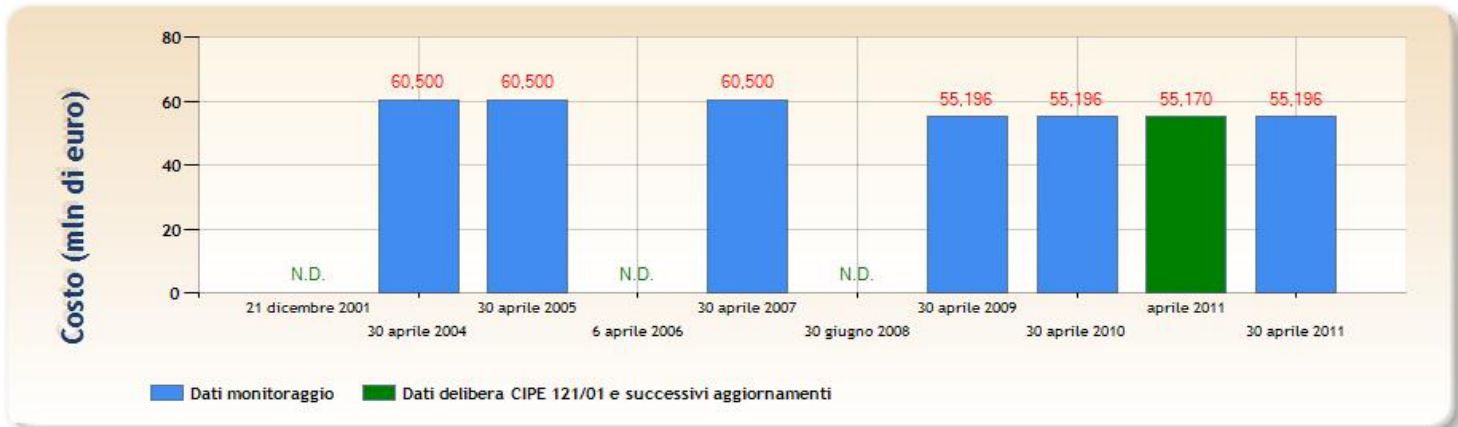

LOCALIZZAZIONE



CUP:

I29J04000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

ENAS - Ente Acque della Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

Progettazione definitiva

DELIBERE CIPE

58/2003

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Il Progetto Generale, suddiviso in tre lotti, prevede la realizzazione delle opere che dovranno assicurare l'approvvigionamento potabile di una vasta area della Sardegna sud-orientale, il Sarrabus, e consentire, attraverso il serbatoio di Villasimius, l'interconnessione con l'esistente schema n.46 del P.R.G.A. (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) che, oltre a Cagliari e ad altri centri urbani, alimenta gli insediamenti turistici nel comune di Quartu S. Elena, fino a Villasimius.

L'interconnessione dei due schemi realizzerà flessibilità nella gestione della risorsa e garantirà al centro di Villasimius la possibilità di essere alimentata da due fonti. Per quanto riguarda gli usi irrigui, l'area prevalentemente interessata è quella delle piane di San Vito, Muravera e Villaputzu.

Il progetto approvato dal CIPE riguarda i lavori facenti parte del 2 e 3 lotto.

DATI STORICI

1997

L'Ente Autonomo del Flumendosa chiede di convocare la CdS che si svolge il 29 settembre ed esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

L'Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di Cagliari del 3 novembre dichiara il proprio assenso all'attuazione del progetto.

L'Ente Autonomo del Flumendosa, con nota del 21 novembre, trasmette il progetto preliminare al Servizio del Genio Civile di Cagliari, proponendo domanda di concessione d'acqua.

Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR) approva, in forma preliminare, il progetto generale.

1999

Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali, rilasciano la VIA con prescrizioni relative alla mitigazione dell'impatto ambientale.

2000

Lo schema n. 39 in cui ricadono le Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto costa sud - orientale fino a Villasimius, è compreso nel documento di base per la definizione dell'APQ sulle risorse idriche Stato-Regione Sardegna sottoscritto il 26 febbraio.

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

Con DPCM del 13 dicembre viene prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003 e vengono confermati i poteri commissariali già attribuiti al Presidente della regione Sardegna.

2002

L'opera è compresa nel Piano di Ambito approvato dal Commissario per l'emergenza idrica.

La Regione Sardegna individua l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) quale soggetto attuatore.

Con ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 31 dicembre è approvato il Piano stralcio di bacino.

2003

L'ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 20 marzo approva l'aggiornamento del quadro finanziario dell'opera, per un costo globale di 60,5 Meuro distribuito negli anni 2004-2007 e comprensivo della somma di 0,35 Meuro per indagini finalizzate al progetto definitivo.

Con nota del 26 maggio, la Regione Sardegna comunica che non sono emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei Comuni interessati.

Il Commissario per l'emergenza idrica, con ordinanza del 20 giugno, approva l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare per un costo globale di 60,5 Meuro.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria aggiornata.

Il CIPE, con delibera n. 58, prende atto che le interferenze coinvolgono: l'ANAS per la S.S.125 (Orientale Sarda) e la Provincia di Cagliari per le S.P. nn.18,19,20 e 97 e che è quindi necessario che l'EAF, in qualità di soggetto aggiudicatore, rimetta il progetto preliminare anche alla Provincia di Cagliari per la risoluzione delle interferenze. Secondo le prescrizioni del MIT, il progetto definitivo dovrà accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento mediante tariffa. Il CIPE delibera quindi di finanziare le sole indagini in sito per 0,35 Meuro, a valere sui fondi ex art.13 della legge n. 166/02 previsti per l'anno 2002, rinviando all'approvazione del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera. L'UTFP viene incaricata di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l'entità dell'importo da recuperare mediante tariffa.

2005

Il soggetto aggiudicatore, con nota del 10 novembre, trasmette al MIT il progetto definitivo e fa pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

2006

In data 11 gennaio il MIT convoca la CdS nel corso della quale vengono acquisiti i pareri di Amministrazioni ed Enti interessati.

In ordine ad alcune osservazioni, pervenute a seguito della pubblicazione sui quotidiani, il RUP fornisce le proprie controdeduzioni.

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 10 maggio, chiarisce che il progetto è da sottoporre a VIA regionale e che l'avviso di avvio di tale procedura è stato pubblicato su due quotidiani nel dicembre 2006.

Il rapporto "Infrastrutture Prioritarie", redatto dal MIT riporta che il progetto definitivo è in fase istruttoria presso il MIT e si è in attesa del perfezionamento della procedura VIA.

L'avviso di avvio della procedura VIA regionale viene pubblicato su due quotidiani.

Il soggetto aggiudicatore, individuato con la delibera n. 58/2003 nell'EAF, si trasforma, a decorrere dal 29 dicembre, nell'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS).

2007

A decorrere dal 31 maggio, l'ERIS diventa Ente acque della Sardegna, mantenendo invariata la natura giuridica di ente pubblico strumentale della Regione e risulta il nuovo soggetto aggiudicatore.

La Regione Sardegna, con nota del 18 settembre, comunica la conclusione positiva del giudizio di compatibilità ambientale e formalizza il parere favorevole con prescrizioni.

Il MIT, con nota del 20 settembre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria del progetto definitivo successivamente aggiornata con nota del 24 settembre.

L'UTFP, con nota del 21 settembre, formula il parere in ordine al piano economico-finanziario dell'opera .

Il MIT trasmette la documentazione integrativa e le prescrizioni deliberate dalla Giunta regionale nella seduta del 25 settembre, nonché la dichiarazione del RUP sulla copertura del costo delle prescrizioni.

Il CIPE, con delibera n. 93, approva, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo con un costo di 60,5 Meuro, di cui 46 per lavori e 14,5 per somme a disposizione. Tra le somme a disposizione, è inclusa l'IVA (5,3 Meuro) che il soggetto aggiudicatore può recuperare. Quindi il costo dell'opera, al netto dell'IVA, ammonta a 55,2 Meuro, di cui 350.000 già coperti con l'assegnazione disposta con la delibera n. 58/2003 per indagini. Il fabbisogno residuo è pari a 54,8 Meuro. L'UTFP esclude la sussistenza delle condizioni di parziale autofinanziamento che permettano il completamento dell'opera. Viene perciò concesso, per 15 anni, un contributo annuo di euro 5,2 Meuro a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 con decorrenza 2009.

2009

L'opera compare nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

L'intervento è riportato nell'Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione sottoscritto il 2 ottobre. Nel documento si fa presente che "il progetto, approvato dal CIPE nel 2007- finanziato a marzo 2009 - del costo di 54,85 Meuro necessita di adeguamento dei prezzi d'appalto. Il soggetto appaltatore provvederà quindi a redigere uno stralcio funzionale nei limiti del finanziamento disponibile ed a completare l'intervento successivamente con le somme derivanti dal ribasso d'asta. Il 1° lotto dello stesso schema ha previsto , in prima fase, l'alimentazione provvisoria con presa in sub-alveo

sul Flumendosa a S. Vito. Per garantire la sicurezza dell'alimentazione risulta necessario il collegamento dell'impianto di potabilizzazione di S.Vito con la traversa a monte (2° stralcio). Per realizzare tale condotta è necessario un finanziamento di circa 25 Meuro".

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Schema n° 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto - Picocca" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2013 l'opera "Schema n° 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto - Picocca" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Il 15 aprile ENAS pubblica il bando di gara per l'affidamento del servizio relativo alla erogazione di un mutuo con onere di ammortamento per capitale ed interessi posto a carico del bilancio dello Stato di durata quindicennale da destinare al finanziamento dell'intervento denominato "Schema idrico Sardegna sud-orientale (sistema basso Flumendosa – Picocca): opere di approvvigionamento idropotabile –schema n. 39 P.R.G.A. – 2° e 3° lotto" . Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta in corso la procedura di affidamento del servizio per la concessione di mutuo di durata quindicennale da destinare al finanziamento dell'opera. Le offerte dei partecipanti saranno aperte il giorno 8 giugno e dopo l'affidamento del servizio verrà bandita la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	60,500 Fonte: Delibera CIPE 58/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005	60,500 Fonte: Delibera CIPE 58/2003
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	60,500 Fonte: Delibera CIPE 58/2003
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	55,196 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	55,196 Fonte: Delibera CIPE 10/2009; Delibera CIPE 93/2007
Costo ad aprile 2011	55,170 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	55,196 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	55,200 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	55,196
Fondi Legge Obiettivo	55,196 Fonte: Delibera CIPE 93/2007; Atto Aggiuntivo alla IGQ del 2002, Novembre 2009

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: E' in corso la procedura di affidamento del servizio per la concessione di mutuo di durata quindicennale da destinare al finanziamento dell'opera. La procedura è stata autorizzata con determina ENAS n. 194 del 01.04.2011. Le offerte dei partecipanti saranno aperte il giorno 8 giugno e dopo l'affidamento del servizio verrà bandita la gara d'appalto per i lavori.

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 46.039.302,67
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio: 10/11/2005
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:


NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo di Programma Quadro Risorse idriche del 26 Febbraio 2000
DPCM del 13 Dicembre 2001
Piano stralcio di Bacino del 2002
Piano d'Ambito Regione Sardegna del Settembre 2002
Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n.321 del 30 Settembre 2002
Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n. 334 del 31 Dicembre 2002
Ordinanza Commissario Emergenza Idrica n.353 del 20 Giugno 2003
Delibera CIPE 58/2003
del 25 Luglio 2003
Delibera CIPE 93/2007
del 28 Settembre 2007
Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Sardegna del 2 Ottobre 2009

SCHEMI IDRICI

SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla

SCHEDA N. 173

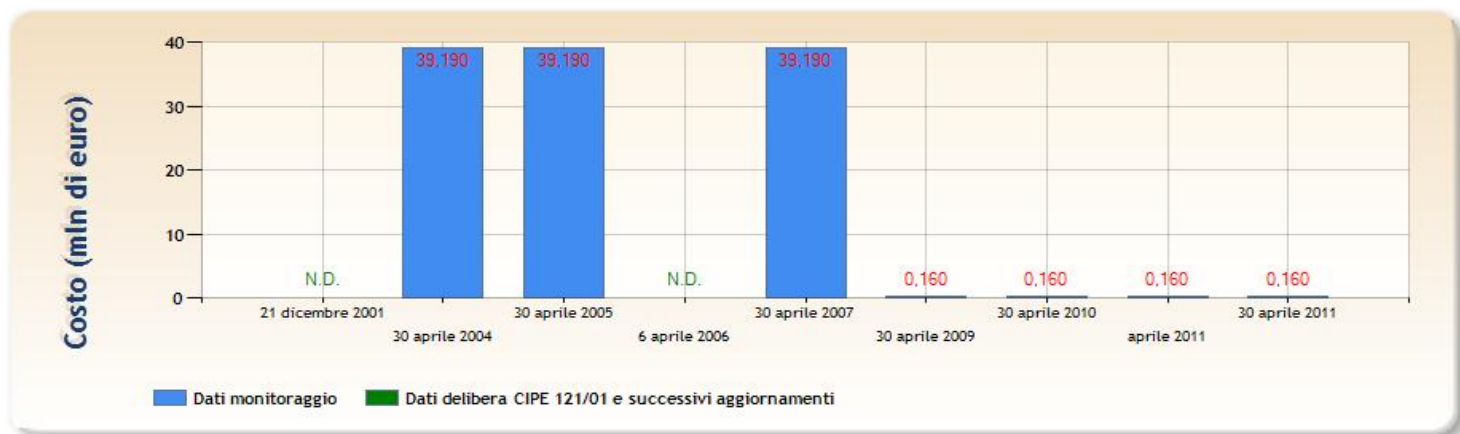

LOCALIZZAZIONE



CUP:

E25F0300001000

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Consorzio Bonifica dell'Oristanese

STATO DI ATTUAZIONE

Progettazione preliminare

DELIBERE CIPE

59/2003
88/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

Procedimento sospeso per la contrarietà delle popolazioni interessate e per conseguenti determinazione della Regione Sardegna.

DESCRIZIONE

L'opera fa parte dello schema funzionale del Tirso ed è finalizzata all'utilizzazione irrigua delle acque del suo più importante affluente, il Flumineddu. Il progetto non verrà realizzato poiché ha incontrato la netta e generale opposizione di tutti gli Enti locali interessati.

DATI STORICI

1985

L'opera di presa lungo il Flumineddu a Bau' e Linu, parte del progetto, è oggetto della concessione assentita con decreto 7 giugno dell'Assessorato lavori pubblici della Regione Sardegna all'allora Consorzio di Bonifica di 2° gr. per l'utilizzazione delle acque del Tirso (ora CBO).

1999

La Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano, con nota del 26 gennaio, esprime parere favorevole all'opera.

2000

Nell'APQ sulle risorse idriche Stato-Regione Sardegna, sottoscritto il 26 febbraio, il progetto esecutivo delle sole opere relative alla traversa Bau' e Linu è inserito nel programma di finanziamento degli interventi da realizzare entro il 2010.

Il 26 giugno viene rilasciata "licenza in materia di polizia stradale" dall'Amministrazione provinciale di Oristano, a seguito dell'interferenza sopravvenuta relativa a due attraversamenti delle strade provinciali n. 33 e n.36.

Il CTAR, con voto del 2 agosto, esprime parere favorevole sul progetto preliminare denominato "Schema Flumineddu 1997" nel quale è compreso il progetto.

2001

La Regione Sardegna esprime parere positivo con prescrizioni, con nota del 21 giugno. Anche la Soprintendenza beni architettonici di Cagliari e Oristano si esprime positivamente il 19 giugno.

Viene acquisito anche il parere favorevole del Ministero per i beni culturali del 6 luglio.

Il Ministero dell'Ambiente emana il decreto sulla VIA il 9 novembre di compatibilità con prescrizioni.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare"

Con DPCN del 13 dicembre viene prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003 e vengono confermati i poteri commissariali già attribuiti al Presidente della regione Sardegna.

2002

Con Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 30 settembre viene approvato il Piano d'Ambito, nel quale è compresa l'opera.

La Regione Sardegna, con nota del 17 ottobre individua Consorzio Bonifica dell'Oristanese (CBO) quale soggetto attuatore.

Viene approvato il Piano Stralcio di Bacino con ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica del 31 dicembre.

2003

Con nota del 26 maggio, l'Assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della Sardegna comunica che non sono emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei Comuni interessati.

Il Commissario per l'emergenza idrica, con ordinanza del 20 giugno, approva l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare relativo all'intervento per un costo globale di 39,2 Meuro distribuito negli anni 2003-2007 e comprensivo della somma di 0,16 Meuro da destinare a indagini per il progetto definitivo.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria aggiornata.

Il CIPE, con delibera n. 59, prende atto che gli Enti da coinvolgere nella CdS sono: Provincia e Genio Civile di Oristano e i seguenti comuni – Allai, Asuni, Buschi, Ruina e Samugheo e che è necessario che il CBO, in qualità di soggetto aggiudicatore, rimetta il progetto preliminare anche alla Provincia di Cagliari per la risoluzione delle interferenze. E' previsto l'appalto integrato. Secondo le prescrizioni del MIT, il progetto definitivo dovrà accertare la possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento mediante tariffa. Il CIPE assegna quindi all'intervento il finanziamento, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate al progetto definitivo, di 0,16 Meuro a valere sui fondi della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002. Tale importo è compreso nell'importo totale dell'intervento di 39,2 Meuro che sarà finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo. All'UTFP viene demandato il compito di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l'entità dell'importo da recuperare tramite tariffa.

2004

Il CIPE, con delibera n. 88, di modifica della delibera n. 59/2003, prevede che il finanziamento assegnato possa essere utilizzato anche per attività progettuali finalizzate allo sviluppo del progetto definitivo.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Nel rapporto "Infrastrutture Prioritarie", redatto dal MIT, l'intervento viene rinominato "Interconnessione Tirso-Flumineddu: Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla" e si sottolinea che la nuova denominazione dipende dal fatto che il progetto, già presentato, ha incontrato la netta e generale opposizione di tutti gli enti locali interessati sentiti dalla Regione nell'ambito della procedura prevista dal parere sulla localizzazione. Il documento conferma il costo e il quadro finanziario (0,16 Meuro assegnati dal CIPE per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo) e riporta che è in corso un riassetto funzionale delle opere in progetto che, tenendo conto dell'obiettivo primario (utilizzo delle risorse del Flumineddu per l'irrigazione della Marmilla tale da garantire la conservazione di tutte quelle azioni di manutenzione del territorio che l'attività agricola ha garantito per secoli) consenta di accelerare il trasferimento delle risorse idriche sfruttando le opere già realizzate con l'intervento n. 1 "Interconnessione Tirso-Flumendosa".

2008

Il Rapporto "Infrastrutture Prioritarie" del MIT conferma che è in atto una revisione del progetto complessivo.

2009

L'opera è riportata nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

L'intervento è compreso nell'Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Sardegna sottoscritto il 2 ottobre. Nel documento si riferisce che la Regione, in relazione alla possibilità di utilizzare in modo integrato le risorse dei bacini del Tirso e del Flumineddu con il nuovo collegamento già completato Tirso-Flumendosa, ha programmato l'utilizzo del finanziamento di 36 Meuro (sui fondi FAS -CIPE 3) per il progetto "Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu-Tirso-Flumendosa" che prevede l'adduzione dallo schema integrato, nonché l'attrezzamento irriguo nella bassa Marmilla di circa 1700 ha, realizzando in tal modo il 1° Lotto del nuovo schema integrato (intervento in fase di appalto). La Regione ha quindi programmato e finanziato le attività di progettazione per la realizzazione delle restanti opere dello schema che ricomprende sia la "Diga S'Allusia e opere connesse" (104 Meuro) che il "Collegamento Flumineddu Tirso" (39 Meuro, di cui 0,16 Meuro già finanziati dal CIPE), per un importo complessivo di 143 Meuro. Complessivamente a fronte del costo totale dello "Schema Idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla", pari a 179 Meuro è finanziato ed è in corso d'appalto il 1° lotto (36 Meuro) mentre si chiede il finanziamento sulla Legge Obiettivo dei restanti 2° e 3° lotto (per complessivi 143 Meuro)

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Opere di Collegamento Flumineddu – Tirso lavori di indagine e sviluppo progetto definitivo" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2013 l'opera "Opere di Collegamento Flumineddu - Tirso lavori di indagine e sviluppo progetto definitivo" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" accompagnata dalla nota del MIT/STM "non strategico x il Sogg. Agg."

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che "l'esecuzione è stata sospesa per la contrarietà delle popolazioni interessate e per conseguenti determinazione della Regione Sardegna".

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	39,190 Fonte: Delibera CIPE 59/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005	39,190 Fonte: Delibera CIPE 59/2003
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	39,190 Fonte: Delibera CIPE 59/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2009	0,160 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	0,160 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	0,160 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	0,160 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	0,160 Fonte:

Disponibilità al 30 aprile 2011:	0,160
Fondi Legge Obiettivo	0,160 Fonte: Delibera CIPE 59/2003

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva

Conferenza di servizi:

Note: SOSPESA L'ESECUZIONE PER LA CONTRARIETA' DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE E PER CONSEGUENTI DETERMINAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA - E' STATO PAGATO SOLO UN ACCONTO SULLA PROGETTAZIONE (Rif. Scheda n° 173)

Progettazione definitiva

CIPE: Si

Importo lavori: 39.190.000,00

Servizio: Esterno

Importo a base gara: 160.000,00
Importo di aggiudicazione: 160.000,00
Nome aggiudicatario: Ing. Roberto Binaghi
Codice fiscale aggiudicatario: BNGRRT28T21B354T
Data inizio: 07/03/2003
Data fine: 05/12/3003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto n.701 dell'Assessorato lavori pubblici della Regione Sardegna
del 7 Giugno 1985

DEC/VIA n.3737 del 18 Maggio 1999

Accordo di Programma Quadro Risorse idriche del 26 Febbraio 2000

Licenza in materia di polizia stradale n.477/99-Amministrazione provinciale di Oristano del 26 Giugno 2000

DPCM del 13 Dicembre 2001

Piano stralcio di Bacino del 2002


Piano d'Ambito Regione Sardegna del Agosto 2002

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n.321 del 30 Settembre 2002

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica n.334 del 31 Dicembre 2002

PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO***
Giacimenti di idrocarburi - Innesdimento produttivo di Tempa Rossa

SCHEDA N. 174

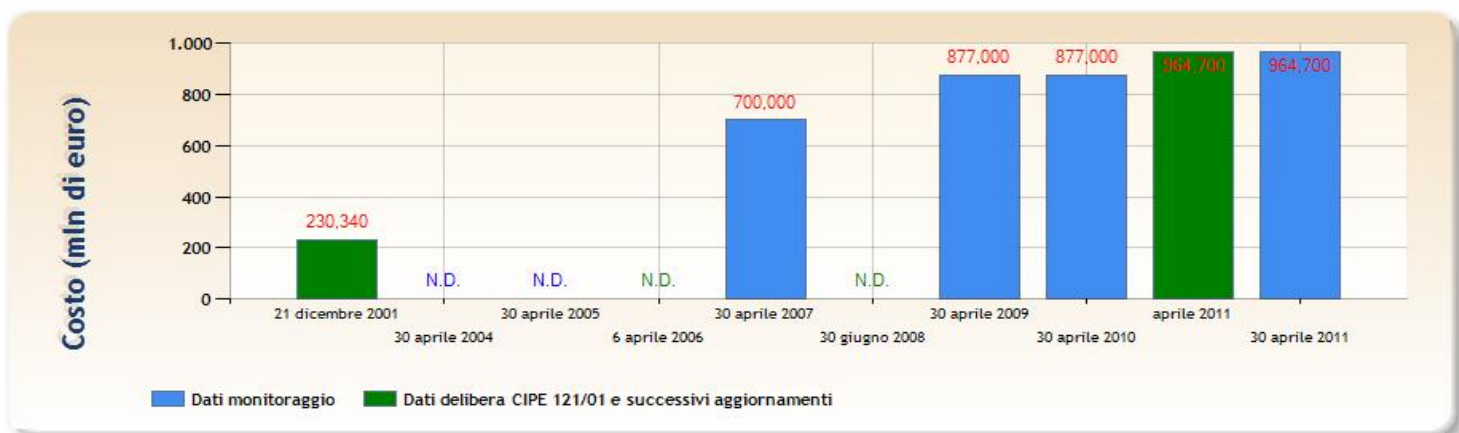

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Comparto energetico

Total Italia Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato

DELIBERE CIPE

139/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Il progetto "Tempa Rossa" si riferisce allo sviluppo del giacimento di idrocarburi all'interno della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Gorgoglione", localizzato nella Regione Basilicata tra le Province di Potenza e di Matera. Nello specifico il progetto di sviluppo prevede l'attivazione completa ed integrata di 5 pozzi già perforati e sottoposti a test di lunga durata e la perforazione di un altro pozzo (da completare in caso di esito positivo del sondaggio), nonché la realizzazione del "Centro di trattamento oli", di due serbatoi di stoccaggio del greggio e di un deposito, da ubicare nell'area industriale del comune di Guardia Perticara (Pz), per lo stoccaggio del GPL e delle relative strade di accesso e di servizio.

DATI STORICI

2001

La Conferenza Stato-Regioni del 24 aprile stabilisce le procedure e le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

L'opera è inclusa nella delibera n. 121 tra le infrastrutture strategiche nel settore del gas, e prevede un finanziamento a carico dei soggetti privati.

2002

L'intervento non è incluso nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione sottoscritta il 20 dicembre.

2003

La Total Italia Spa, soggetto aggiudicatore, con nota del 10 marzo, invia il progetto preliminare al MIT e ai Ministeri dell'industria e dell'ambiente che si pronuncia sulla competenza della Regione in relazione agli aspetti ambientali.

Il Ministero dell'industria, che già aveva approvato il programma dei lavori contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione idrocarburi "Gorgoglione", con nota 9 giugno, esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sul progetto preliminare.

2004

Il soggetto aggiudicatore trasmette documentazione integrativa alla Regione con nota del 26 aprile.

2005

Ulteriore documentazione viene trasmessa dal soggetto aggiudicatore con nota 7 dicembre.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

La Regione Basilicata, con delibera di Giunta del 3 maggio, esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, e parere favorevole sulla valutazione di incidenza, rilasciando inoltre l'autorizzazione paesaggistica ed escludendo dal programma dei lavori il pozzo "Tempa d'Emma Nord 1" e le relative opere, inizialmente inserite in progetto.

2007

A richiesta del Ministero dello sviluppo economico, la Regione Basilicata, con delibera del 5 marzo, esprime l'intesa, ai fini dell'adeguamento del "programma dei lavori di ricerca e di sviluppo" nell'ambito della concessione "Gorgoglione", adeguamento proposto dal soggetto aggiudicatore in relazione alle limitazioni poste dalla Regione con la delibera n. 622/2006 e alla necessità di prolungare i tempi di realizzazione delle perforazioni esplorative e del completamento dei lavori di sviluppo.

Il 31 marzo Total Italia Spa pubblica, sulla GUCE, il bando di gara a procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di preparazione del sito per un importo complessivo a base di gara di 35,4 Meuro di cui 34,3 lavori e 1,1 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Ministero per lo sviluppo economico, con decreto del 31 luglio, approva l'adeguamento del "programma dei lavori di ricerca e di sviluppo" nell'ambito della concessione "Gorgoglione".

Il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole, con prescrizioni, con nota del 20 novembre.

Il Presidente della Regione Basilicata, con nota del 5 dicembre, esprime parere favorevole in relazione alla localizzazione delle opere nei limiti esposti nelle precedenti delibere di Giunta.

Il MIT, con nota del 6 dicembre, integrata con nota del 18 dicembre, trasmette la relazione istruttoria del progetto preliminare sull'intervento "Attivazione di giacimenti di idrocarburi "Tempa Rossa".

Il CIPE, con delibera del 21 dicembre, approva il progetto preliminare con le prescrizioni del MIT e, in particolare, con esclusione della realizzazione del pozzo di esplorazione "Tempa d'Emma Nord 1". Il costo dell'intervento è di 877 Meuro, di cui 119 per perforazione pozzi, 53 per lavori civili, 48 per flowline ed oleodotti e 657 per la realizzazione del centro oli e del deposito GPL. Il costo sarà coperto interamente dal soggetto aggiudicatore con mezzi autonomamente reperiti, trattandosi di una infrastruttura privata, anche se strategica per l'approvvigionamento energetico nazionale. L'efficacia dell'approvazione del progetto è condizionata alla stipula di un atto integrativo all'IGQ stipulata tra il Governo e Regione Basilicata. Per la realizzazione dell'opera sono previsti circa 50 mesi, cui vanno aggiunti i tempi per l'espletamento degli iter autorizzativi del progetto definitivo, alla redazione del progetto esecutivo ed all'espletamento della gara.

2008

Il 26 giugno l'appalto viene aggiudicato all'impresa Ferrara Snc di Poliporo (Mt), in qualità di capofila di una associazione temporanea di imprese con Bulfaro Costruzioni Srl, Leone Srl, Eredi Bernardo Snc, Donnoli Costruzioni Srl, Edil Carone Snc, Coema Costruzioni Snc, Eco costruzioni Aliano Srl per un prezzo finale di 24,9 Meuro, su un importo stimato iniziale di 35,4 Meuro.

2009

I lavori di preparazione del sito, iniziati nel 2008, vengono interrotti nel mese di febbraio dopo la decisione della Procura di Potenza di sospendere la concessione alla Total per presunti episodi di corruzione e turbativa emersi durante l'inchiesta su Tempa Rossa. La compagnia annuncia ricorso al Tribunale del Riesame.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 del 6 marzo di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

In data 7 aprile il Tribunale del Riesame di Potenza, accogliendo l'appello presentato dalla Società, revoca il provvedimento di sospensione sostituendolo con la nomina di un Commissario. Tale nomina consente alla società di riprendere le attività e di disporre la risoluzione del contratto sui lavori di preparazione del sito.

2010

Dal 1 gennaio, a seguito del procedimento di scissione parziale di Total Italia Spa, viene costituita una nuova società la cui ragione sociale è Total E&P Italia Spa, alla quale vengono assegnate le attività di esplorazione e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi precedentemente condotte da parte di Total Italia Spa. Di conseguenza tutte le attività relative all'opera saranno gestite da Total E&P Italia Spa.

Il 15 febbraio viene revocata la nomina del Commissario.

Total E&P Italia Spa, in data 29 marzo, invia il alla GUCE il bando di gara per l'assegnazione a "Contraente Generale" dell'appalto per la "Progettazione, Approvvigionamento, Fornitura, Costruzione e Messa in Servizio del Centro Olio, del Centro GPL, dei Siti di Perforazione e dei collegamenti in Corleto del Progetto Tempa Rossa". Nello specifico le attività del contraente generale riguardano: progettazione di dettaglio, emissione della documentazione per la costruzione, messa in funzione e manutenzione dell'impianto, ottenimento dei permessi, fornitura di tutte le attrezzature/materiali, costruzione e direzione della costruzione, controllo qualità, certificazione CE dell'impianto, direzione lavori, appalto e acquisto, programmazione, controllo costi, contabilità, management del progetto, precollauda, messa in funzione e assistenza all'avvio. I siti principali dei lavori sono Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione in Basilicata. Il valore stimato dell'appalto è tra i 700 Meuro e 1.100 Meuro, mentre il valore minimo per oneri di sicurezza associati con lo scopo di lavoro della costruzione e non soggetto a ribasso di gara è stimato in 17 Meuro. Nel bando si fa riferimento anche ad un valore associato alle misure antimafia non soggetto a ribasso di gara che verrà indicato nella documentazione dell'invito di gara. La durata dell'appalto è fissata per il periodo dal 15/05/2011 al 01/11/2014.

Dalla relazione di bilancio 2009 di Total Italia Spa, in merito alla concessione Gorgoglione su cui insiste il giacimento "Tempa Rossa", si rileva che nel corso dell'anno 2009 sono state svolte attività di progettazioni, investimenti in impianti e infrastrutture e lavori di carattere tecnico, geologico e geofisico preparatori alla futura messa in produzione del giacimento.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa" è riportata

nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”. Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

La TOTAL E&P Spa pubblica il 3 novembre l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ed approvazione del progetto definitivo con VIA del progetto Tempa Rossa nell'ambito della concessione Gorgoglione (ex concessioni Gorgoglione, Corleto Perticara e Tempa d'Emma).

Sulla GUCE del 5 novembre TOTAL E&P Spa pubblica il bando per l'affidamento dei lavori di preparazione del sito “Tempa Rossa”, consistente in attività di indagine e saggi archeologici complementari a quelli già realizzati, in scavi, sbancamenti e rilevati per realizzare le piattaforme su cui verrà costruito l'impianto industriale (escluso dai lavori), predisposizione delle strade interne, opere di presidio idraulico e sistemazione di corsi d'acqua, interventi di stabilizzazione di versanti instabili e/o potenzialmente instabili, realizzazione della strada di accesso al Centro oli di Tempa Rossa e della strada circolare, preparazione del sito di stoccaggio del GPL, preparazione dei siti per lo stoccaggio del materiale di risulta. L'importo complessivo è stimato in 69,4 Meuro.

Sulla stessa GUCE viene pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione, approvvigionamento, fornitura e costruzione di una rete di condotte interrato a servizio del costruendo Centro Olio nei comuni di Corleto Perticara e Guardia Perticara. L'importo viene stimato tra 25 e 35 Meuro.

2011

Il 25 gennaio viene istituito presso il MSE un Tavolo tecnico istituzionale Stato – Regione Basilicata, con l'obiettivo di “assicurare un'effettiva ricaduta occupazionale sul territorio e il rendimento sostenibile agli investimenti delle compagnie petrolifere, garantendo nel contempo la massima prevenzione e tutela dell'ambiente del territorio e della salute pubblica”.

Il 2 febbraio il TAR della Basilicata sospende le procedure di gara per i lavori occorrenti per la realizzazione del Centro Olio della Total di Corleto Perticara la cui scadenza è fissata per il 10 febbraio. Il Tar accoglie il ricorso dell'ATI Ferrara. Le procedure di aggiudicazione vengono sospese in attesa della decisione sulla competenza in materia amministrativa. La società TOTAL E&P Spa presenta ricorso contro la decisione del Tar Basilicata.

In data 15 aprile viene pubblicato un avviso esplorativo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento area pozzo Tempa Rossa 2. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 29 aprile.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera “Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa” è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”.

Il 29 aprile viene sottoscritto un memorandum di intesa tra Stato e Regione Basilicata “per l'accelerazione dello sviluppo regionale, la crescita occupazionale, l'incremento di infrastrutture e la realizzazione di interventi di ricerca e innovazione in relazione alla ricerca e coltivazioni di fonti fossili in Basilicata”.

Il 2 maggio TOTAL E&P Spa pubblica sulla GU il bando per l'aggiudicazione di “Accordi quadro per studi di ingegneria e altri servizi per il progetto Tempa Rossa”.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	230,340 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	700,000 Fonte: Total Italia Spa
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	877,000 Fonte: Delibera CIPE 139/2007

Previsione di costo al 30 aprile 2010	877,000 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	964,700 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	964,700 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	964,700 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	964,700
Total Italia Spa	964,700 Fonte: DEF 2012-2014

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Bando di gara di Total Italia Spa - Lavori di preparazione del sito (Contratto rescisso) del 31 Marzo 2007

Delibera CIPE 139/2007 del 21 Dicembre 2007

Avviso di aggiudicazione del 4 Settembre 2008

Bando di gara TOTAL E&P Italia Spa - Sviluppo del giacimento di idrocarburi

Centro Olio, Centro GPL, siti di perforazione e collegamenti

del Aprile 2010

Bilancio 2009 Total Italia Spa del Aprile 2010

Bando di gara TOTAL E&P Italia Spa - Lavori di preparazione del sito (nuovo appalto a seguito di contratto rescisso) del 5 Novembre 2010

Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Centro olio, centro GPL siti di perforazioni e collegamenti

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009 2012
Previsione al 30/04/2010 2014
Previsione al 30/04/2011 2014

Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Lavori di preparazione del sito

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004


Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2010

PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Linea a 380 Kv "S.Fiorano (I) – Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia - Svizzera

SCHEDA N. 175

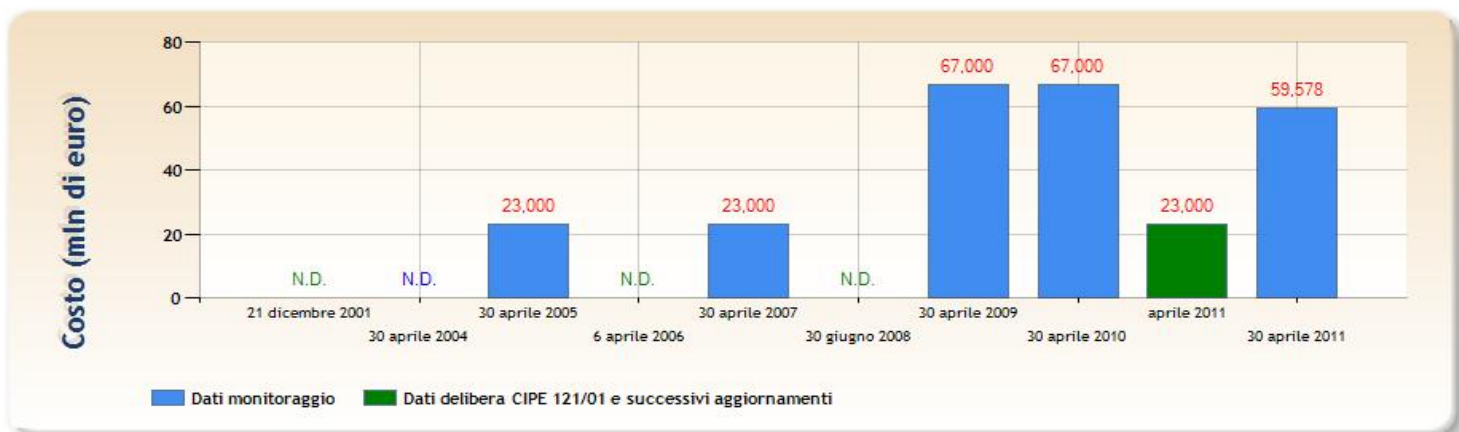

LOCALIZZAZIONE



CUP:

D37B04000020004

TIPOLOGIA OPERA:

Comparto energetico

SOGGETTO TITOLARE:

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

9/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

2005

DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna che dalla stazione elettrica di S.Fiorano, sita nel Comune di Sellero, raggiunge, dopo un percorso di 42,3 km ca., il confine nei pressi dell'area doganale di Poschiavino in Comune di Tirano, ove si collegherà all'elettrodotto svizzero che dopo 15 km circa termina nella stazione elettrica di Robbia.

L'opera permetterà di realizzare i seguenti collegamenti elettrici: linea a 380 kV Gorlago-Robbia, attualmente già autorizzata e realizzata nel tratto da Gorlago a S.Fiorano e da realizzare da S.Fiorano a Robbia ed, in affiancamento sulla stessa palificata, linea a 380 kV S.Fiorano-Robbia.

Il percorso si sviluppa interamente nella Regione Lombardia, interessando, in Provincia di Brescia, i Comuni di Sellero, Cedegolo, Cevo, Berzo Demo, Sonico, Edolo, Malonno, Corteno Golgi, nonché la Comunità Montana della Valcamonica, il Parco Regionale dell'Adamello ed, in Provincia di Sondrio, i Comuni di Tovo di S.Agata, Lovero, Sernio, Tirano, Villa di Tirano, nonché la Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Le caratteristiche elettriche dell'elettrodotto sono le seguenti: frequenza nominale 50 Hz; tensione nominale 380000 V (380 kV); intensità di corrente nominale 1500 A (per fase); potenza nominale 1000 MVA (per terna). L'intervento costituisce un lotto unico e rientra negli interventi di potenziamento dell'interconnessione con l'estero della rete elettrica di trasmissione nazionale.

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra i collegamenti per potenziare l'interconnessione con i Paesi confinanti.

2003

L'intervento è compreso nel "Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale" 2003-2005 deliberato dal Consiglio di amministrazione del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (GNTR) il 29 gennaio ed inviato al Ministero delle attività produttive il 30 gennaio.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra MIT e Regione Lombardia del 28 aprile.

L'Accordo di Programma sottoscritto congiuntamente il 24 giugno dal Ministero delle attività produttive, Regione Lombardia, GRTN, Province di Sondrio e Brescia, Comunità montane della Valcamonica e Valtellina di Tirano, Parco dell'Adamello e Comuni interessati, riguarda il tracciato dell'elettrodotto e si riferisce ad un programma di interventi da attuare per fasi successive, finalizzato alla razionalizzazione della rete di trasmissione della Lombardia Nord-Orientale. I soggetti sottoscrittori concordano sulla soluzione di progetto presentata, che rappresenta la 1^a fase del programma.

Il 1 agosto, nell'ambito della procedura di VIA, la Regione Lombardia esprime parere favorevole con prescrizioni ambientali, tecniche e raccomandazioni.

Il GRTN, soggetto aggiudicatore, trasmette, con nota del 18 settembre, il progetto alla Struttura tecnica di missione del MIT e al Ministero delle attività produttive.

Nel corso dell'istruttoria vengono acquisiti i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri Enti interessati richiesti dal GRTN, tra i quali, in particolare: del Ministero dei beni culturali, del Ministero della salute, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle politiche agricole, del Ministero della, dell'Ente nazionale aviazione civile Spa.

Il progetto è inserito nel cosiddetto "Quick Start Program" (programma di avviamento rapido dei progetti prioritari), di cui alla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio dell'11 novembre.

2004

Il MIT, con nota del 23 febbraio, trasmette, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la relazione istruttoria sulla "Linea a 380 kV S.Fiorano (I) – Robbia (CH) in doppia terna di interconnessione Italia-Svizzera" con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, con

prescrizioni, della tratta italiana dell'elettrodotto.

Il Ministero delle attività produttive, con nota del 24 febbraio, comunica di condividere gli esiti istruttori del MIT.

Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni culturali, esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni ambientali del 18 febbraio, che conclude un procedimento di VIA avviato su istanza del GRTN alla fine del 2001.

La Regione Lombardia, sentiti gli enti territorialmente interessati, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, condizionato al rispetto del citato accordo di programma e alle prescrizioni contenute nel parere regionale formulato nell'ambito della procedura di VIA con delibera della Giunta del 1 agosto 2003.

Il Presidente della Regione Lombardia, con nota del 28 aprile, formula l'Intesa dell'aprile 2003.

Il CIPE, con delibera n. 9, prende atto che il MIT ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, finalizzate alla risoluzione delle interferenze. Il soggetto aggiudicatore è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (GRTN). Il costo è stimato in 23 Meuro ed i costi di realizzazione sono finanziati con la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica. Il GRTN, nell'ambito del programma europeo TEN (Trans European Network), richiede ed ottiene dalla Commissione Europea il finanziamento al 50% delle attività di progettazione. Il CIPE approva quindi, con prescrizioni, il progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV S.Fiorano-Robbia, in doppia terna, di interconnessione Italia-Svizzera-tratta in territorio italiano-tra la stazione elettrica di S.Fiorano e il confine Svizzero (loc. Poschiavino) e riconosce la compatibilità ambientale dell'opera. I termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori sono fissati, rispettivamente, entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera sulla GU per l'inizio e 36 mesi per la conclusione.

2005

Il 20 gennaio, presso il GRTN, viene inaugurata la linea elettrica di interconnessione Italia Svizzera realizzata dalla società Terna. I lavori sono iniziati a maggio 2004 e si sono conclusi nel mese di dicembre dello stesso anno.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 kV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in doppia terna d'interconnessione" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 kV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in doppia terna d'interconnessione" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 100%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che il collegamento, in esercizio dal 20 gennaio 2005, è in attesa di collaudo ministeriale.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	23,000 Fonte: Delibera CIPE 9/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	23,000 Fonte: Delibera CIPE 9/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	67,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	67,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	23,000 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	59,578 Fonte: Terna Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	23,000 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	59,578
Terna Spa	59,578 Fonte: Terna Spa

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Come anche indicato nelle schede "175 1° Lotto" e "175 2°Lotto", la progettazione è stata sviluppata con servizio interno e supporto specialistico esterno. Il progetto preliminare è stato presentato alla Conferenza dei Servizi del 13/09/2003 e con modifiche alla successiva del 19/12/2003. Il SIA è stato presentato per la procedura di VIA conclusa in data 10/12/2004. La progettazione esecutiva è stata trasmessa nel settembre 2004 ai Ministeri incaricati della sorveglianza..

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	01/06/2001
Data fine:	30/09/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

In aggiunta a quanto già indicato nelle schede "175 1° Lotto" e "175 2°Lotto" relativamente ai rispettivi contratti di appalto per lavori, si fa presente che TERNA ha provveduto separatamente all'approvvigionamento dei materiali di linea (sostegni, conduttori e funi di guardia, isolatori, morsetteria) per un importo complessivo di 23.150.784,20 Euro

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Il collegamento è in esercizio dal 20/01/2005

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale del 2003
Verbale del Consiglio di Amministrazione del G.R.T.N. del 29 Gennaio 2003
IGQ tra Governo e Regione Lombardia del 28 Aprile 2003
Accordo di Programma Regione Lombardia del 24 Giugno 2003
Delibera di Giunta Regionale n. VII/13949 del 1 Agosto 2003
Comunicazione della Commissione Europea del 11 Novembre 2003
Delibera di Giunta Regione Lombardia n. VII/16375 del 13 Febbraio 2004
Decreto DEC/DSA/2004/109 del 18 Febbraio 2004
Delibera CIPE 9/2004
del 29 Aprile 2004
Comunicato stampa GRTN del 20 Gennaio 2005

1° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Progettazione sviluppata con servizio interno e supporto specialistico esterno. Progetto preliminare presentato alla conferenza dei servizi del 13/09/2003 e con modifiche alla successiva del 19/12/2003. Sia presentato per procedura di VIA conclusa in data 10/02/2004, La progettazione esecutiva è stata trasmessa nel settembre 2004 ai Ministeri incaricati della sorveglianza.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori:
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio: 01/06/2001
Data fine: 30/09/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata

Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando: 19/01/2004
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 07/04/2004
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: NUOVA CFE CANTAMESSA
Codice fiscale aggiudicatario: 01567460165
Data contratto: 07/04/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 17.000.000,00
Importo oneri per la sicurezza: 40.000,00
Importo complessivo a base di gara: 17.040.000,00
Importo aggiudicazione: 15.055.000,00
Somme a disposizione:
Totale: 15.055.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: La data indicata per il bando di gara è in effetti la data della Richiesta di offerta estesa al comparto qualificato "Elettrodotti 380 kV". L'importo indicato a base di gara è in effetti il preventivo di ufficio. L'importo indicato si riferisce all'appalto per lavori e non include l'importo dei materiali approvvigionati direttamente da TERNA.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 15/04/2004
Data presunta fine lavori: 31/10/2004
Stato avanzamento importo: 16.488.103,70
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 18/05/2004
Data effettiva fine lavori: 20/01/2005
Data presunta fine lavori varianti: 14/08/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: in attesa di collaudo ministeriale

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	319
Motivi:	
Altri motivi:	problematiche connesse con lavori in alta montagna
Importo:	16.422.864,00
Importo oneri sicurezza:	40.000,00
Somme a disposizione:	
Totale:	16.462.864,00
Note:	la data indicata per la fine lavori è quella dell'entrata in esercizio nelle more del completamento dei lavori di finitura

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2005
Previsione al 30/04/2009	2005
Previsione al 30/04/2010	2005
Previsione al 30/04/2011	2005

2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	progettazione sviluppata con servizio interno e supporto specialistico esterna.progetto preliminare presentato alla conferenza dei servizi del 13/09/2003 e con modifiche alla successiva del 18/12/2003. SIA presentato per procedura VIA conclusa in data 10/02/2004.La progettazione esecutiva è stata trasmessa nel settembre 2004 ai Ministeri incaricati della sorveglianza

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	01/06/2001
Data fine:	30/09/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando

Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	
Data bando:	19/01/2004
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	07/04/2004
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	RODA SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	00549730984
Data contratto:	07/04/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	22.000.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	40.000,00
Importo complessivo a base di gara:	22.040.000,00
Importo aggiudicazione:	18.490.000,00
Somme a disposizione:	
Totale:	18.490.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	La data indicata per il bando di gara è in effetti la data della Richiesta di Offerta estesa al comparto qualificato "Elettrodotti a 380 kV". L'importo a base di gara è in effetti il preventivo di ufficio. L'importo indicato si riferisce all'appalto per lavori e non include l'importo dei materiali approvvigionati da TERNA.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	15/04/2004
Data presunta fine lavori:	31/10/2004
Stato avanzamento importo:	19.692.389,53
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	18/05/2004
Data effettiva fine lavori:	20/01/2005
Data presunta fine lavori varianti:	14/08/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in attesa di collaudo ministeriale

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	

Note:

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	319
Motivi:	
Altri motivi:	problematiche connesse con lavori in alta montagna
Importo:	19.924.077,00
Importo oneri sicurezza:	40.000,00
Somme a disposizione:	
Totale:	19.964.077,00
Note:	la data indicata per fine lavori è quella dell'entrata in esercizio nell more del completamento di lavori di finitura


ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2005
Previsione al 30/04/2007	2005
Previsione al 30/04/2009	2005
Previsione al 30/04/2010	2005
Previsione al 30/04/2011	2005

PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Elettrodotto a 380 kv in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo - Rho

SCHEMA N. 176

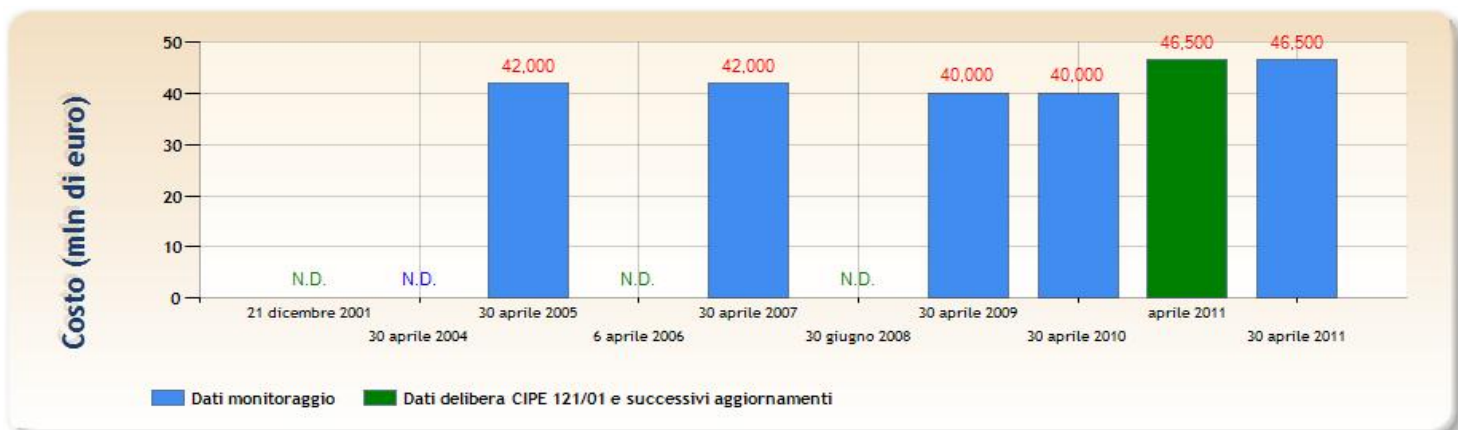

LOCALIZZAZIONE



CUP:

H37B04000000004

TIPOLOGIA OPERA:

Comparto energetico

SOGGETTO TITOLARE:

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

42/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

2006

DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione di un elettrodotto a 380 kV, tracciato parzialmente aereo e in cavo interrato, che parte dalla stazione elettrica di Turbigo per raggiungere, dopo un percorso di 27 km (19,2 aereo e 7,8 in cavo interrato), l'esistente elettrodotto 380 kV "Baggio-Bovisio" al quale sarà collegato. Per consentire il passaggio dell'elettrodotto dal tracciato aereo a cavo interrato e viceversa saranno realizzate 2 stazioni di transizione della superficie di circa 3.000 mq ciascuna nei Comuni di Pogliano Milanese e Rho. La realizzazione della nuova linea consente la demolizione dell'esistente elettrodotto a 220 kV "Turbino-Parabiago-Ospiate" di c.a. 25 km.

Il nuovo tracciato si sviluppa interamente nella Regione Lombardia, provincia di Milano, interessando i Comuni di Robbечchetto con Induno, Cuggiono, Inveruno, Busto Garolfo, Casorezzo, Parabiago, Arluno, Nerviano, Vanzago, Pogliano Milanese e Rho.

Le caratteristiche tecniche sono: frequenza nominale 50 Hz; tensione nominale 380 kV; intensità di corrente nominale 1500 A (per fase); potenza nominale 1000 MVA.

L'intervento, che costituisce un lotto unico, consentirà di superare i limiti attuali sui transiti in Lombardia ed in particolare sulla produzione delle centrali di Turbigo e Roncovalgrande, garantendo l'esercizio in sicurezza della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'area di Milano e favorendo il trasporto di energia dal Piemonte alla Lombardia.

DATI STORICI

1994

Il 22 aprile viene presentata ai Ministeri competenti una prima richiesta di autorizzazione dell'opera.

1995

Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni culturali, esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni con decreto del 15 settembre.

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre.

2003

L'intervento è compreso nel "Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale" 2003-2005 deliberato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (GRTN) il 29 gennaio ed inviata al Ministero delle attività produttive il 30 gennaio.

La società TERNA Spa, soggetto aggiudicatore, trasmette, con nota del 6 marzo, istanza di autorizzazione ed il progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere al MIT.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra MIT e Regione Lombardia del 28 aprile.

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 6 maggio, comunica che, dall'esame della documentazione trasmessa, il progetto risulta ottemperare alle prescrizioni sulla VIA del 15 settembre 1995.

Il MIT indice una CdS a carattere istruttorio, articolata anche in una seduta del 18 settembre di cui viene redatto apposito verbale (MIT prot. n. GC/STM/563, del 6 novembre 2003).

La TERNA, il 10 dicembre, invia una integrazione alla domanda di autorizzazione alla quale allega il progetto revisionato, che tiene conto di modeste varianti al tracciato emerse successivamente.

La Regione Lombardia, con delibera del 30 dicembre, sentiti gli enti territorialmente interessati, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla localizzazione anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, tenuto conto anche del parere regionale formulato nell'ambito della procedura di VIA con delibera di Giunta Regionale n. V/58028/1994.

2004

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 28 gennaio, conferma che, dall'esame della successiva documentazione trasmessa dalla società TERNA, il progetto risulta ottemperare alle prescrizioni della VIA del settembre 1995.

Terna pubblica il bando di gara per la "Fornitura del collegamento Turbigo-Rho in cavo a tensione 380 kV con

isolamento in estruso XLPE e relativi accessori, relativa posa in opera e collaudo finale in opera”.

Il Ministero delle attività produttive, con nota del 24 maggio, comunica di condividere gli esiti istruttori del MIT.

Il MIT, con nota del 17 giugno, trasmette la relazione istruttoria con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, con prescrizioni, dell'elettrodotto.

Il Ministero per i beni culturali, con nota del 15 giugno, esprime parere favorevole sulla intera verifica di ottemperanza riferita alle prescrizioni impartite per la VIA del 5 settembre 1995.

Il CIPE, con delibera n. 42, prende atto che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i pareri e/o consensi e/o prescrizioni degli altri Enti interessati tra i quali il Ministero della salute, il Ministero delle comunicazioni. Le opere sono oggetto di 4 specifiche convenzioni tra la TERNA e il Comune di Parabiago, il Consorzio Parco del Roccolo, il Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, il Comune di Robecchetto con Induno e la Terna comunica l'avvio del procedimento anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Il MIT propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, anche quelle finalizzate alla risoluzione delle interferenze, in relazione alle osservazioni pervenute al programma delle stesse interferenze dai relativi Enti gestori. Il soggetto aggiudicatore è la società TERNA e il costo dell'intervento è stimato in 42 Meuro. I costi di realizzazione sono finanziati con la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica. Il CIPE approva quindi il progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto, con le prescrizioni proposte dal MIT e condivise dal Ministero delle attività produttive e riconosce la compatibilità ambientale dell'opera. I termini di inizio e fine delle espropriazioni e dei lavori sono fissati, rispettivamente, entro 24 mesi dalla data di efficacia della delibera per l'inizio e 48 mesi per la conclusione..

Terna affida a Pirelli Cavi e Sistemi Energia Spa l'esecuzione dell'opera la cui ultimazione è prevista entro il 2006.

2006

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Rete Elettrica - Linea Turbigo-Bovisio tratta Turbigo-Rho" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Rete Elettrica - Linea Turbigo-Bovisio tratta Turbigo-Rho" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che i lavori sono stati ultimati a giugno 2006.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	42,000 Fonte: Delibera CIPE 42/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	42,000 Fonte: Delibera CIPE 42/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	40,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

Previsione di costo al 30 aprile 2010	40,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	46,500 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	46,500 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	46,500 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	46,500
TERNA Spa	46,500 Fonte: DEF 2012-2014

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	La progettazione è stata redatta dal soggetto aggiudicatore con affidamento esterno per attività specialistiche dei fornitori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Concessione di servizi (ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	21 mesi
Lavori:	21 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	29/01/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Terna Rete Elettrica Nazionale
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	29/01/2003

Quadro economico:

Importo a base gara:	40.418.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	40.418.000,00
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	
Totale:	40.418.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	Lavori eseguiti direttamente dal Soggetto Aggiudicatore con ordini di fornitura per i diversi componenti e materiali e con appalti per l'esecuzione delle opere: linea aerea, linea in cavo, stazioni di passaggio linea aerea/linea in cavo.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	40.418.000,00
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/09/2004
Data effettiva fine lavori:	30/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	02/07/2009
Note:	Collaudo effettuato da Commissione nominata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare DDS/RIS/2008/001 del 19/02/2008.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto DEC/VIA/2227 del 15 Settembre 1995

Delibera CIPE 121/2001

del 21 Dicembre 2001

Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2003-2005
del 2003

Delibera Consiglio d'Amministrazione G.R.T.N. del 29 Gennaio 2003

IGQ tra MIT e Regione Lombardia del 28 Aprile 2003

Delibera di Giunta n. VII/15947 del 30 Dicembre 2003

Bando di gara Terna Spa del Febbraio 2004

Delibera di Giunta Regione Lombardia n. VII/16375 del 13 Febbraio 2004

Decreto DEC/DSA/2004/109 del 18 Febbraio 2004

Delibera CIPE 42/2004

del 29 Settembre 2004

Avviso di aggiudicazione Terna Spa del Dicembre 2004

Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2007

Tratto aereo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Tratto cavo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:


Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Elettrodotto a 380 kv Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)

SCHEDA N. 177

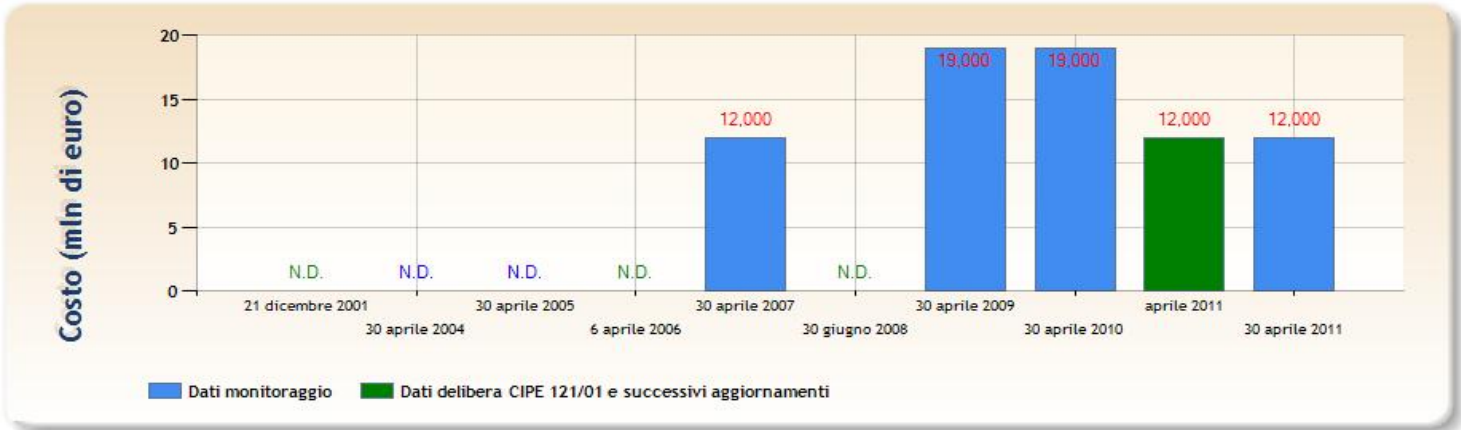

LOCALIZZAZIONE



CUP:

H85J05000000007

TIPOLOGIA OPERA:

Comparto energetico

SOGGETTO TITOLARE:

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

143/2005
Seduta del 29/3/2006

ULTIMAZIONE LAVORI

2007

DESCRIZIONE

L'intervento consiste nella realizzazione di una variante dell'elettrodotto a 380 kV Matera-S.Sofia, nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture, di 26,600 Km ca. Il tratto di variante sarà costituito, come l'elettrodotto già realizzato, da una palificazione a semplice terna di tipo unificato ENEL, armata con nove conduttori di energia e due corde di guardia. La realizzazione della variante consentirà la demolizione di un tratto di linea, per 16,7 Km ca. e di 31 sostegni, con relative fondazioni, già realizzati.

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale.

2003

L'intervento è compreso nel "Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2003-2005" deliberato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) il 29 gennaio ed inviato al Ministero delle attività produttive il 30 gennaio.

2004

La Terna Spa, soggetto aggiudicatore, trasmette, con nota del 26 novembre, copia del progetto al MIT e al Ministero delle attività produttive.

2005

In qualità di Ente interferito ANAS, con nota del 10 gennaio, propone delle prescrizioni al progetto. Anche Snam Rete Gas, con nota del 13 gennaio, propone ulteriori prescrizioni.

Il MIT indice una CdS a carattere istruttorio che si svolge il 14 gennaio.

Terna, in data 8 marzo, invia alla GUCE l'avviso informativo periodico relativo all'affidamento, con la procedura negoziata senza indizione di gara, dell'opera.

La Commissione VIA, con nota del 28 giugno, esprime parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

Il soggetto aggiudicatore provvede, in data 23 giugno, alla comunicazione di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Il soggetto aggiudicatore, con nota del 2 agosto, comunica che non sono pervenute osservazioni nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione.

Il soggetto aggiudicatore, con nota del 20 settembre, accetta le condizioni relative alle modalità di progettazione, esecuzione ed esercizio degli impianti elettrici, fatta eccezione per le prescrizioni proposte da Snam Rete Gas e da ANAS.

Il Ministero per i beni culturali, con nota del 14 ottobre, esprime parere favorevole con prescrizioni.

Il soggetto aggiudicatore, con nota del 17 ottobre, rispetto alle prescrizioni ANAS, specifica di aver seguito i dettami del decreto ministeriale n. 449/1988 nel posizionamento dei sostegni.

Il MIT, con nota del 18 ottobre, trasmette la relazione istruttoria relativa alla "Variante della linea a 380 kV in semplice terna, Matera - S. Sofia, nei comuni di Rapolla, Melfi e Rionero in Vulture, in provincia di Potenza", con la proposta dell'approvazione del progetto per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto con le prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze.

Il Ministero delle attività produttive, con nota del 24 ottobre, comunica di condividere gli esiti istruttori del MIT.

Il GRTN cede alla Terna il ramo d'azienda relativo alle attività di trasmissione e dispacciamento a decorrere dal 1 novembre. La nuova società assume la denominazione di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa.

Il Presidente della Regione Basilicata, con nota del 2 dicembre, esprime parere favorevole.

Il CIPE, con delibera n. 143, prende atto che la variante è stata oggetto di un accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive, la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, i Comuni di Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture e GRTN, che hanno concordato sul tracciato della variante. I costi di realizzazione, 12 Meuro, sono finanziati con la tariffa sulla rete di trasporto dell'energia elettrica. Il CIPE approva il progetto definitivo dell'opera.

2006

L'intervento è incluso nel Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2006 di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa. Il documento indica il 2006 quale anno di completamento dei lavori.

Il CIPE, nella seduta del 29 marzo, prende atto che la Società TERNA, soggetto aggiudicatore della variante all'elettrodotto Matera S. Sofia, è anche soggetto realizzatore.

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2007

Il 31 gennaio entra in funzione l'elettrodotto.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS .

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Rete Elettrica - Elettrodotto 380 kV Matera - S.Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Rete Elettrica - Elettrodotto 380 kV Matera - S.Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 100%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, l'opera risulta in esercizio dal 2007.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	12,000 Fonte: Delibera CIPE 143/2005
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	19,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	19,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	12,000 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	12,000 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
---	---

Risorse disponibili ad aprile 2011 12,000 **Fonte:** DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011: 12,000
Terna Spa 12,000 **Fonte:** DEF 2012-2014

Fabbisogno residuo: 0,000

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Delibera CIPE 121/2001

del 21 Dicembre 2001

PdS della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2003-2005

del 2003

Avviso informativo periodico Terna Spa, GUCE 2005/S 50-048471 del 11 Marzo 2005

Delibera CIPE 143/2005

del 2 Dicembre 2005

PdS della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale del 2006

Seduta CIPE del 29 Marzo 2006

Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2007

1° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Sì

Importo lavori: 2.118.724,53

Servizio: Interno

Costo progettazione interno:

Data inizio:

Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

Modalità di selezione: Affidamento diretto

Procedura:

Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione: 3 mesi

Lavori: 10 mesi

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione: 13/01/2006
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: REBAIOLI S.P.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 00808540173
Data contratto: 28/03/2006

Quadro economico:

Importo a base gara: 2.068.724,53
Importo oneri per la sicurezza: 50.000,00
Importo complessivo a base di gara: 2.118.724,53
Importo aggiudicazione: 1.739.710,03
Somme a disposizione:
Totale: 1.739.710,03
% Ribasso di aggiudicazione: 18,32
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori: 05/05/2006

Data effettiva fine lavori: 12/01/2007

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione: In anticipo

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-
amministrativo:

Note: Il collaudo è a farsi.
L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2007

2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: l'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 3 mesi
Lavori: 10 mesi
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 28/03/2006
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ITALWORK\MAZZALAI\DI PIETRO\GSI
Codice fiscale aggiudicatario: 04948431004
Data contratto: 28/03/2006

Quadro economico:

Importo a base gara: 2.493.134,10
Importo oneri per la sicurezza: 50.000,00
Importo complessivo a base di gara: 2.543.134,10
Importo aggiudicazione: 1.925.480,42
Somme a disposizione:
Totale: 1.925.480,42

% Ribasso di aggiudicazione: 24,77

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori: 05/05/2006

Data effettiva fine lavori: 12/01/2007

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione: In anticipo

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Il collaudo è a farsi.L'opera è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI


Previsione al 30/04/2011

2007


PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)

SCHEDA N. 178

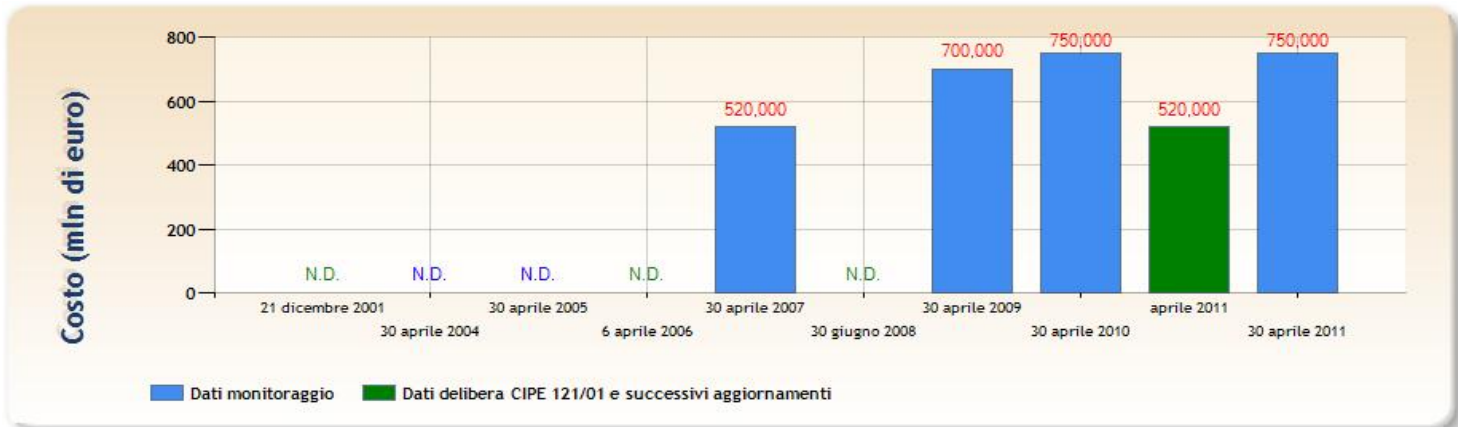

LOCALIZZAZIONE

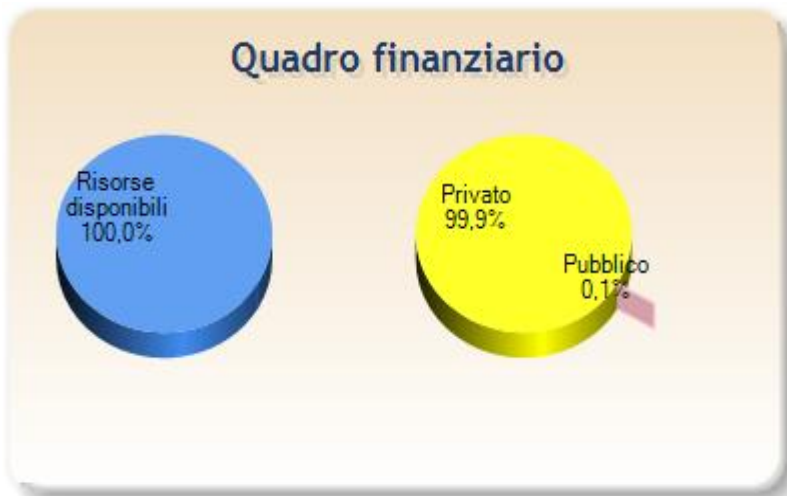

CUP:

D59E04000040004

TIPOLOGIA OPERA:

Comparto energetico

SOGGETTO TITOLARE:

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

144/2005

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

Il nuovo elettrodotto SA.PE.I. – acronimo di SARdegna-PENisola-Italiana – consiste nella realizzazione di un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua a ± 500 kVcc di potenza nominale 1000 MW, tra le due stazioni elettriche di Fiume Santo (SS) e Latina (LT). Si tratta del più lungo “ponte elettrico” del Mediterraneo, con 435 km che collegano Latina a Fiumesanto oltre ad essere l'elettrodotto sottomarino più profondo del mondo con 1.640 mt sotto il livello del mare.

Il collegamento, inaugurato il 17 marzo 2011, consentirà lo scambio di energia tra le reti elettriche a 380 kV della Sardegna e della Penisola italiana. Lo schema, bipolare, comprende 2 stazioni di conversione, costituite da 2 moduli di conversione da 500 MW, collegate mediante 2 linee di polo, in cavo, a ± 500 kVcc. Il collegamento sarà costituito da:

- 2 stazioni di conversione alternata/continua: una in Sardegna, adiacente alla stazione RTN 380/150 kV di Fiume Santo, l'altra nel Lazio adiacente alla stazione RTN 380/150 kV di Latina. Entrambe saranno collegate alle esistenti stazioni RTN adiacenti;
- 2 linee di polo in cavo a ± 500 kV, realizzate parte in terra, per complessivi 15 km ca. e parte in mare, per complessivi 420 km ca. ciascuna;
- una linea di collegamento all'esistente elettrodo marino (anodo), in cavo media tensione, in Sardegna, località Punta Tramontana, parte in terra e parte in mare per complessivi 32 km ca.;
- una linea di collegamento all'elettrodo marino (catodo), in cavo media tensione, nel Lazio, a ca. 5 km dalla costa, parte in terra e parte in mare per complessivi 20 km ca.

DATI STORICI

2000

L'intervento è compreso nel programma 2001-2003 del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (GRTN).

2001

Il 26 ottobre GRTN pubblica il bando per lo studio di fattibilità dell'opera.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale.

2005

Terna Spa, il 15 marzo, invia alla GUCE il bando di gara per l'affidamento, con procedura negoziata, della “realizzazione del collegamento sottomarino e terrestre bipolare ± 500 kVcc Sardegna Penisola Italiana (SAPEI)” e, il 23 marzo, quello per l'affidamento, con procedura negoziata, della realizzazione di 2 stazioni elettriche di conversione corrente alternata/continua da inserire nella Rete di Trasmissione Nazionale in alta tensione 380 kVca localizzate a Fiume Santo (Sardegna) e a Latina (Lazio).

L'intervento è riconfermato nel “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2005” deliberato dal GRTN ed approvato dal Ministero delle attività produttive.

Il GRTN, con nota del 12 aprile, invia al MIT e al Ministero delle attività produttive copia del progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di collegamento sottomarino. Successivamente il progetto viene integrato dal GRTN con note del 18 luglio, 30 agosto e 3 ottobre.

Il 4 maggio GRTN comunica l'avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Il 31 maggio si svolge la CdS nella quale vengono acquisiti i pareri di vari Enti.

La Regione Sardegna, con nota del 14 settembre, esprime parere di conformità sulla localizzazione delle opere.

Il GRTN rilascia, con nota del 18 ottobre, accettazione delle prescrizioni, raccomandazioni e risoluzione delle interferenze e comunica che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, non sono pervenute osservazioni nel termine previsto di 30 giorni.

La Regione Lazio, con nota del 19 ottobre, esprime parere favorevole con prescrizioni sulle opere previste nella Regione che interessano siti di importanza comunitaria (SIC).

Il MIT, con nota del 26 ottobre, trasmette la relazione istruttoria con la proposta dell'approvazione del progetto, con prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze.

Il Ministero delle attività produttive, con nota del 28 ottobre, condivide gli esiti istruttori del MIT.

Il GRTN cede a Terna il ramo d'azienda relativo alle attività di trasmissione/dispacciamento, a decorrere dal 1 novembre. La nuova società assume la denominazione di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa.

Il Presidente della Regione Lazio, con nota del 29 novembre, esprime parere favorevole, anche ai fini dell'Intesa Generale Quadro con il Governo.

Il Presidente della Regione Sardegna, con nota del 2 dicembre, esprime parere favorevole, anche ai fini dell'IGQ con il Governo.

Il CIPE, con delibera n. 144, approva il progetto dopo aver preso atto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dai Ministeri per i beni culturali e dell'ambiente, dalle Regioni Lazio e Sardegna, dall'Ente Parco La Maddalena, dal MIT e di Roma. Sul piano finanziario, il CIPE prende atto che si tratta di un'infrastruttura privata strategica per l'approvvigionamento energetico e che quindi i costi sono finanziati con mezzi autonomamente reperiti sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica sulla rete di trasporto dell'energia elettrica. Il progetto usufruisce anche di un contributo della Commissione Europea di 700.000 euro nell'ambito del Trans European Network (TEN), essendo infrastruttura strategica per lo sviluppo della rete elettrica europea. Il costo dell'intervento è stimato in 520 Meuro.

2006

L'opera è compresa nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2006 di Terna. Il documento indica il 2009 quale anno di completamento dei lavori.

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il 15 giugno viene pubblicato sulla GUCE il bando di gara per l'affidamento, con procedura negoziata, delle opere civili per la realizzazione delle stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto (SS) e Latina, per un valore di 38 Meuro e un termine di esecuzione di 24 mesi dall'aggiudicazione.

Il 10 agosto viene pubblicato sulla GUCE il risultato di gara relativo all'affidamento della realizzazione di 2 stazioni elettriche di conversione corrente alternata/corrente continua da inserire nella Rete di Trasmissione Nazionale in alta tensione 380 kVca localizzate a Fiume Santo (Sardegna) e a Latina (Lazio)" all'ATI tra ABB Power Technologies AB (Svezia -Mandataria) - ABB Power Technologies SpA (Italia) - ABB Energy Automation SpA (Italia).

Terna informa, nel mese di novembre, che sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'elettrodotto, in particolare gli sbancamenti necessari per la stazione di conversione presso Latina.

2008

Il 15 settembre viene erogato il finanziamento sottoscritto da Terna con la BEI da 300 Meuro, per la costruzione del collegamento SAPEI. Il prestito avrà una durata di 20 anni e rimborsato in rate semestrali a partire dal 5^o anno. Le condizioni economiche prevedono un costo annuo del finanziamento pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un margine di 5 punti base.

2009

Terna pubblica il documento "Strategic Plan 2009-2013" in cui si fa il punto sui lavori in corso. "Nel 2008, in linea con i tempi previsti, è stato realizzato oltre il 58% del totale degli investimenti. E' stato posato il primo dei 2 cavi sottomarini (440 km, di cui 420 km di cavo marino) ed è stata completata la posa dei cavi terrestri. Alla fine di novembre 2008 sono state eseguite con successo le prove di tensione. Le 2 stazioni di conversione di Latina e Fiume Santo sono in avanzato stato esecutivo. Completati i montaggi elettromeccanici del primo polo della stazione di conversione di Latina, in corso di completamento quelli del secondo polo. Entro l'estate del 2009 sarà completato il 1^o cavo ed entro la fine del 2010 il 2^o".

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Nell'ultimo mese del 2009 entra in esercizio il primo polo del collegamento SAPEI tra il continente e la Sardegna .

2010

In data 18 marzo Terna firma un accordo con la BEI per un ulteriore finanziamento da 73 Meuro per il progetto SAPEI. Tale finanziamento incrementa quello già in essere da 300 Meuro sottoscritto il 5 maggio 2008. Anche questo 2^o

finanziamento avrà durata pari a 20 anni e sarà rimborsato in rate semestrali a partire dal 5^a anno. Le condizioni economiche sono molto competitive e prevedono un costo annuo del finanziamento pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un margine di 40 punti base.

Dal bilancio 2009 di Terna si rileva il seguente stato di avanzamento dei lavori: "nel 2008 si è conclusa la posa dei cavi sottomarini del 1^o polo per un totale di 425 km. Nel 2009 sono terminate le opere civili e la costruzione degli edifici che ospitano le apparecchiature elettriche ad alta tecnologia, mentre è in corso la realizzazione del secondo polo in cavo sottomarino e le prove che consentiranno la messa in esercizio dell'impianto nel 2010".

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Rete Elettrica - Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Rete Elettrica - Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dal bilancio 2010 di Terna si rileva che il 17 marzo 2011 è stato inaugurato il nuovo elettrodotto SA.PE.I., il primo collegamento elettrico diretto tra la Sardegna e il continente e la più importante e tecnologicamente avanzata linea elettrica ad alta tensione mai realizzata in Italia. L'investimento è stato pari a 750 milioni di euro finanziati per oltre il 50% da Terna con mezzi propri e per la restante parte con uno stanziamento di 373 milioni di euro da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per il suo alto valore strategico.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che, a causa del danneggiamento del cavo di polo1 e cavo di elettrodo a Fiume Santo, si prevede l'ultimazione dei lavori entro ottobre 2011 (percentuale di avanzamento pari al 95%). In attesa del completamento delle prove finali l'impianto è stato comunque consegnato all'esercizio.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	520,000 Fonte: Delibera CIPE n.144/2005
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	700,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	750,000 Fonte: Terna Spa
Costo ad aprile 2011	520,000 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	750,000 Fonte: Terna Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	520,000 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	750,000
Terna Spa	749,275 Fonte: Terna Spa; Delibera CIPE 10/2009
Fondi Pubblici	0,725 Fonte: Terna Spa; Delibera CIPE 10/2009
<hr/>	
Fabbisogno residuo:	0,000

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	la progettazione esecutiva è stata sviluppata nell'ambito dei contratti di appalto di cui alle schede di dettaglio 178 "impianti" e 178 "collegamento sottomarino e terrestre".
	La precedente fase di progettazione è stata sviluppata dal Titolare fino al progetto preliminare presentato in conferenza dei servizi del 25.05.2005 con servizio interno integrato con risorse specialistiche esterno. Il progetto esecutivo è stato trasmesso a tutte le autorità incaricate della sorveglianza dalla delibera autorizzativa CIPE 144/2005 del 02/12/2005 pubblicata il 12/05/2006

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
Quadro economico:	
Importo a base gara:	
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: a integrazione di quanto indicato nelle schede 178 "OO.CC." 178"Impianti" e 178"Collegamento sottomarino e terrestre" si precisa che il collegamento SAPEI ha goduto di un contributo comunitario per la progettazione per 723.000,000 Euro e di un finanziamento a tasso agevolato BEI per un importo complessivo di 373.000.000.00 Euro

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 31/10/2011
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: a completamento di quanto indicato nelle schede relative agli appalti principali 178 "OO.CC.", 178 "Impianti" e 178 "collegamento marino e terrestre" si precisa che la data presunta di fine lavori indicata si riferisce all'ultimazione delle finiture e delle prove di funzionamento. Nelle more, l'impianto è già in esercizio dal 12/11/2010 (polo 1) e 20/12/2012 (polo2)

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Programma GRTN 2001-2003
del 2000

PdS della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale del 2005
Bando Terna Spa, GUCE 2005/S 24-023324 del 31 Gennaio 2005
Delibera CIPE 144/2005
del 2 Dicembre 2005
PdS della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale del 2006
Bando Terna Spa, GUCE 2006/S 112-119839 del 15 Giugno 2006
Avviso aggiudicazione Terna Spa, GUCE 2006/S 151-163013 del 10 Agosto 2006
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2007
Avviso aggiudicazione Terna Spa del 4 Gennaio 2007
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2008
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2009
Terna Spa - Bilanci 2007 e 2008 e Resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2009
del 31 Marzo 2009
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2010
Terna Spa - Bilancio 2009
del Aprile 2010
Terna Spa - Bilancio 2010 del Aprile 2011

Collegamento sottomarino e terrestre tra le due stazioni elettriche di Fiumesanto e Latina

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	la preogettazione esecutiva è stata sviluppata dall'appaltatore nell'ambito del contratto per i lavori. La precedente fase fino alla progettazione preliminare, oggetto della conferenza dei servizi del 25/05/2005 era stata sviluppata dal titolare con servizio interno integrato da risorse specialistiche esterne
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia (ora Prysmian Powerlink) srl
Codice fiscale aggiudicatario:	04963770013 (0ra
Data inizio:	01/01/2006
Data fine:	31/08/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Preliminare
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	66 mesi
Data bando:	19/03/2005
CIG/CUI:	0910356089/G55J04002370001
Data aggiudicazione:	12/12/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia (ora Prysmian Powerlink) srl
Codice fiscale aggiudicatario:	04963770013 (ora
Data contratto:	16/01/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	320.000.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	36.000,00
Importo complessivo a base di gara:	320.036.000,00
Importo aggiudicazione:	414.020.000,00
Somme a disposizione:	
Totale:	414.020.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'importo indicato a base di gara è in effetti il preventivo d'ufficio

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	01/01/2006
Data presunta fine lavori:	30/06/2011
Stato avanzamento importo:	413.403.676,00
Stato avanzamento percentuale:	95,00
Data effettiva inizio lavori:	01/01/2006
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/10/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - danneggiamento cavo di polo1 e cavo di elettrodo a Fiume Santo
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	prove di funzionamento dei cavi di polo e di elettrodo da completare a seguito riparazioni. nelle more dell completamento delle riparazioni e prove, i cavi di polo sono comunque in esercizio.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	23
Giorni proroga totali:	120
Motivi:	
Altri motivi:	maggiori oneri protezione cavi marini e aggiornamenti dei programmi alla potenzialità degli stabilimenti di produzione cavi marini
Importo:	445.973.620,00
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	445.973.620,00
Note:	l'importo indicato è quello totale sulla base delle varianti ad oggi

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	2009
Previsione al 30/04/2009	2010
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2011

Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Impianti

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	La progettazione esecutiva è stata sviluppata nell'ambito del contratto principale dei lavori. la fase precedente fino alla progettazione preliminare presentata in conferenza dei servizi del 25/05/2005 era stata sviluppata dal Titolare con servizio interno integrato da risorse specialistiche esterne

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	ABB Power Technologies (Svezia)
Codice fiscale aggiudicatario:	SE556018072001
Data inizio:	01/04/2006
Data fine:	31/08/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Preliminare
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	47 mesi
Data bando:	31/05/2005
CIG/CUI:	06713607CA/G55J040023001
Data aggiudicazione:	13/04/2006
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ABB Power Technologies AB (Svezia)
Codice fiscale aggiudicatario:	SE556018072001
Data contratto:	28/04/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	170.000.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	222.400,00
Importo complessivo a base di gara:	170.222.400,00
Importo aggiudicazione:	150.586.000,40
Somme a disposizione:	
Totale:	150.586.000,40
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	l'importo indicato come base di gara è in effetti il preventivo di ufficio

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	01/04/2006
Data presunta fine lavori:	27/03/2010
Stato avanzamento importo:	128.041.333,00
Stato avanzamento percentuale:	98,00
Data effettiva inizio lavori:	01/04/2006
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/10/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - rinvio prove di accettazione finali per danneggiamento cavo di elettrodo a Fiume Santo
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in attesa del completamento delle prove finali l'impianto e comunque stato consegnato all'esercizio in data 12/11/2010 (primo polo) e 20/12/2011 (secondo polo)

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
-----------------------	--

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:	10
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	interferenze con lavori OO.CC. e danneggiamento cavo di elettrodo a Fiume Santo
Importo:	154.306.400,00
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	154.306.400,00
Note:	l'importo indicato è quello comprensivo delle varianti ad oggi

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	2009
Previsione al 30/04/2009	2009
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2011

Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Opere civili

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	La progettazione esecutiva delle opere civili è stata sviluppata nell'ambito del contratto "stazioni elettriche di conversione di Latina e Fiume Santo" oggetto di altra scheda. la progettazione precedente è stata sviluppata dal Titolare con servizio interno integrato da risorse esterne fino alla "progettazione preliminare" presentata in Conferenza dei Servizi del 25.05.2005

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	ABB Power Technologies AB (Svezia)
Codice fiscale aggiudicatario:	SE556018072001
Data inizio:	01/04/2006
Data fine:	29/07/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	21 mesi
Data bando:	15/06/2006
CIG/CUI:	1594716B5E/G55J04002730001
Data aggiudicazione:	10/11/2006
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Impresa Pellegrini (Cagliari)
Codice fiscale aggiudicatario:	01712410925
Data contratto:	10/11/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	46.744.509,69
Importo oneri per la sicurezza:	160.000,00
Importo complessivo a base di gara:	46.904.509,69
Importo aggiudicazione:	41.192.326,22
Somme a disposizione:	
Totale:	41.192.326,22
% Ribasso di aggiudicazione:	-12,22
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	15/11/2006
Data presunta fine lavori:	05/08/2008
Stato avanzamento importo:	50.314.311,00
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/11/2006
Data effettiva fine lavori:	31/07/2010
Data presunta fine lavori varianti:	31/07/2010
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/06/2011
Note:	Il collaudo statico dell'ultima parte d'opera strutturale è stato eseguito in data 21/06/2010.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale: 7

Giorni proroga totali: 725

Motivi:

Altri motivi: bonifica sito inquinato Fiume Santo. Avverse condizioni meteo

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007 2009

Previsione al 30/04/2009 2009


Previsione al 30/04/2010 2009

Previsione al 30/04/2011 2010

PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Elettrodotti 380 KV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse

SCHEDA N. 179

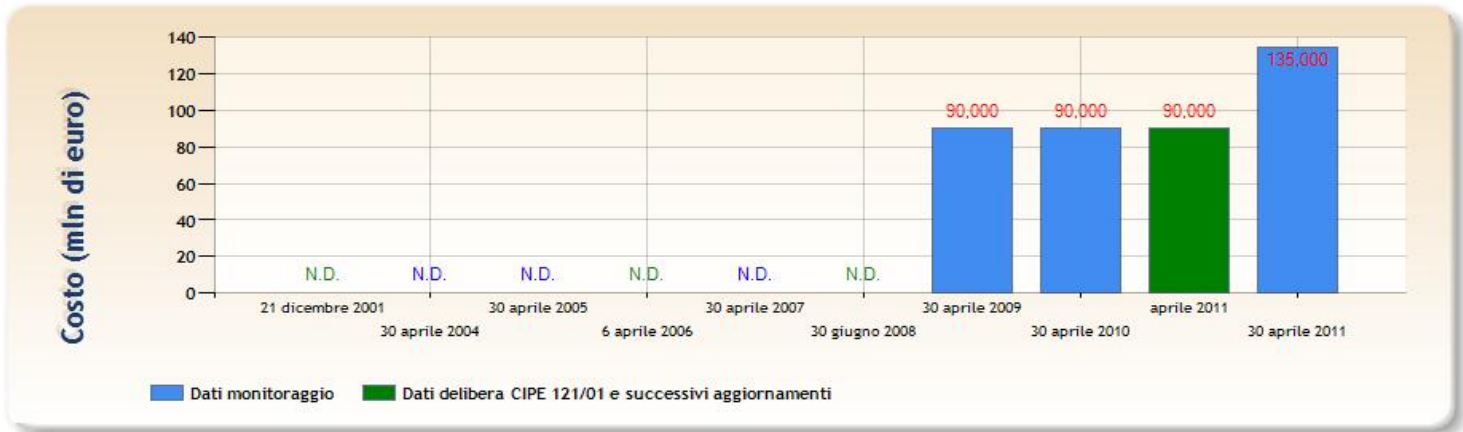

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G99E05000030007

TIPOLOGIA OPERA:

Comparto energetico

SOGGETTO TITOLARE:

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

73/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

L'intervento consiste in un riassetto generale della rete elettrica tra le città di Firenze ed Arezzo, con risoluzione di alcune criticità tra cui la riduzione delle perdite ed un aumento della potenza trasmissibile. L'intervento dovrebbe apportare anche un notevole miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree interessate. E' prevista la realizzazione delle seguenti opere:

- 41 Km ca. di elettrodotti a 380 kV (di cui circa 3 Km in cavo);
- 6 Km ca. di elettrodotti a 220 kV (di cui circa 0,4 Km in cavo e 1,1 di opere provvisorie);
- 10 km ca. di elettrodotti a 132 kV (di cui circa 7 Km in cavo);
- una nuova stazione elettrica a Casellina con nuova sezione 380 kV, adiacente all'attuale 220/132 kV, che viene demolita, con previsione di 2 fabbricati di cui uno di 680 mq (2244 mc) e l'altro di 15,5 mq (42,5 mc);
- varie stazioni di transizione cavo-aria e viceversa per permettere l'esecuzione dei tratti in cavo. Saranno demolite le seguenti opere:
 - 8 Km di elettrodotti a 380 kV;
 - 100 Km di elettrodotti a 220 kV;
 - 5 Km circa di elettrodotti a 132 kV.

DATI STORICI

2000

L'intervento è compreso nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Toscana ed ENEL S.p.A. il 28 febbraio.

2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 tra i collegamenti per potenziare il sistema di trasmissione nazionale.

2002

Il 15 maggio viene attivata la procedura di VIA nazionale.

2003

L'intervento è compreso nel "Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2003-2005" deliberato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) il 29 gennaio.

Il 18 aprile viene stipulata l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana nella quale l'opera non è compresa.

2004

La Commissione VIA esprime parere positivo con prescrizioni sul progetto con decreto dell'11 ottobre.

2005

Il GRTN, con contratto del 28 febbraio diventato efficace il 1° novembre 2005, cede alla TERNA S.p.A., che assume la denominazione TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A, il ramo d'azienda relativo alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

TERNNA, con nota del 14 settembre, invia al MIT e al Ministero dello sviluppo economico copia del progetto per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere.

Il soggetto aggiudicatore, in data 21 settembre, fa pubblicare l'avviso di avvio del procedimento.

Nella CdS del 12 ottobre vengono acquisiti i pareri di Amministrazioni ed Enti interessati.

Il Ministero delle attività produttive rilascia il nulla osta di competenza, con nota del 27 settembre.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole sul progetto originale con nota del 3 aprile.

La Regione Toscana, con delibera del 31 giugno, formula parere favorevole al progetto, con prescrizioni.

La Regione Toscana, con delibera del 31 luglio, si esprime positivamente sul progetto modificato ed integrato e dichiara la propria disponibilità all'inserimento dell'opera in un atto aggiuntivo all'IGQ..

TERNNA, con nota del 13 novembre, trasmette a tutti i soggetti interessati una relazione tecnica integrativa nella quale

sono evidenziate alcune modifiche progettuali e provvede a far ripubblicare l'avviso di avvio del procedimento.

Il Ministero delle attività produttive conferma il proprio parere favorevole con nota del 22 novembre.

2007

La Commissione VIA, con nota del 19 febbraio, avendo preso atto della progettazione integrativa, conferma il parere positivo.

A seguito delle modifiche apportate al progetto, il Ministero per i beni culturali conferma il parere favorevole con prescrizioni, con nota del 7 marzo.

L'intervento è confermato nel "Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2007" approvato dal Ministero delle attività produttive l'11 aprile.

Il Ministero per i beni culturali, con nota del 16 aprile fornisce puntualizzazioni sul parere già espresso.

Il Presidente della Regione Toscana, con nota del 18 giugno, conferma il parere favorevole al progetto ed alla sua localizzazione sul territorio.

Il MIT, con nota del 26 luglio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria relativa al progetto proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, nonché l'approvazione del programma di riduzione delle interferenze.

Il CIPE, con delibera n. 73, approva il progetto con prescrizioni e raccomandazioni. Il costo originario dell'intervento, 30 Meuro, è aumentato, a seguito delle modifiche introdotte sulla base degli accordi intervenuti con gli Enti interessati, a circa 90 Meuro, di cui circa 2,4 per attività di progettazione. Il costo verrà coperto con mezzi autonomamente reperiti sulla base della remunerazione mediante la tariffa elettrica. La Regione Toscana si riserva di concorrere al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni formulate con la propria delibera del 31 luglio 2006, n. 548, per 1,5 Meuro, con i Comuni di Impruneta e di Scandicci, secondo modalità e termini da definire con successivo accordo tra le parti e imputando l'eventuale onere sulle risorse che saranno reperite, a decorrere dal 2008, nell'ambito dell'UPB di spesa n. 413. L'approvazione del progetto resta condizionata al formale inserimento dell'opera nell'IGQ stipulata tra il Governo e la Regione Toscana il 18 aprile 2003.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Rete elettrica - Elettrodotto 380kV S.Barbara-Tavarnuzze-Casellina e opere connesse" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" con uno stato attuativo "Attesa consegna lavori".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

Terna Spa, con comunicato del 3 dicembre 2010, riferisce l'entrata in servizio dell'elettrodotto "Tavarnuzze-Santa Barbara". Inoltre, comunica che: la linea ad altissima tensione, i cui lavori sono durati 2 anni, è lunga 30,4 km (29 km aerei e 1,4 in cavo) e permetterà di migliorare qualità ed efficienza del servizio elettrico dell'area e risolvere alcune criticità locali; stanno proseguendo i lavori per la nuova stazione 380 kV di Fontelupo e per la connessione, in cavo interrato, della suddetta stazione a quella di Tavarnuzze, la cui ultimazione è prevista nel 2011 per consentire, quindi, la successiva demolizione dei tralicci sulla collina di Giogoli nel comune di Scandicci; l'elettrodotto "Tavarnuzze-Santa Barbara" è parte del più ampio progetto a 380 kV "Casellina- Tavarnuzze-Santa Barbara", opera lunga complessivamente 41 km (ai quali se ne aggiungono altri 16 a tensione inferiore), per cui Terna ha investito complessivamente 135 milioni di euro; il tratto "Casellina-Tavarnuzze", lungo 9,3 km, e già in funzione dal dicembre 2009 e si compone di 31 tralicci di cui 9 progettati dall'architetto Sir Norman Foster, esempio di innovazione ed eccellenza tecnologica per lo sviluppo sostenibile della rete.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Rete elettrica - Elettrodotto 380kV S.Barbara-Tavarnuzze-Casellina e opere connesse" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" con uno stato attuativo "Attesa consegna lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal

RUP al 31 maggio 2011, risulta che l'ultimo intervento, il lotto 2, è stato completato in data 31/03/2011 e che attualmente l'opera è in esercizio.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	90,000 Fonte: Delibera CIPE 73/2007
Previsione di costo al 30 aprile 2010	90,000 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	90,000 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	135,000 Fonte: Terna Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	90,000 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	135,000
Terna Spa	135,000 Fonte: Terna Spa

Fabbisogno residuo: **0,000**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Protocollo d'intesa Regione Toscana - ENEL Spa del 28 Febbraio 2000
Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2003-2005 del 29 Gennaio 2003
IGQ tra Governo e Regione Toscana del 18 Aprile 2003
Decreto VIA n. DEC/DSA/2004/0876
del 11 Ottobre 2004
Contratto GRTN S.p.A - TERNA Spa del 28 Febbraio 2005
Delibera di Giunta Regione Toscana n. 548
del 31 Luglio 2006
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2007
Delibera CIPE 73/2007
del 3 Agosto 2007
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2008
Terna Spa - Bilanci 2007 e 2008 e Resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2009
del 2009
Terna Spa - PdS della rete di trasmissione nazionale del 2009
Comunicato Terna Spa del 3 Dicembre 2010

Lotto II - dalla stazione elettrica di transizione aria-cavo "Le Rose" al sostegno n. 47

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	4.179.266,18

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	2 anni
Lavori:	28 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	03/04/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CIET IMPIANTI S.P.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	01886970514
Data contratto:	03/04/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.089.060,59
Importo oneri per la sicurezza:	90.250,59
Importo complessivo a base di gara:	4.179.311,18
Importo aggiudicazione:	3.678.356,21
Somme a disposizione:	
Totale:	3.678.356,21
% Ribasso di aggiudicazione:	12,25
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	

Stato avanzamento percentuale:**Data effettiva inizio lavori:** 05/05/2008**Data effettiva fine lavori:** 31/03/2011**Data presunta fine lavori varianti:****Tempi realizzazione:** Secondo previsione**Data collaudo statico:****Data collaudo tecnico-amministrativo:****Note:** Il collaudo è a farsi-
L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni**Contenzioso:****Totale riserve definite:****Importo totale riserve definite:****Totale riserve da definire:****Note:****Sospensione lavori:****Numero totale:****Totale giorni sospensione:****Note:****Varianti:****Numero totale:****Giorni proroga totali:****Motivi:****Altri motivi:****Importo:****Importo oneri sicurezza:****Somme a disposizione:****Totale:** 0,00**Note:**

ULTIMAZIONE LAVORI**Previsione al 30/04/2004****Previsione al 30/04/2005****Previsione al 30/04/2007****Previsione al 30/04/2009** 2011**Previsione al 30/04/2010** 2010**Previsione al 30/04/2011** 2011

Lotto III - dal sostegno n. 47 alla stazione elettrica di S. Barbara

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	4.676.052,75
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	2 anni
Lavori:	18 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	03/04/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CIET IMPIANTI S.P.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	01886970514
Data contratto:	03/04/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.582.822,28
Importo oneri per la sicurezza:	93.230,47
Importo complessivo a base di gara:	4.676.052,75
Importo aggiudicazione:	4.181.299,47
Somme a disposizione:	
Totale:	4.181.299,47
% Ribasso di aggiudicazione:	10,80
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	

Data effettiva inizio lavori: 05/05/2008
Data effettiva fine lavori: 30/11/2009
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Il collaudo è a farsi.
L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009 2011
Previsione al 30/04/2010 2009
Previsione al 30/04/2011 2009

Opere connesse - dalla stazione elettrica di transizione aria cavo di Fontelupo alla stazione elettrica di Casellina e opere connesse

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	4.255.039,08

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	2 anni
Lavori:	14 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	07/11/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	ELETTRODOTTI CANTAMESSA
Codice fiscale aggiudicatario:	03386040160
Data contratto:	07/11/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.187.526,77
Importo oneri per la sicurezza:	67.512,31
Importo complessivo a base di gara:	4.255.039,08
Importo aggiudicazione:	5.577.980,27
Somme a disposizione:	
Totale:	5.577.980,27
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	33,20
Note:	L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	22/12/2008
Data effettiva fine lavori:	31/01/2010
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Il collaudo è a farsi.
L'opera in oggetto è in esercizio e per tanto non vi è la necessità di inoltrare successive comunicazioni

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007


Previsione al 30/04/2009 2011

Previsione al 30/04/2010 2010

Previsione al 30/04/2011 2010

**OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI
 COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI
 RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma
 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)**

SCHEDA N. 180

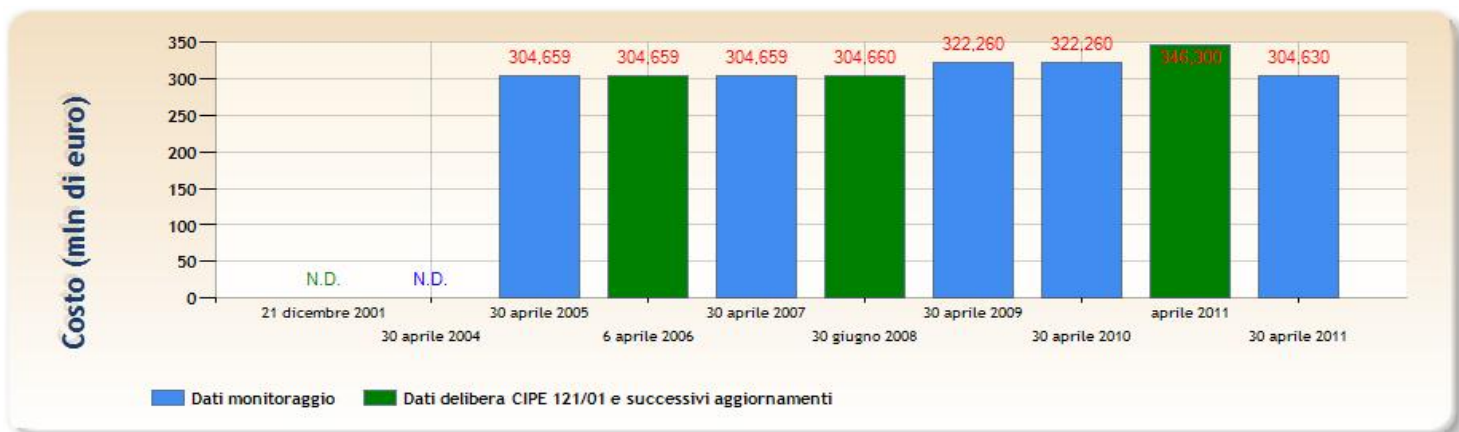

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Altra edilizia pubblica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

109/2004
102/2006

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Il programma di “mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali” è finalizzato ad elevare i livelli di funzionalità operativa dei complessi sedi delle istituzioni strategiche per la sicurezza dello Stato. E' stato in seguito integrato con le opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.

Nello specifico il programma si compone di 22 interventi così distinti:

1. Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro
2. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto
3. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto
4. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni
5. Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo
6. Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia
7. P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone
8. Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi
9. Ministero Politiche Agricole
10. Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari
11. Camera dei Deputati – Complesso del Seminario
12. Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema
13. Palazzo Venezia
14. Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo
15. Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo
16. Museo Storico delle Comunicazioni
17. Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto
18. Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto
19. Senato della Repubblica – Complesso della Minerva
20. Camera dei Deputati – Vicolo Valdina
21. Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio
22. Ministero Beni Culturali – Collegio Romano

L'analisi di dettaglio del percorso attuativo è stata pertanto condotta anche in modo distinto per ciascuno di essi. Il programma di “mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali” è articolato nei seguenti 22 interventi:

Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro: consolidamento, redistribuzione interna e restauro di parte del complesso di S.Maria in Aquiro sito in Piazza Capranica, per una superficie utile complessiva di circa 4.200 mq ripartita sui vari piani, da destinare ad uffici del Senato della Repubblica.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto: ordinaria manutenzione, bonifica e adeguamento degli impianti al piano interrato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto: completamento della bonifica e dell'adeguamento degli impianti ai piani – 2° lotto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni: restauro/adeguamento impiantistico del complesso demaniale in via della Mercede n.9 e trasformazione da sede Sala Stampa Estera e Sala Stampa Italiana ad uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo: ristrutturazione dell'edificio Ex Caserma Montezemolo in Roma, attuale

sede della Corte dei Conti.

Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia: ristrutturazione e riqualificazione della Caserma della Polizia di Stato “Ferdinando di Savoia” relativi agli edifici “D – E – F – G – H – L – M al piazzale e agli spazi sottostanti”.

P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone: costruzione di nuovi uffici, alloggi e parcheggi nel complesso demaniale sede della caserma P.S. Frontiera aerea “Iavarone” – Aeroporto di Fiumicino.

Ministero Politiche Agricole: ristrutturazione e riqualificazione, architettonica ed impiantistica, del Ministero delle politiche agricole in via Sallustiana e via XX Settembre a Roma.

Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi. Legge 62/1999 -Roma - Compendio del Viminale (Palazzina ex F.A.P.): restauro e adeguamento impiantistico dell'edificio demaniale “Palazzina ex FAP” del Compendio del Viminale, in uso al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per destinarlo a Museo storico della fisica e Centro studi “E. Fermi”, come disposto, in occasione del centenario della Società italiana di fisica, con legge 15 marzo 1999, n. 62.

Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari: adeguamento funzionale dell'auletta dei Gruppi Parlamentari, mediante ristrutturazione e riqualificazione di circa 1.100 mq da destinare alle sedute plenarie dei Gruppi Parlamentari ed alle attività connesse alle iniziative promosse da Montecitorio.

Camera dei Deputati – Complesso del Seminario: compartimentazione antincendio e realizzazione della centrale idrica e della rete idrica antincendio del Complesso del Seminario.

Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema: restauro, adeguamento funzionale/impiantistico del complesso sede della Scuola Nazionale del Cinema

Palazzo Venezia: restauro e recupero funzionale di ambienti da destinarsi a spazi museali, con l'obiettivo di recuperare degli ambienti interrati siti all'interno della sede museale di Palazzo Venezia, da adibire a spazi espositivi.

Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo: ristrutturazione e restauro dell'edificio sede del Teatro Ateneo nella città universitaria “La Sapienza” in Roma

Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo: restauro e adeguamento impiantistico del fabbricato in Largo Toniolo n.10 di proprietà del Senato, da adibire ad uffici

Museo Storico delle Comunicazioni: sistemazione – attraverso il restauro e l'adeguamento funzionale/impiantistico - del museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni presso il Ministero delle comunicazioni di viale Europa a Roma

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto: realizzazione del sistema di distribuzione elettrico ad alta affidabilità a servizio dell'intero compendio, interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti elettrici, di rilevazione incendi, telefonici e di telegestione.

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto: realizzazione del sistema di distribuzione elettrico ad alta affidabilità a servizio dell'intero compendio, interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti elettrici e speciali ed opere di consolidamento strutturale e di restauro.

Senato della Repubblica – Complesso della Minerva: restauro, ristrutturazione e adeguamento, anche impiantistico, del complesso Minerviano attiguo al Palazzo della Minerva ed edifici conventuali, per la realizzazione di un nuovo “Polo Culturale”.

Camera dei Deputati – Vicolo Valdina: riqualificazione, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del complesso di Vicolo Valdina.

Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio: realizzazione di un corridoio di collegamento sotterraneo tra Palazzo Montecitorio e Palazzo Theodoli Bianchelli.

Ministero Beni Culturali – Collegio Romano: restauro architettonico strutturale ed impiantistico del complesso architettonico-monumentale del Collegio Romano in Roma.

DATI STORICI

2003

L'art. 4, comma 151, della legge n. 350/2003 include - tra le finalità della legge obiettivo- anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. La legge autorizza inoltre ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle

opere strategiche.

2004

Il MIT, con nota del 19 novembre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sui progetti del programma, proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali.

Il CIPE, con delibera n. 109, approva il programma dell'intervento e i progetti preliminari o definitivi di alcuni interventi, rinviando l'individuazione delle modalità di copertura al momento dell'approvazione di tutti i progetti.

Il DPR n. 184, individua, quali organi decentrati del MIT, i Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) e i relativi Comitati tecnici amministrativi. Tali Comitati hanno competenza a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico e sui progetti definitivi di enti pubblici o privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50% e quando sia richiesto il parere degli organi consultivi del Ministero e l'importo non ecceda i 25 Meuro. Rientra tra le competenze del SIIT il supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale previste dalla legge obiettivo.

Il DPEF 2005-2008 classifica l'infrastruttura "Costituzione di un fondo per il mantenimento in efficienza degli edifici sedi di organismi istituzionali" tra le nuove proposte. Tali opere non sono presenti nella delibera CIPE n. 121/2001 e nel DPEF 2004 – 2007.

Il MIT, con nota del 19 novembre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sui progetti proponendo l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali delle progettazioni.

Il CIPE, con delibera n. 109, approva l'intero programma su tali opere, i progetti preliminari degli interventi Senato-Palazzo Toniolo e Museo Storico Comunicazioni, i progetti definitivi Camera dei Deputati - Auletta Gruppi Parlamentari e Complesso del Seminario, Scuola Nazionale del Cinema, Palazzo Venezia e Università degli studi di Roma La Sapienza - Teatro Ateneo, e rimanda a una fase successiva per le modalità di copertura del fabbisogno residuo pari a 250 Meuro su un costo complessivo di 304,7 Meuro.

2006

Le "Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali" sono comprese nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il MIT, con nota del 24 marzo, trasmette la relazione istruttoria sui progetti delle "Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali", proponendo il finanziamento del programma.

Il CIPE, con la delibera n. 102, procede alla ricognizione delle risorse disponibili, assegna al programma un contributo annuo di 22,3 Meuro per 15 anni, a valere sul limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge n. 166/2002 a decorrere dal 2003, e approva i progetti definitivi degli interventi Senato-Palazzo Toniolo, Museo Storico delle Comunicazioni, Presidenza della Repubblica-Quirinale, Senato della Repubblica-Complesso della Minerva, Camera dei Deputati-Vicolo Valdina, Camera dei Deputati-Palazzo Montecitorio, Ministero Beni Culturali-Collegio Romano.

2009

Gli interventi sono compresi nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS .

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Edifici istituzionali" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" articolata in 22 interventi.

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Edifici istituzionali" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 72%). Inoltre è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" articolata in 22 interventi.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, dei 22 interventi programmati 3 risultano ultimati, 13 in corso e 2 sospesi. Inoltre in 3 casi

risulta individuato l'esecutore ma si è in attesa dell'avvio dei lavori. Infine il contratto relativo al restauro architettonico strutturale ed impiantistico del complesso architettonico-monumentale del Collegio Romano è stato risolto con atto n. 222 di rep. con data 13/04/2010.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	304,659 Fonte: Delibera CIPE 109/2004
Costo al 6 aprile 2006	304,659 Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	304,659 Fonte: Delibera CIPE 102/2006
Costo al 30 giugno 2008	304,660 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	322,260 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	322,260 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	346,300 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	304,630 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	285,530 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	281,113
Fondi Pubblici	31,113 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna; Delibera CIPE 102/2006
Fondi Legge Obiettivo	250,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

Fabbisogno residuo: **23,517**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 184

del 2 Luglio 2004

Delibera CIPE 109/2004

del 20 Dicembre 2004

Delibera CIPE 102/2006 del 29 Marzo 2006

Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa

Note: La progettazione è stata affidata con i lavori in quanto trattasi di appalto integrato il costo è € 347.045,00 non soggetti al ribasso.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 17.034.693,57
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 399.101,75
Importo di aggiudicazione: 347.045,00
Nome aggiudicatario: Carpineto Nicola Costr. Generali Srl
Codice fiscale aggiudicatario: 03975190582
Data inizio: 20/02/2004
Data fine: 22/04/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 730 giorni
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 24/10/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Carpineto _Nicola Costr.Generali srl capogruppo; Otranto Costruzioni srl mandante
Codice fiscale aggiudicatario: 03975190582
Data contratto: 26/04/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 16.693.999,70
Importo oneri per la sicurezza: 340.693,87
Importo complessivo a base di gara: 17.034.693,57
Importo aggiudicazione: 16.496.956,59
Somme a disposizione: 3.637.749,41
Totale: 20.134.706,00
% Ribasso di aggiudicazione: 5,30
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: il totale del quadro economico è € 20.134.706,00 incluso gli oneri della Progettazione € 347.045,00. Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse Cipe.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 163/2006 come da Decreto PR. Senato della Repubblica

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 16.084.510,93

Stato avanzamento percentuale: 70,00
Data effettiva inizio lavori: 18/12/2003
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/05/2012
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Le attività di collaudo sono in corso; la consegna dei lavori è parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 1426
Note: motivi sospensione: 1-raggiungimento quota finanziamento concessa;
2- per redazione perizia di variante.

Varianti:

Numero totale: 3
Giorni proroga totali: 725
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006
- Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: motivi: art. 132 lett. a,lett. b, lett. c D.Lgs. 163/2006
Importo: 22.229.628,22
Importo oneri sicurezza: 412.856,22
Somme a disposizione: 3.406.408,86
Totale: 26.048.893,30
Note: il totale è € 26.395.938,31 inclusi gli oneri della progettazione € 347.045,00 e le somme a disposizione 3.406.408,86. L'intervento è articolato in 3 lotti :
1° lotto € 4.522.68,72 finanziamento Cap. 7340; 2° lotto € 13.653.624,00 finanziamento Cipe, oneri finanziari € 7.433.601,00 ; 3° lotto € 8.219.629,59 finanziamento cap. 7340. Maggior importo per maggiori attività archeologiche, di consolidamento delle strutture , adeguamenti normativi impiantistici ed antincendio sopravvenuti.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2012

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	La prog. è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato - ONERI PROG. € 143.886,52 NON SOGG. AL RIBASSO . la conferenza di servizi non è stata necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	5.358.473,33
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	165.469,50
Importo di aggiudicazione:	143.886,52
Nome aggiudicatario:	Eugenio Ciotola Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	04808921003
Data inizio:	11/06/2003
Data fine:	26/06/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	30 giorni
Lavori:	730 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	15/11/2002
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Eugenio Ciotola S.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	04808921003
Data contratto:	25/11/2002

Quadro economico:

Importo a base gara:	5.251.303,86
Importo oneri per la sicurezza:	107.169,47
Importo complessivo a base di gara:	5.358.473,33
Importo aggiudicazione:	5.071.752,93
Somme a disposizione:	1.367.938,11
Totale:	6.439.691,04
% Ribasso di aggiudicazione:	8,20
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: il totale complessivo è 6.439.691,04 inclusa la progettazione di € 143.886,52.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 D.lgs 163/2006 come da decreto n. U5OV/4026 del 24/07/2001

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 1.584.147,99
Stato avanzamento percentuale: 18,00
Data effettiva inizio lavori: 15/09/2003
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/01/2014
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: si è proceduto a sospensioni e riprese parziali per problemi di di finanziamento e indisponibilità dei locali.
collaudo statico e tecnico-amministrativo da effettuarsi a fine lavori

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 1267
Note: la prima sospensione è dovuta alla mancata copertura finanziaria del finanziamento Cipe
si è ancora in ripresa parziale dei lavori

Varianti:

Numero totale: 5
Giorni proroga totali: 385
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: motivi: art. 132 c.1 lett.a,b,c.D.lgs. 163/2006
Maggiori opere di consolidamento strutturale in copertura, adeguamento impiantistico a normativa sopravvenuta
Importo: 8.517.119,75
Importo oneri sicurezza: 286.945,61
Somme a disposizione: 1.488.665,04
Totale: 10.292.730,40
Note: totale: € 10.534.730,41 comprese somme disp. €1.488.665,04 oneri prog. € 242.000,00. L'intervento è articolato in tre stralci: 1° stralcio € 454.937,07 finanziamento cap. 7340; 2° stralcio € 7.380.340,00 finanziamento Cipe ed Oneri finanziari € 4.018.160,00; 3° stralcio € 4.018.160,00 finanziamento cap. 7340.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

La prog. è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato - Oneri progettazione € 167.121,37 non soggetti a ribasso. La Conferenza di servizi non è stata necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 9.066.513,93
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 192.121,37
Importo di aggiudicazione: 167.121,37
Nome aggiudicatario: E.Ciotola Spa
Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data inizio: 09/11/2005
Data fine: 24/11/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 730 giorni
Data bando:
CIG/CUI: 12561320EB
Data aggiudicazione: 11/12/2003
Tipo aggiudicatario: Impresa singola

Nome aggiudicatario:	E.CIOTOLA S.P.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	04808921003
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	8.885.183,65
Importo oneri per la sicurezza:	181.330,28
Importo complessivo a base di gara:	9.066.513,93
Importo aggiudicazione:	7.980.398,57
Somme a disposizione:	1.201.606,43
Totale:	9.182.005,00
% Ribasso di aggiudicazione:	6,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	totale complessivo del Q.E. € 9.182.005,00 inclusa la progettazione € 167.121,37 . Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle Risorse Cipe. E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 163/2006 come da decreto N. USOV/4026 del 27/07/2001

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	1.253.209,93
Stato avanzamento percentuale:	9,00
Data effettiva inizio lavori:	23/06/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/01/2014
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO IN CORSO

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	1
Totale giorni sospensione:	
Note:	I LAVORI SONO STATI SOSPESI IL 20/10/2009 - RIPRESA PARZIALE IN DATA 9/11/2009 SIAMO ANCORA IN RIPRESA PARZIALE PER INDISPONIBILITA' LOCALI

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	370

Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	MOTIVI: ART. 132 C. 1 LETT. a,b,c- MAGGIORI OPERE DI CONSOLIDAMENTO AI PIANI E POTENZIAMENTO STRATEGICO DELLE STRUTTURE.
Importo:	12.782.985,24
Importo oneri sicurezza:	313.680,00
Somme a disposizione:	2.294.985,61
Totale:	15.391.650,85
Note:	TOTALE Q.E. € 15.683.266,24 COMPRESA LA PROG. € 291.615,39 E SOMME DISP. € 2.294.985,61. E' STATO EFFETTUATO UN RIBASSO ULTERIORE.L'intervento è articolato in due stralci: 1° stralcio € 9.182.005,00 con finanziamento Cipe ed oneri finanziari 4.999.070,00 , 2° stralcio € 6.501.261,24 finanziamento F.di ordinari. (manca finanziamento 2° stralcio).

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	
Previsione al 30/04/2011	2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	La progettazione esecutiva è stato onere dell'appaltatore non quantificato. La conferenza di servizi non si è resa necessaria.
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	Tecnimont S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	09589391003
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
--------------------------------	---

Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	30 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	1935693863
Data aggiudicazione:	10/08/2001
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Tecnimont S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	09589391003
Data contratto:	08/08/2002
Quadro economico:	
Importo a base gara:	14.046.476,87
Importo oneri per la sicurezza:	286.662,79
Importo complessivo a base di gara:	14.333.139,66
Importo aggiudicazione:	13.057.719,56
Somme a disposizione:	2.435.100,06
Totale:	15.492.819,62
% Ribasso di aggiudicazione:	9,08
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'esatto totale del quadro economico è di €. 15.492.819,62. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	19.654.184,28
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	04/11/2002
Data effettiva fine lavori:	14/03/2006
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/02/2009
Data collaudo tecnico-amministrativo:	20/07/2009
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	2
-----------------------	---

Totale giorni sospensione: 74
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 75
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e c.3 del D.Leg. 163/2006
Importo: 18.867.700,45
Importo oneri sicurezza: 786.662,79
Somme a disposizione: 3.335.280,87
Totale: 22.989.644,11
Note: Il totale complessivo del 2° progetto di variante è di €. 22.989.465,15 comprese le somme a disposizione.
Nel progetto generale sono stati poi individuati 2 stralci funzionali.
Il 1° finanziato con fondi del Cap. 7341 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Telecomunicazioni di €. 10.095.615,15 e un 2° stralcio da finanziare con fondi CIPE di €. 12.893.850,00 (+ €. 7.019.965,00 di oneri finanziari per un totale di €. 19.913.850,00).

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2006

Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: Sì
Importo lavori: 24.995.442,28
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 505.164,00
Importo di aggiudicazione: 439.273,02
Nome aggiudicatario: ATI C.C.C. Consorzio Cooperative di Costruzioni Soc. Coop.
Codice fiscale aggiudicatario: 00281620377
Data inizio: 07/10/2007
Data fine: 07/12/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	36 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	0911924F79
Data aggiudicazione:	11/12/2002
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI C.C.C. Consorzio Cooperative di Costruzioni Soc. Coop.
Codice fiscale aggiudicatario:	00281620377
Data contratto:	04/06/2003
Quadro economico:	
Importo a base gara:	24.995.442,28
Importo oneri per la sicurezza:	499.908,85
Importo complessivo a base di gara:	25.495.351,13
Importo aggiudicazione:	22.392.769,98
Somme a disposizione:	5.379.597,76
Totale:	27.772.367,74
% Ribasso di aggiudicazione:	14,17
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

Il totale esatto del quadro economico è di €. 27.772.367,74.
E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da Decreto Dec.15/D.P./2001 del 5.3.2001.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	04/06/2011
Stato avanzamento importo:	12.773.836,02
Stato avanzamento percentuale:	72,10
Data effettiva inizio lavori:	04/06/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	04/07/2011
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	La consegna dei lavori si intende parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso. I collaudi statico e tecnico-amministrativo sono in corso d'opera.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

2

Giorni proroga totali:

0

Motivi:

Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

Art. 132 c. 3 D.Lgs. 163/2006

Importo:

22.592.452,32

Importo oneri sicurezza:

499.908,85

Somme a disposizione:

4.543.963,24

Totale:

27.636.324,41

Note:

Il totale è di €. 27.636.324,41 così finanziato:

€. 5.929.444,41 finanziato con fondi Corte dei Conti e €. 21.706.880,00 + €. 11.818.120,00 per oneri finanziari per un totale di €. 33.525.000,00 finanziato con fondi CIPE.

La percentuale relativa allo stato di avanzamento lavori del 72,10%, è da riferirsi sui lavori finanziati con fondi Cipe €. 21.706.880,00 di cui 17.718.025,40 per lavori e 3.988.854,60 per somme a disposizione.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

2011

Previsione al 30/04/2011

2011

Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: In corso

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 21.743.938,44

Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	194.446,11
Nome aggiudicatario:	Architetti Associati 5+1
Codice fiscale aggiudicatario:	03498190101
Data inizio:	14/07/2003
Data fine:	04/12/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	10 mesi
Lavori:	730 giorni
Data bando:	15/12/2003
CIG/CUI:	12899379AD
Data aggiudicazione:	22/12/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Società Appalti Costruzioni S.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	01391020581
Data contratto:	12/01/2006

Quadro economico:

Importo a base gara:	20.988.907,92
Importo oneri per la sicurezza:	1.089.506,07
Importo complessivo a base di gara:	22.078.413,99
Importo aggiudicazione:	20.405.404,97
Somme a disposizione:	13.002.266,52
Totale:	33.407.671,49
% Ribasso di aggiudicazione:	8,10
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: Nelle somme a disposizione del quadro economico è prevista la somma di € 8.370.296,24 per opere e impianti speciali da definire in corso d'opera, da appaltare con successivo esperimento di gara e con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'intervento è stato articolato secondo le diverse fonti di finanziamento, in tre distinte fasi sempre funzionali di cui la seconda di € 1.214.167,23 finanziata dal Ministero dell'Interno è stata già interamente eseguita, mentre la terza fase rimane sospesa in attesa di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	05/11/2008
Data presunta fine lavori:	31/12/2012
Stato avanzamento importo:	2.149.101,78
Stato avanzamento percentuale:	12,00
Data effettiva inizio lavori:	05/11/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/12/2012

Tempi realizzazione: In ritardo - Nella realizzazione dell'intervento è previsto procedere con consegne parziali dei corpi fabbricati interessati, pertanto i tempi di esecuzione decorrono dalla consegna dell'ultimo immobile all'impresa esecutrice.

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 284
Note: La sospensione si è resa necessaria per la redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 25
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 21.187.506,30
Importo oneri sicurezza: 1.180.961,60
Somme a disposizione: 3.538.517,81
Totale: 25.906.985,71
Note: L'importo totale della variante compreso le somme a disposizione ammonta ad € 25.726.985,71 compreso le opere della terza fase da finanziare con esercizi futuri.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2012

P.S. Fiumicino Polaria – Caserma lavarone

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Selezione diretta della stazione appaltante da curriculum già in atti.
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	5.701.939,68
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	188.575,81
Nome aggiudicatario:	Ing. Marco Menegotto
Codice fiscale aggiudicatario:	MNGMRC40A31H501X
Data inizio:	23/06/1998
Data fine:	17/06/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	490 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	12916352EB
Data aggiudicazione:	22/12/1999
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	DI.COS. S.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	02692400589
Data contratto:	02/08/2001
Quadro economico:	
Importo a base gara:	5.479.197,57
Importo oneri per la sicurezza:	222.742,11
Importo complessivo a base di gara:	5.701.939,68
Importo aggiudicazione:	5.241.687,08
Somme a disposizione:	1.580.708,56
Totale:	6.822.395,64
% Ribasso di aggiudicazione:	8,40
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'intervento è stato articolato secondo le diverse fonti di finanziamento, in quattro distinte fasi sempre funzionali di cui quella di € 2.582.284,20 finanziata dal Ministero dell'Interno è stata già interamente eseguita.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	28/09/2009

Data presunta fine lavori: 06/02/2011
Stato avanzamento importo: 4.688.499,77
Stato avanzamento percentuale: 85,10
Data effettiva inizio lavori: 28/09/2009
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 14/06/2011
Tempi realizzazione: In ritardo - Sospensione a seguito di redazione di perizia di variante senza aumento di spesa e richiesta proroga di 30 giorni da parte dell'Impresa esecutrice per avversità condizioni atmosferiche

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 98
Note: E' stata concessa una proroga di 30 giorni a seguito di richiesta dell'Impresa per avversità atmosferiche

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 30
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 5.387.446,37
Importo oneri sicurezza: 193.349,29
Somme a disposizione: 1.240.449,54
Totale: 6.821.245,20
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2011

Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	APPALTO INTEGRATO
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	11.196.092,60
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	10.860.209,82
Importo di aggiudicazione:	10.471.690,73
Nome aggiudicatario:	LUPO ROCCO SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	01596890598
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	36 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	28/12/2006
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	LUPO ROCCO SPA
Codice fiscale aggiudicatario:	01596890598
Data contratto:	05/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	10.860.209,82
Importo oneri per la sicurezza:	335.882,78
Importo complessivo a base di gara:	11.196.092,60
Importo aggiudicazione:	10.491.690,73
Somme a disposizione:	1.879.314,27
Totale:	12.371.005,00
% Ribasso di aggiudicazione:	6,85
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	RATE QUINDICENNALI DA EURO 1.271.715,00

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

Ministero Politiche Agricole

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: progetto preliminare conferito in data 02/04/2002 all'Arch. Maria Cristina Accame per l'importo di euro 40.748,03
progetto definitivo conferito in data 23/06/2003 all'Arch. Maria Cristina Accame per l'importo di euro 544.043,03

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori:
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: maria cristina accame
Codice fiscale aggiudicatario: ccmocr64e55h501v
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI: 1282241abc
Data aggiudicazione: 20/05/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ati società costr.ni civili - cos.ed.it - giambattista celletti -tecno cos - mar costruzioni - capogruppo mandataria società costr.ni civili
Codice fiscale aggiudicatario: 03086110586
Data contratto: 01/10/2003
Quadro economico:
Importo a base gara: 17.840.232,31
Importo oneri per la sicurezza: 374.644,79
Importo complessivo a base di gara: 18.214.877,10
Importo aggiudicazione: 17.017.615,54
Somme a disposizione: 5.573.757,60
Totale: 22.591.373,14
% Ribasso di aggiudicazione: 8,12
% Rialzo di aggiudicazione: 0,00
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	16/06/2004
Data presunta fine lavori:	30/09/2011
Stato avanzamento importo:	15.264.322,94
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	16/06/2004
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/09/2011
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	collaudo in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	10
Totale giorni sospensione:	861
Note:	in funzione delle aree e dei piani dell'edificio che sono stati liberati da cose e persone e pertanto consegnate libere dall'Amministrazione Usuarie sono stati redatti Verbali di sospensione e di ripresa lavori in funzione della fasizzazione concertata.

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	varianti che si sono rese necessarie da richieste dell'Amministrazione Usuarie per quanto concerne modifiche funzionali e distributive, implementazioni impiantistiche e nuovi lavori di piccola entità non previsti nel progetto esecutivo originario
Importo:	20.668.778,46
Importo oneri sicurezza:	480.316,86
Somme a disposizione:	7.211.458,70
Totale:	28.360.554,02
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	

Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	14.342.256,51
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	253.000,00
Importo di aggiudicazione:	220.000,00
Nome aggiudicatario:	ATI Donati S.p.A. - Picalarga S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03262690583
Data inizio:	19/07/2005
Data fine:	19/09/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	365 giorni
Data bando:	09/02/2005
CIG/CUI:	1032726872
Data aggiudicazione:	22/02/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI Donati S.p.A. - Picalarga S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03262690583
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	14.342.256,51
Importo oneri per la sicurezza:	754.832,96
Importo complessivo a base di gara:	15.097.089,47
Importo aggiudicazione:	13.953.140,88
Somme a disposizione:	1.937.421,17
Totale:	15.890.562,05

% Ribasso di aggiudicazione: 9,51

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

Il totale esatto del quadro economico è di €. 15.890.562,05.

Il finanziamento è così suddiviso:

€. 15.042.865,00 + €. 8.189.960 oneri finanziari= €. 23.232.825,00

finanziamento CIPE

€. 874.697,05

finanziamento Ministero Infrastrutture e Trasporti cap.7340

Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del CIPE avvenuta con Decreto Interministeriale n. 15101 del 20.11.2007.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo: 14.575.675,44

Stato avanzamento percentuale: 100,00

Data effettiva inizio lavori: 18/11/2008

Data effettiva fine lavori: 31/05/2011

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

I collaudi statico e amministrativo sono in corso d'opera.

La consegna dei lavori è parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale: 1

Giorni proroga totali: 0

Motivi:

Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

art. 132 c. 1 lett. a), c) e c. 3) D. Legs. 163/2006

Importo: 13.820.842,48

Importo oneri sicurezza: 754.832,96

Somme a disposizione: 1.846.830,90

Totale: 16.422.506,34

Note:

Il totale dell'opera comprensivo di importo lavori + somme a disposizione è di €. 16.422.506,34.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2011

Camera dei Deputati – Complesso del Seminario

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

Il finanziamento generale è di €. 5.400.035,94 così suddiviso:
€. 4.276.249,99 (1° lotto) + €. 2.328.175,00 oneri finanziari = €. 6.604.425,00
finanziamento CIPE
€. 1.123.785,95 (2° lotto)
finanziamento cap.7340 M.I.T.
La progettazione esecutiva è stato onere non quantificabile.
La conferenza dei servizi non si è resa necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori:

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: Renato TITO

Codice fiscale aggiudicatario: TTIRNT48B09H501K

Data inizio: 02/04/2002

Data fine: 15/09/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura: Procedura negoziata

Sistema di realizzazione: Appalto integrato

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione: 60 giorni

Lavori: 700 giorni

Data bando: 09/08/2004

CIG/CUI: 09750046BF

Data aggiudicazione: 14/09/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: COSPRA Costruzioni Progettazioni Appalti S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 03918760582
Data contratto: 05/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.916.422,89
Importo oneri per la sicurezza: 57.819,83
Importo complessivo a base di gara: 4.974.242,72
Importo aggiudicazione: 4.522.915,10
Somme a disposizione: 877.120,84
Totale: 5.400.035,94
% Ribasso di aggiudicazione: 9,18
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 5.400.035,94.
Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del CIPE avvenuta con Decreto Interministeriale n. 15101 del 20.11.2007. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da nota n. 0002991/GEN/PRV del 21.12.1999.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 27/12/2012
Stato avanzamento importo: 3.029.076,93
Stato avanzamento percentuale: 84,74
Data effettiva inizio lavori: 27/05/2009
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Le consegne sono parziali come contrattualmente previsto in quanto trattasi di immobili in uso. Pertanto non decorrono i tempi di ultimazione lavori. La percentuale relativa allo stato di avanzamento lavori dell'84,74%, è da riferirsi ai lavori finanziati con fondi Cipe del 1° lotto di €. 4.276.249,99 di cui €. 3.574.485,63 per lavori e €. 701.764,36 per somme a disposizione.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2012

Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: approvato progetto esecutivo generale dal quale è stato (per rimanere nei limiti del contratto) un primo stralcio (che lascia rifinito al rustico l'ultimo piano).

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 7.734.493,95
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 178.600,00
Importo di aggiudicazione: 178.600,00
Nome aggiudicatario: Lattanzi s.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 05363631002
Data inizio: 26/12/2007
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato

Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	450 giorni
Data bando:	07/05/2005
CIG/CUI:	1138943D7B
Data aggiudicazione:	21/11/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Lattanzi s.r.l. + C.P.C. s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	05363631002
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	7.588.073,95
Importo oneri per la sicurezza:	146.420,00
Importo complessivo a base di gara:	7.913.093,95
Importo aggiudicazione:	6.608.656,29
Somme a disposizione:	1.175.451,40
Totale:	7.784.107,69
% Ribasso di aggiudicazione:	19,68
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'ATI si è sciolta rimanendo come esecutore dei lavori lattanzi s.r.l.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	14/07/2011
Stato avanzamento importo:	5.521.143,74
Stato avanzamento percentuale:	86,00
Data effettiva inizio lavori:	04/02/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	In ritardo - per approvazione variante vigili del fuoco
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in corso

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	10
Motivi:	Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	la variante è stata redatta sulla base delle prescrizioni dei vigili del fuoco e di richieste dell'ente usuario
Importo:	188.895,29
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	188.895,29
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2011

Palazzo Venezia

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	appalto integrato segretato
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	4.436.835,34
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	166.206,00
Importo di aggiudicazione:	106.206,00
Nome aggiudicatario:	MBF S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	00343100517
Data inizio:	24/07/2008
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	18 mesi
Data bando:	11/08/2005
CIG/CUI:	114042654D
Data aggiudicazione:	11/08/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	MBF S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00343100517
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	5.045.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	100.900,00
Importo complessivo a base di gara:	5.211.206,00
Importo aggiudicazione:	5.211.206,00
Somme a disposizione:	1.411.109,72
Totale:	6.622.315,72
% Ribasso di aggiudicazione:	10,26
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	finanziamento CIPE con rate quindicinali

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	27/07/2009
Data presunta fine lavori:	26/01/2012
Stato avanzamento importo:	5.443.370,22
Stato avanzamento percentuale:	73,87
Data effettiva inizio lavori:	27/07/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	26/01/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in corso

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	11
Note:	respinte e riproposte

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	180

Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	per ritrovamenti archeologici si è reso necessario rimodulare il vano tecnico ubicato nel cortile
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	per ritrovamenti archeologici si è reso necessario rimodulare il vano tecnico ubicato nel cortile

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2012

Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	La progettazione definitiva è interna all'Amministrazione con consulenze di professionisti esterni.

Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	4.338.264,34
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	243.838,00
Importo di aggiudicazione:	212.033,00
Nome aggiudicatario:	Lucio BARBERA
Codice fiscale aggiudicatario:	BRBLCU37C28H501J
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo

Tempi di esecuzione:
Progettazione: 120 giorni
Lavori: 12 mesi
Data bando:
CIG/CUI: 1012301136
Data aggiudicazione: 11/08/2005
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Lattanzi S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 05363631002
Data contratto: 06/07/2010

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.338.264,34
Importo oneri per la sicurezza: 161.735,66
Importo complessivo a base di gara: 4.500.000,00
Importo aggiudicazione: 4.252.761,98
Somme a disposizione: 1.225.912,46
Totale: 5.478.674,44
% Ribasso di aggiudicazione: 9,39
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 5.478.674,45.
Il progetto è così finanziato:
€. 3.473.100,00 + €. 1.890.000,00 oneri finanziari = €. 5.364.000,00
finanziato con fondi CIPE con Decreto Interministeriale n. 15101 del
20.11.2007
€. 2.005.574,45 finanziato cap. 7341 prog. trien. 2009/2011 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 21/09/2012
Stato avanzamento importo: 108.413,16
Stato avanzamento percentuale: 2,86
Data effettiva inizio lavori: 21/10/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: La consegna si intende parziale per svolgere attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2012

Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: la progettazione è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato - Oneri progettazione € 141.000,00 non soggetto al ribasso .

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 7.677.034,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 162.150,00
Importo di aggiudicazione: 141.000,00
Nome aggiudicatario: SO.CO.MI. Srl
Codice fiscale aggiudicatario: 05451991003
Data inizio: 02/04/2009
Data fine: 04/05/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna

Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	180 giorni
Lavori:	480 giorni
Data bando:	22/04/2005
CIG/CUI:	12542743A5
Data aggiudicazione:	10/05/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	SO.CO.MI S.R.L. capogruppo , Baglioni S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	05451991003
Data contratto:	04/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	7.485.108,15
Importo oneri per la sicurezza:	191.925,85
Importo complessivo a base di gara:	7.677.034,00
Importo aggiudicazione:	7.164.584,06
Somme a disposizione:	2.119.066,55
Totale:	9.283.650,61
% Ribasso di aggiudicazione:	8,73
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note:

il totale del Q.E. è € 9.283.650,61 compresa la progettazione di € 141.000,00.

E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 163/2006 come risulta dalla sedua del CTA (Comitato tecnico amministrativo) del 17/03/2005 con voto n. 250. il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del Cipe avvenuta con decreto int. n. 15101 del 20.11.2007.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	4.567.519,06
Stato avanzamento percentuale:	61,00
Data effettiva inizio lavori:	31/08/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

si è in sospensione parziale.
è iniziato solo il Lotto Cipe , il Lotto di completamento è da iniziare in attesa di finanziamento
collaudo statico e tecn.-amm.vo sono in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note: sospensione parziale dal 14/12/2009, si è in attesa di autorizzazione di ripresa

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 180
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: motivi: art. 132 c.1 lett. a,b,c .D.Lgs.163/2006.
giorni di proroga 180 sono per il lotto di completamento per maggiori e variati lavori.
Maggiori attività di consolidamento strutturale e sostituzione completa solai esistenti.maggiori attività richieste dalla Soprintendenza BB.AA.AA. -
Importo: 12.551.926,99
Importo oneri sicurezza: 281.456,16
Somme a disposizione: 1.917.630,43
Totale: 14.751.013,58
Note: totale complessivo € 14.987.787,79 comprese le somme a disposizioni € 1.917.630,43 e la Progettazione € 236.774,21.
E' stato effettuato un ulteriore ribasso del 5% sull'importo di € 3.484.872,47
.L'intervento è articolato in due lotti: 1° lotto finanziato con fondi CIPE € 8.682.750,00 - gli oneri finanziari sono € 4.727.250,00.
; 2° lotto finanziato con fondi Cap. 7340 € 6.196.490,93,

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 Lavori sospesi

Museo Storico delle Comunicazioni

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Con la formula dell'appalto integrato è stato appaltata all'impresa sia la progettazione esecutiva già redatta e l'esecuzione dei lavori.
Progettazione esecutiva
CIPE: No

Importo lavori:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione: Appalto integrato

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Fase progettuale a base di gara: Definitivo

Tempi di esecuzione:

Progettazione: 60 giorni

Lavori: 180 giorni

Data bando: 05/04/2005

CIG/CUI: 130084426D

Data aggiudicazione: 10/05/2005

Tipo aggiudicatario: Impresa singola

Nome aggiudicatario: SESA2 Società Edile Stradale Appalti

Codice fiscale aggiudicatario: 0887520583

Data contratto: 06/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.386.707,99

Importo oneri per la sicurezza: 131.400,00

Importo complessivo a base di gara: 4.628.108,23

Importo aggiudicazione: 4.088.104,48

Somme a disposizione: 996.986,12

Totale: 5.085.090,60

% Ribasso di aggiudicazione: 12,31

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Fra il progetto definitivo ed esecutivo è stata effettuata una variante con rilocalizzazione dell'opera: per l'avvio dei lavori si è in attesa dell'approvazione da parte del CIPE

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

Previsione al 30/04/2011

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: € 50.772,09 sono i costi della progettazione.
La conferenza di servizi non si è resa necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE: Sì

Importo lavori: 2.506.662,42

Servizio: Esterno

Importo a base gara: 58.388,00

Importo di aggiudicazione: 50.772,09

Nome aggiudicatario: BAGLIONI S.r.l.

Codice fiscale aggiudicatario: 07444580588

Data inizio: 14/08/2007

Data fine: 14/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 450 giorni
Data bando: 26/07/2004
CIG/CUI: 13047612D6
Data aggiudicazione: 30/07/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: BAGLIONI S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 07444580588
Data contratto: 12/07/2005

Quadro economico:

Importo a base gara: 2.506.662,42
Importo oneri per la sicurezza: 66.616,36
Importo complessivo a base di gara: 2.573.278,78
Importo aggiudicazione: 2.426.776,54
Somme a disposizione: 371.315,06
Totale: 2.798.091,60
% Ribasso di aggiudicazione: 7,87
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 2.798.091,60.
Finanziato con fondi CIPE con Delibera n. 102 del 29.3.2006.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da Decreto n. 1071 del 5.12.1995 e Decreto n. 570 del 6.10.2003.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 2.426.776,54
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 31/07/2008
Data effettiva fine lavori: 14/09/2010
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Il collaudo statico in fase di rilascio.
Il collaudo tecnico amministrativo è in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 325
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2010

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: La conferenza di servizi non si è resa necessaria.
Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 9.034.849,01
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 152.684,00
Importo di aggiudicazione: 132.769,00
Nome aggiudicatario: EUGENIO CIOTOLA S.p.A

Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data inizio: 14/08/2007
Data fine: 14/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 35 mesi
Data bando: 15/07/2004
CIG/CUI: 1280769C00
Data aggiudicazione: 26/07/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: EUGENIO CIOTOLA S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data contratto: 16/11/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 9.034.849,01
Importo oneri per la sicurezza: 265.583,00
Importo complessivo a base di gara: 9.300.432,01
Importo aggiudicazione: 8.339.984,28
Somme a disposizione: 1.104.604,12
Totale: 9.444.588,40
% Ribasso di aggiudicazione: 12,10
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 9.444.588,40.
Finanziato con fondi CIPE con Delibera CIPE n. 102 del 29.3.2006.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da Decreto n. 1071 del 5.12.1995 e Decreto n. 570 del 6.10.2003.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 4.194.563,81
Stato avanzamento percentuale: 50,00
Data effettiva inizio lavori: 29/09/2008
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: I verbali delle consegne sono parziali come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note: I lavori sono stati sospesi il 30.9.2010 e al momento non sono ancora ripresi in attesa disponibilità locali. Previsto in contratto.

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 Lavori sospesi

Senato della Repubblica – Complesso della Minerva

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: la prog. è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato. Oneri prog. € 244.085,00 non sogg. al ribasso.
la conferenza di servizi non è stata necessaria

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori:	14.726.018,87
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	280.698,00
Importo di aggiudicazione:	244.085,00
Nome aggiudicatario:	Redim 2002 srl
Codice fiscale aggiudicatario:	07166381009
Data inizio:	20/12/2004
Data fine:	04/02/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	680 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	11/11/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	REDIM 2002 S.r.l. capogruppo con Tecnicos S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	07166381009
Data contratto:	23/12/2004

Quadro economico:

Importo a base gara:	14.726.018,87
Importo oneri per la sicurezza:	300.250,00
Importo complessivo a base di gara:	15.026.268,87
Importo aggiudicazione:	14.364.703,71
Somme a disposizione:	3.400.996,36
Totale:	17.765.700,07
% Ribasso di aggiudicazione:	6,15
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: il totale è € 17.765.700,07 compresi gli oneri della progettazione € 244.085,00.
 E' STATA APPLICATA UNA PROCEDURA CHE NON PREVEDE INDIZIONE DI GARA, IN QUANTO RICORRONO QUELLE PARTICOLARI MISURE DI SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 163/2006 COME DA DECRETO P.S.R. 12/12/1992;

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	16.600.341,82
Stato avanzamento percentuale:	81,00
Data effettiva inizio lavori:	07/01/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/12/2011

Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: collaudo statico non applicabile -collaudo tecnico amministrativo da effettuare ad ultimazione lavori-

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 121
Note: SI E' IN REGIME DI SOSPENSIONE PARZIALE-
la consegna dei lavori è parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 0
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: MOTIVI DELLA PROROGA : ART. 132 C. 1 LETT. C e ART. 132 c.3. D.Lgs. 163/2006
Importo: 19.774.195,00
Importo oneri sicurezza: 430.000,00
Somme a disposizione: 3.548.228,07
Totale: 23.752.423,07
Note: totale € 23.996.508,07 compresi gli oneri della progettazione € 244.085,00 l'intervento e' articolato in 3 lotti funzionali 1° lotto € 5.600.000 finanziamento cap.7340, 2° lotto € 14.066.057 finanziamento Cipe con oneri finanziari € 7.658.143,00, 3° lotto € 4.330.451,07 finanziamento Cap. 7340-maggior importo dall'aggiudicazione PER RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO GUIDETTI , MAGGIORE ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE- e' stato predisposto progetto esecutivo in variante.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 2011

Camera dei Deputati – Vicolo Valdina

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	17.136.744,37+ (somme per i lavori) 665.870,48+ (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 399.522,29= (oneri progettazione esecutiva) 18.202.137,14 TOTALE complessivo dei lavori in appalto

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	17.136.744,37
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	459.450,00
Importo di aggiudicazione:	399.522,29
Nome aggiudicatario:	C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	03515570483
Data inizio:	24/01/2007
Data fine:	24/02/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	30 giorni
Lavori:	1080 giorni
Data bando:	13/12/2006
CIG/CUI:	091569034A
Data aggiudicazione:	28/12/2006
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	03515570483
Data contratto:	05/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	17.136.744,37
Importo oneri per la sicurezza:	665.870,48
Importo complessivo a base di gara:	17.802.614,85
Importo aggiudicazione:	17.010.962,04
Somme a disposizione:	3.114.278,97
Totale:	20.125.241,01
% Ribasso di aggiudicazione:	6,95
% Rialzo di aggiudicazione:	0,00

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 20.125.241,01.
Il finanziamento è così suddiviso.
€. 18.125.241,01 + €. 9.868.134,00 oneri finanziari = €. 27.993.375,00
finanziamento CIPE
€. 2.000.000,00
fondi cap. 7340 Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del CIPE avvenuta con Decreto Interministeriale n. 15101 del 20.11.2007. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da nota n. 25372 del 19.9.2002.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	07/12/2013
Stato avanzamento importo:	1.911.022,91
Stato avanzamento percentuale:	12,86
Data effettiva inizio lavori:	07/04/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	

Note: Il collaudo statico è in corso d'opera.
La consegna dei lavori si intende parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	0
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	Art. 132 c 1 lett. b) e c. 3 D.Lgs. 163/2006
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	Il quadro economico è rimasto invariato rispetto al generale.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	
Previsione al 30/04/2011	2013

Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	L'intervento è stato inserito nel programma CIPE con deliberazioni n. 109 del 20.12.2004 e n. 182 del 29.3.2006. €. 4.536.731,00 + €. 2.469.994,00 oneri finanziari = €. 7.006.725,00

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	4.010.203,21
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	40.924,00
Importo di aggiudicazione:	35.586,00
Nome aggiudicatario:	S.I.T.E.R.S. S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03672470584
Data inizio:	07/10/2008
Data fine:	19/02/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	120 giorni
Lavori:	365 giorni
Data bando:	22/04/2005
CIG/CUI:	26903280E6
Data aggiudicazione:	10/05/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	S.I.T.E.R.S. S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03672470584
Data contratto:	06/11/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.010.203,21
Importo oneri per la sicurezza:	160.408,13
Importo complessivo a base di gara:	4.206.197,34
Importo aggiudicazione:	3.945.534,13
Somme a disposizione:	591.196,87
Totale:	4.536.731,00
% Ribasso di aggiudicazione:	6,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	Il totale esatto del quadro economico è di €. 4.536.731,00. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da nota n. 25372 del 19.9.2002.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	0,00
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	Per ritrovamenti archeologici il progetto con la realizzazione del corridoio interrato comporta un incremento di spesa allo stato attuale non disponibile pertanto è stato predisposto il prog. esecutivo conforme al definitivo dove sono stati previsti tutti i lavori di bonifica degli impianti tecnologici interrati dei due edifici. Tale bonifica era già prevista nel prog. definitivo ed è propedeutica all'esecuzione del futuro collegamento interrato. La consegna dei lavori avverrà dopo il parere del CIPE sulla variazione del titolo.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

Previsione al 30/04/2011

Ministero Beni Culturali – Collegio Romano

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 300 giorni
Data bando: 05/05/2005
CIG/CUI: D 56 D 04 00012 000 6
Data aggiudicazione: 13/05/2005
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: S.C.R. Società Costruzioni Riunite s.r.l. e Tecno Group Impianti s.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 05457950581
Data contratto: 06/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.418.745,00
Importo oneri per la sicurezza: 232.565,00
Importo complessivo a base di gara: 4.744.874,33
Importo aggiudicazione: 4.399.416,84
Somme a disposizione: 1.141.251,36
Totale: 5.540.668,20
% Ribasso di aggiudicazione: 7,82
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Il contratto 1209 del 6/12/2007 è stato risolto con Atto n. 222 di rep. datato 13/04/2010. L'Atto di risoluzione è stato approvato con D.P. 18479 del 3/05/2010 registrato alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009


Previsione al 30/04/2010

Previsione al 30/04/2011

Contratto rescisso

PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)

SCHEDA N. 181

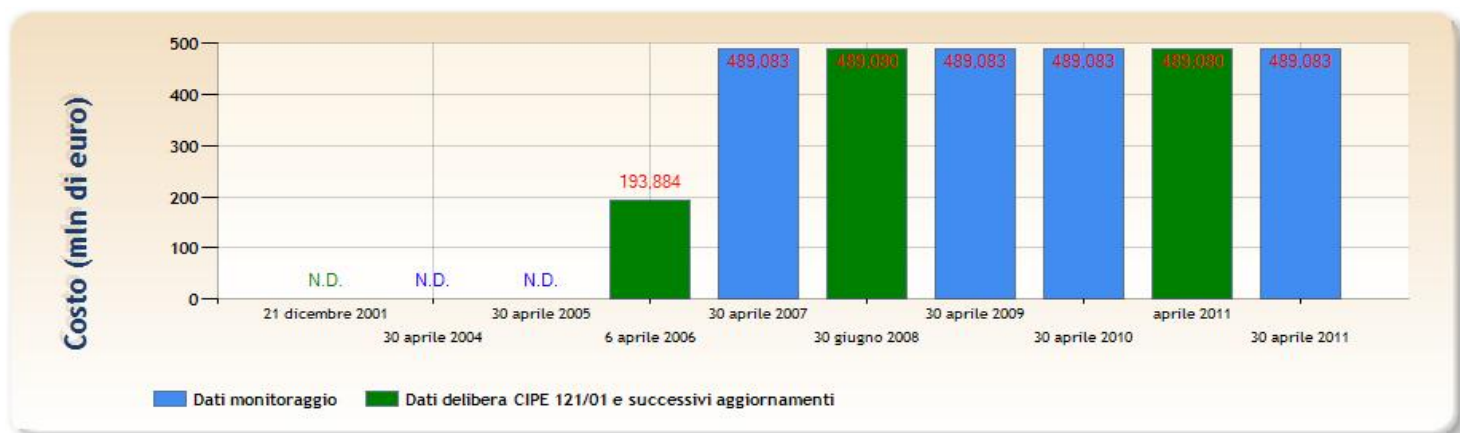

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia scolastica

Più Comuni e Province

STATO DI ATTUAZIONE

Stato di attuazione non classificabile

DELIBERE CIPE

102/2004

157/2005

143/2006

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

Il "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" prevede interventi di adeguamento strutturale di edifici in zone a rischio sismico: è articolato in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.593 interventi

DATI STORICI

2002

La legge n. 289 (finanziaria 2003) prevede che, nell'ambito della legge obiettivo, il MIT, di concerto con il MIUR, predisponga un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" nelle zone a rischio sismico (art. 80, comma 21).

2003

Con decreto del 27 maggio il MIT istituisce una Commissione tecnica scientifica di supporto tecnico.

Il MIT, con nota 23 dicembre, invita le Regioni (eccetto Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta) a segnalare gli edifici scolastici da sottoporre ad adeguamento strutturale in ordine di priorità e entro un limite di importo complessivo assegnato alle Regioni in proporzione al numero di edifici nelle zone di 1^a e 2^a categoria sismica.

L'art 3, comma 91, della legge n. 350 (finanziaria 2004) destina al Piano straordinario un importo non inferiore al 10% delle risorse ex art. 13 legge n. 166/2002, disponibili al 1° gennaio 2004; l'art. 4, comma 176, autorizza invece ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006.

2004

Il MIT, con nota del 24 maggio, trasmette al CIPE lo schema del Piano ed il 1° programma stralcio. Il Piano non riporta l'elenco degli interventi da effettuare ma individua il percorso per programmi pluriennali a base regionale, definendo le modalità di ripartizione tra le regioni sulla base del rischio "potenziale". Gli edifici realizzati in zona sismica prima del 1979 vengono definiti a "vulnerabilità sismica medio-alta" e, per gli aspetti igienici ed impiantistici, si individua un indicatore generale di "carenza" che comprende il rischio sismico e la sicurezza complessiva.

Il MIUR, con nota del 26 luglio, esprime il proprio concerto.

Il DPEF 2005-2008 inserisce l'"Edilizia scolastica" tra le nuove proposte, non presente nella delibera CIPE n. 121/2001.

Il Ministero dell'economia, con nota del 26 ottobre, quantifica le risorse accantonate per il Piano straordinario, specificando che il 10% dei limiti di impegno della legge n. 166/2002 e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004, ammonta a 45,3 Meuro.

L'11 novembre in sede di Conferenza Unificata, le Regioni chiedono che le modalità di attuazione degli interventi vengano ricondotte nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 23/1996 o che siano definite nella Conferenza con apposita "intesa", sollecitando di "essere riconosciute quali soggetti legittimati alla richiesta di erogazione dei mutui". L'UPI e l'ANCI chiedono l'inserimento di rappresentanti degli Enti locali negli organismi tecnico-politici che dovranno elaborare i successivi programmi; le Regioni Emilia, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto chiedono la rimodulazione della parte di programma stralcio di rispettiva competenza, nel limite delle risorse assegnate.

Il MIT, con nota dell'11 novembre, dichiara la disponibilità a individuare, con apposita Intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza Unificata, una soluzione per la corretta attuazione della "legge obiettivo" e le procedure di cui alla legge n. 23/1996.

Il CIPE, con delibera n. 102, quantifica in complessivi 43,9 Meuro le quote di limiti di impegno da riservare al Piano straordinario e approva il 1° programma stralcio, relativo a 738 edifici con le modifiche richieste dall'Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, per un costo di 193,9 Meuro in volume di investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di 17,3 Meuro. Il soggetto abilitato ad accendere i mutui viene individuato nel titolare del singolo intervento (Provincia o Comune). L'onere è imputato sulle quote di 1,9 Meuro e di 0,3 Meuro accantonate sul 2^a e 3^a limite di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte della quota di 18,5 Meuro accantonata sul 4^a limite di impegno.

Il CIPE invita i Ministri interessati a relazionare periodicamente sull'attuazione del Programma e a predisporre altro programma stralcio nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti con la residua quota di limiti di impegno, pari a 26,6 Meuro.

2005

La Conferenza unificata, il 13 ottobre, raggiunge l'intesa istituzionale sulle procedure di attuazione.

Il CIPE, con delibera n. 157, prevede che le "economie" realizzate nelle fasi procedurali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al suo completamento e fornisce indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari enti beneficiari.

2006

Il programma è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al 1° stralcio, al 30 giugno, la relazione del MIT indica l'attivazione di 60 interventi su 738 (8,13% di quelli finanziati) concentrati in 6 regioni per 11,3 Meuro (5,38% del totale finanziato). Le Regioni più attive sono la Calabria (40 interventi per 4,9 Meuro), la Sicilia (6 interventi per 2,9 Meuro) e le Marche (10 interventi per 2,2 Meuro). Le motivazioni del ritardo sono: la necessità di aggiornare i progetti proposti dagli enti attuatori ed il termine di 150 gg. per la loro redazione risultato insufficiente. Secondo il MIT sono da considerare ammissibili tempi che vanno da 255 gg. per i progetti coerenti fin dal primo esame, a 465 gg. per quelli che richiedono una nuova ristesura. Superata la soglia max dei 465 gg. è necessario verificare l'effettiva fattibilità dell'intervento.

La Commissione tecnica, il 21 luglio, dopo aver elaborato un criterio di ripartizione dei fondi disponibili tra le Regioni, prende atto che non tutte le Regioni hanno formulato proposte di programmazione e approva il 2° programma stralcio, accantonando le risorse di Lazio e Calabria. Accoglie inoltre le proposte di definanziamento avanzate da alcune Regioni per un ammontare - in volume di investimenti - di 10,5 Meuro e approva le proposte aggiuntive al 2° programma stralcio da finanziare con le risorse rese così disponibili.

Il MIT trasmette al CIPE la proposta del 2° programma stralcio, precisando che il MIUR avrebbe in seguito formalizzato il proprio concerto.

La Commissione, nella seduta del 17 ottobre, esamina le proposte delle Regioni Lazio e Calabria: il programma, quale risulta dalle integrazioni di Lazio e Calabria, ed al netto dei 20 interventi finanziati con le risorse revocate, riguarda 876 interventi per un costo complessivo di 300,6 Meuro. Vengono confermate, con limitate modifiche, le procedure attuative stabilite per il 1° programma stralcio.

Il MIUR comunica che la Regione Lazio ha apportato alcune rettifiche ed un'integrazione al piano di propria competenza.

La Conferenza Unificata, l'8 novembre, esprime parere favorevole sul 2° programma stralcio con riserva, da parte delle Regioni, di apportare eventuali correzioni e, nella seduta del 16 novembre, acquisisce le rettifiche di Veneto, Emilia R., Toscana e Marche.

Il CIPE, con delibera n. 143, approva il 2° programma stralcio, con 876 interventi ed un costo di 295,2 Meuro. L'onere viene imputato sulle quote di 3,3 Meuro e di 23,3 accantonati, rispettivamente, a valere sul 4° e sul 5° limite d'impegno (decorrenti dal 2005 e dal 2006) di cui all'art. 13 della legge 166/2002 (rifinanziato dalla finanziaria 2004). Con la stessa delibera il CIPE riprogramma le economie derivanti dal 1° programma stralcio: vengono definanziati (in tutto o in parte) 52 interventi per un importo di 14,9 Meuro (1,3 Meuro quale limite di impegno anno 2005) e riprogrammate le risorse che si rendono disponibili, 14,9 Meuro (1,3 Meuro quale limite di impegno anno 2005) per 32 interventi.

2008

L'art. 7-bis del decreto legge n. 137 destina al Piano straordinario un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziato per il PIS.

Il MIT, con nota del 26 settembre, riferisce sullo stato di attuazione del Piano al 30 giugno 2008: risultano attivati ca. il 70% degli interventi del 1° programma e il 17% di quelli del 2° programma.

Il CIPE, con delibera n. 114, dispone l'accantonamento di risorse per il Piano a valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del decreto legge n. 185, in particolare sul contributo di 60 Meuro decorrente dal 2009, la quota di 3 Meuro per 15 anni e una quota di 7,5 Meuro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 Meuro decorrente dal 2010. La definitiva assegnazione avverrà sulla base del 3° programma stralcio che il MIT, d'intesa con il MIUR, sottoporrà al CIPE entro

il 30 giugno 2009.

Il CIPE, con delibera n. 114, dispone l'accantonamento di risorse per il Piano straordinario a valere sullo stanziamento per la legge obiettivo di cui all'art. 21 del decreto legge n. 185/2008:

- una quota di 3 Meuro per 15 anni a valere sul contributo di 60 Meuro decorrente dal 2009;
- una quota di 7,5 Meuro per 15 anni, a valere sul contributo di 150 Meuro decorrente dal 2010.

La definitiva assegnazione delle quote avverrà sulla base del 3° programma stralcio.

2009

Il CIPE, con delibera n. 3, dispone l'assegnazione di 5 miliardi di euro a favore del Fondo infrastrutture, con una destinazione di 1 miliardo per la sicurezza delle scuole e di 200 Meuro per l'edilizia carceraria.

Il Programma è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

L'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 riserva all'Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008 ed autorizza la Regione a modificare il Piano annuale 2009 di edilizia scolastica.

Il MIT, con nota del 10 giugno, trasmette al CIPE i prospetti dei definanziamenti parziali e le riprogrammazioni, integrati con le indicazioni sulle annualità di riferimento.

Il CIPE, con delibera n. 47, autorizza la regione Abruzzo a richiedere, a valere sulle risorse destinate al Piano, la rimodulazione dei finanziamenti assegnati con il 1° e il 2° programma stralcio, a favore di interventi che non risultino più prioritari o necessitino di modifiche rispetto alle previsioni originarie in conseguenza degli eventi sismici del mese di aprile 2009.

Il MIT, con nota del 30 luglio, segnala una rettifica dei definanziamenti integrali.

Il CIPE, con delibera n. 61, approva il prospetto dei definanziamenti integrali e dei definanziamenti parziali, nonché il prospetto di riprogrammazione degli interventi.

Il MIT, con nota 5 ottobre 2009, prot. n. 0012242, trasmette al CIPE la «Relazione semestrale sull'avanzamento al 30 giugno 2009» dei primi due Programmi stralcio, approvati con le delibere n. 102/2004 e n. 143/2006. Dalla Relazione risulta che per il 1° Programma stralcio non sono stati avviati interventi per un importo pari a 31 meuro (il 16 per cento dell'importo del programma); per il 2° Programma stralcio, gli interventi non avviati, per un ammontare di 147 meuro, sono pari al 50 per cento. La difficoltà di coordinamento tra gli enti interessati e la strutturale carenza di una progettazione di base sono i motivi indicati per il ritardo nell'implementazione del Programma. La procedura amministrativa adottata a partire dal 2007 e il definanziamento degli interventi non più attuali hanno corretto alcuni errori di programmazione.

2010

Il CIPE, con delibera n. 15 del 13 maggio, prende atto della Relazione del MIT sui due Programmi stralcio e invita MIT e MIUR a relazionare sulle iniziative che intendono adottare per il superamento delle criticità e a far conoscere lo stato di predisposizione del 3° Programma stralcio (che avrebbe dovuto essere presentato al CIPE entro il 30 giugno 2009 e le cui risorse sono state accantonate con delibera 114/2008) e i tempi previsti per la sottoposizione dello stesso all'approvazione. Il CIPE chiede inoltre che sia fornita una panoramica delle altre iniziative in atto in materia di edilizia scolastica, a valere su tutti gli altri canali di finanziamento previsti per il settore stesso.

La Corte dei Conti, con deliberazione n. 15/2010/G del 18 giugno, approva la relazione concernente il "Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002". Secondo la relazione: "al 31 dicembre 2009 dei 1.593 interventi programmati, ne risultano attivati 1.219 (77%). I contratti di mutuo stipulati sono 971 (61%), mentre i lavori risultano aggiudicati o affidati per 463 interventi (29%). Con riguardo in particolare al primo Programma stralcio, solo 137 interventi risultano ultimati; gli interventi ultimati del secondo Programma stralcio sono 39".

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera l'opera "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

Dalla Relazione semestrale del MIT al 31 dicembre risultano attivati 1.286 interventi (81%) dei 1.593 interventi

totali programmati, per un importo complessivo di 372,4 Meuro (76% del totale). I restanti 307, per 116,6 Meuro, non risultano avviati. Sono ultimati i lavori relativi a 247 interventi (16%) e sono in gara o già affidati i lavori di altri 632 (40%). I contratti di mutuo stipulati sono 1.116 (70%).

2011

Nella seduta del 5 maggio il CIPE approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di attuazione del programma stralcio di rimodulazione del “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici”, presentata dal MIT.

LA COMPOSIZIONE DEI PIANI STRALCIO AL 31 DICEMBRE 2010 – La ripartizione delle disponibilità

Regioni	Primo programma stralcio	Secondo programma stralcio	Primo programma stralcio di rimodulazione	Totale utilizzato	Residui di programmazione	Disponibilità complessiva
Abruzzo	9.411.420,00	17.858.330,68	1.980.000,00	29.249.750,68	8.580,00	29.258.330,68
Basilicata	7.577.000,00	12.308.655,73	-	19.885.655,73	-	19.885.655,73
Calabria	35.135.000,00	49.176.803,60	-	84.311.803,60	-	84.311.803,60
Campania	28.887.000,00	62.079.228,47	4.205.991,96	95.172.220,43	-	95.172.220,43
Emilia Romagna	5.741.000,00	10.320.966,34	800.271,54	16.862.237,88	-	16.862.237,88
Friuli Venezia Giulia	6.077.000,00	7.998.666,25	-	14.075.666,25	-	14.075.666,25
Lazio	14.000.000,00	22.491.716,38	-	36.491.716,38	-	36.491.716,38
Liguria	1.211.000,00	1.681.660,29	-	2.892.660,29	-	2.892.660,29
Lombardia	450.000,00	994.688,34	648.965,13	2.093.653,47	-	2.093.653,47
Marche	8.692.677,60	13.084.525,47	1.006.205,06	22.783.408,13	-	22.783.408,13
Molise	3.276.000,00	5.784.872,20	300.000,00	9.360.872,20	-	9.360.872,20
Piemonte	1.053.727,00	1.357.284,09	-	2.411.011,09	-	2.411.011,09
Puglia	3.181.000,00	7.954.957,32	-	11.135.957,32	74.000,00	11.209.957,32
Sicilia	26.321.838,03	50.285.325,16	2.639.468,44	79.246.631,63	-	79.246.631,63
Toscana	11.113.000,00	25.237.743,28	376.397,93	36.727.141,21	-	36.727.141,21
Umbria	6.732.000,00	10.087.223,61	626.990,81	17.446.214,42	-	17.446.214,42
Trentino Alto Adige	-	883.949,64	-	883.949,64	-	883.949,64
Veneto	2.751.748,19	3.863.623,86	1.354.192,60	7.969.564,65	-	7.969.564,65
Totale	171.611.410,82	303.450.220,71	13.938.483,47	489.000.115,00	82.580,00	489.082.695,00
%	35,10%	62,0%	2,8%	100,0%	0,0%	100,0%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

LA COMPOSIZIONE DEI PIANI STRALCIO AL 31 DICEMBRE 2010 – La ripartizione degli interventi programmati

Regioni	Valori assoluti		Composizione %	
	N° interventi	Importo utilizzato	N° interventi	Importo utilizzato
Abruzzo	180	29.249.751	11,3	6,0
Basilicata	31	19.885.656	1,9	4,1
Calabria	515	84.311.804	32,3	17,2
Campania	164	95.172.220	10,3	19,5
Emilia Romagna	90	16.862.238	5,6	3,4
Friuli Venezia Giulia	12	14.075.666	0,8	2,9
Lazio	87	36.491.716	5,5	7,5
Liguria	11	2.892.660	0,7	0,6
Lombardia	6	2.093.653	0,4	0,4
Marche	61	22.783.408	3,8	4,7
Molise	14	9.360.872	0,9	1,9
Piemonte	3	2.411.011	0,2	0,5
Puglia	21	11.135.957	1,3	2,3
Sicilia	189	79.246.632	11,9	16,2
Toscana	132	36.727.141	8,3	7,5
Umbria	29	17.446.214	1,8	3,6
Trentino Alto Adige	2	883.950	0,1	0,2
Veneto	46	7.969.565	2,9	1,6
Totale	1.593	489.000.115	100,0	100,0


Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2010 – Interventi programmati

	Numero		Importo	
	V.a.	%	V.a.	%
INTERVENTI PROGRAMMATI TOTALI	1.593	100%	489.000.115	100%
NON AVVIATI	307	19%	116.619.028	24%
ATTIVATI	1.286	81%	372.381.087	76%
Documento di attuazione da firmare	18	1%	6.264.775	1%
Documento di attuazione protocollato	1.268	80%	366.116.311	75%
Gara e affidamento lavori	632	40%	173.431.373	35%
Stipula contratto di prestito	1.116	70%	317.551.036	65%
Lavori ultimati	247	16%	62.249.284	13%


Fonte: *elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010*

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2010 – Interventi programmati totali

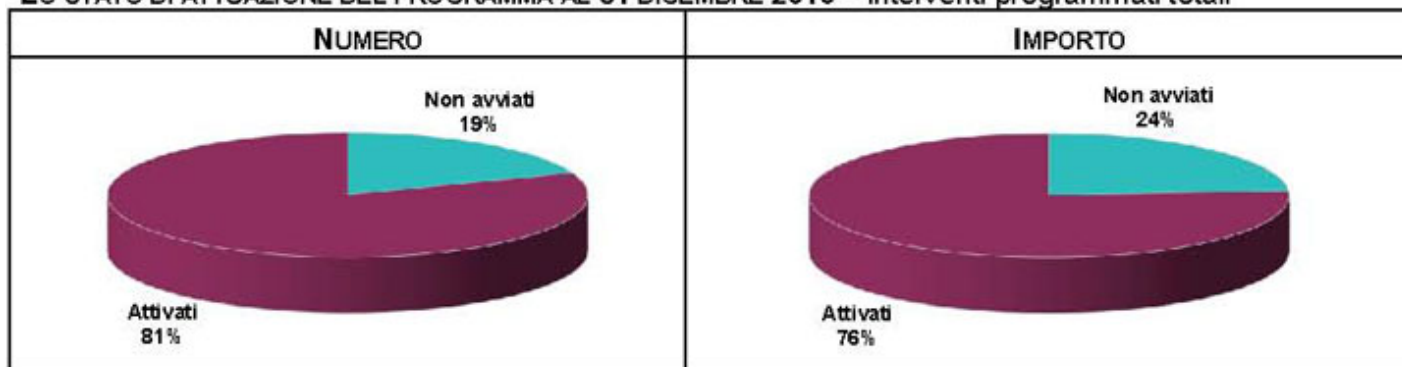

Fonte: *elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010*

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2010 – Interventi programmati con documento di attuazione protocollato per fase esecutiva

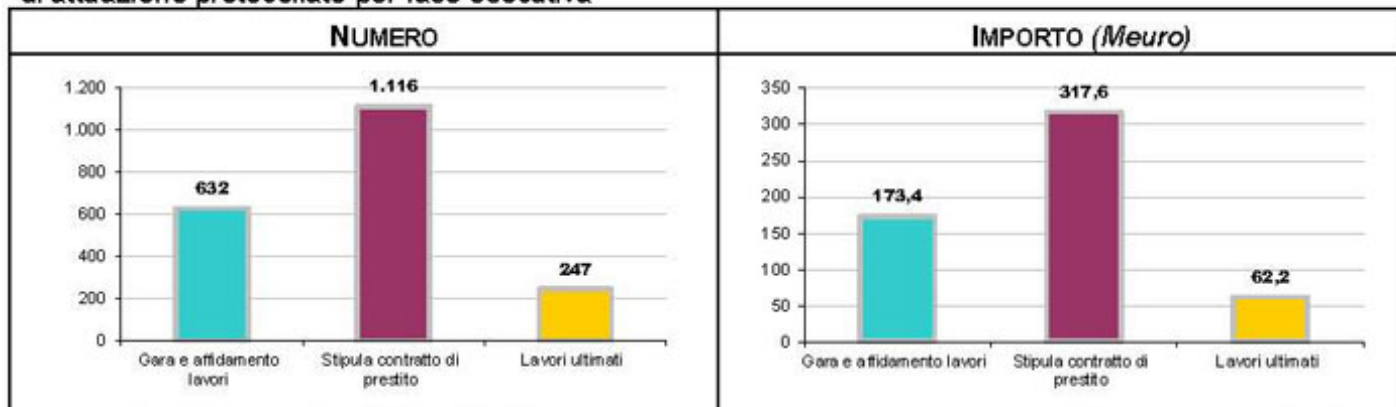

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTERO PROGRAMMA – La ripartizione degli interventi programmati per fasi procedurali

Regione	Non avviati (a)			Documento di attuazione da firmare (b)			Documento di attuazione protocollato (c)		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	15	3.193.771	11%	0	0	0%	165	26.055.980	89%
Basilicata	9	3.282.962	17%	0	0	0%	22	16.602.694	83%
Calabria	33	6.169.943	7%	5	403.796	0%	477	77.738.065	92%
Campania	94	57.724.583	61%	1	656.592	1%	69	36.791.045	39%
Emilia Romagna	21	4.632.737	27%	1	661.492	4%	68	11.568.008	69%
Friuli V.G.	5	2.461.731	17%	0	0	0%	7	11.613.935	83%
Lazio	15	5.536.960	15%	2	1.028.988	3%	70	29.925.769	82%
Liguria	1	453.416	16%	0	0	0%	10	2.439.244	84%
Lombardia	0	0	0%	0	0	0%	6	2.093.653	100%
Marche	1	100.464	0%	0	0	0%	60	22.682.944	100%
Molise	1	200.000	2%	0	0	0%	13	9.160.872	98%
Piemonte	0	0	0%	0	0	0%	3	2.411.011	100%
Puglia	0	0	0%	0	0	0%	21	11.135.957	100%
Sicilia	52	14.945.013	19%	2	1.081.990	1%	135	63.219.628	80%
Toscana	57	17.052.850	46%	6	2.189.994	6%	69	17.484.297	48%
Umbria	0	0	0%	0	0	0%	29	17.446.215	100%
Trentino A.A.	0	0	0%	0	0	0%	2	883.950	0%
Veneto	3	864.599	11%	1	241.923	3%	42	6.863.044	86%
Totale	307	116.619.029	24%	18	6.264.775	1%	1.268	366.116.312	75%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

(a) Interventi in fase di attivazione della procedura di attuazione o in fase di esame della progettazione ai fini della valutazione della coerenza

(b) interventi con documento di attuazione sottoscritto

(c) interventi in fase di affidamento o di esecuzione lavori compresi gli ultimati

RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA STRALCIO – La ripartizione degli interventi programmati

Regione	Non avviati (a)			Documento di attuazione da firmare (b)			Documento di attuazione protocollato (c)		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	3	305.000	3%	0	0	0%	69	9.106.420	97%
Basilicata	0	0	0%	0	0	0%	8	7.577.000	100%
Calabria	8	1.270.000	4%	1	100.000	0%	241	33.765.000	96%
Campania	16	7.780.000	27%	0	0	0%	43	21.107.000	73%
Emilia Romagna	6	613.000	11%	0	0	0%	40	5.128.000	89%
Friuli V.G.	0	0	0%	0	0	0%	4	6.077.000	100%
Lazio	5	2.107.000	15%	0	0	0%	30	11.893.000	85%
Liguria	0	0	0%	0	0	0%	4	1.211.000	100%
Lombardia	0	0	0%	0	0	0%	1	450.000	100%
Marche	0	0	0%	0	0	0%	23	8.692.678	100%
Molise	1	200.000	6%	0	0	0%	6	3.076.000	94%
Piemonte	0	0	0%	0	0	0%	1	1.053.727	100%
Puglia	0	0	0%	0	0	0%	8	3.181.000	100%
Sicilia	3	1.870.394	7%	1	200.000	1%	57	24.251.444	92%
Toscana	27	3.915.000	35%	2	450.000	4%	33	6.748.000	61%
Umbria	0	0	0%	0	0	0%	11	6.732.000	100%
Trentino A.A.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Veneto	0	0	0%	0	0	0%	17	2.751.748	100%
Totale	69	18.060.394	11%	4	750.000	0%	596	152.801.017	89%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2009

(a) Interventi in fase di attivazione della procedura di attuazione o in fase di esame della progettazione ai fini della valutazione della coerenza

(b) interventi con documento di attuazione sottoscritto

(c) interventi in fase di affidamento o di esecuzione lavori compresi gli ultimati

RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SECONDO PROGRAMMA STRALCIO – La ripartizione degli interventi programmati per fasi procedurali

Regione	Non avviati (a)			Documento di attuazione da firmare (b)			Documento di attuazione protocollato (c)		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	9	2.508.771	14%	0	0	0%	87	15.349.560	86%
Basilicata	9	3.282.962	27%	0	0	0%	14	9.025.694	73%
Calabria	25	4.899.943	10%	4	303.796	1%	236	43.973.065	89%
Campania	72	46.488.591	75%	1	656.592	1%	25	14.934.045	24%
Emilia Romagna	14	3.858.039	37%	1	661.492	6%	24	5.801.435	56%
Friuli V.G.	5	2.461.731	31%	0	0	0%	3	5.536.935	69%
Lazio	10	3.429.960	15%	2	1.028.988	5%	40	18.032.769	80%
Liguria	1	453.416	27%	0	0	0%	6	1.228.244	73%
Lombardia	0	0	0%	0	0	0%	3	994.688	100%
Marche	1	100.464	1%			0%	33	12.984.061	99%
Molise	0	0	0%	0	0	0%	6	5.784.872	100%
Piemonte	0	0	0%	0	0	0%	2	1.357.284	100%
Puglia	0	0	0%	0	0	0%	13	7.954.957	100%
Sicilia	44	10.882.403	22%	1	881.990	2%	77	38.520.932	77%
Toscana	29	12.861.452	51%	4	1.739.994	7%	35	10.636.297	42%
Umbria	0	0	0%	0	0	0%	16	10.087.224	100%
Trentino A.A.	0	0	0%	0	0	0%	2	883.950	100%
Veneto	1	58.518	2%	1	241.923	6%	23	3.563.184	92%
Totale	220	91.286.249	30%	14	5.514.775	2%	645	206.649.197	68%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2009

(a) Interventi in fase di attivazione della procedura di attuazione o in fase di esame della progettazione ai fini della valutazione della coerenza

(b) interventi con documento di attuazione sottoscritto

(c) interventi in fase di affidamento o di esecuzione lavori compresi gli ultimati

**RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA STRALCIO DI RIMODULAZIONE –
La ripartizione degli interventi programmati per fasi procedurali**

Regione	Non avviati (a)			Documento di attuazione da firmare (b)			Documento di attuazione protocollato (c)		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	3	380.000	19%	0	0	0%	9	1.600.000	81%
Basilicata	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Calabria	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Campania	6	3.455.992	82%	0	0	0%	1	750.000	18%
Emilia Romagna	1	161.698	20%	0	0	0%	4	638.573	80%
Friuli V.G.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Lazio	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Liguria	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Lombardia	0	0	0%	0	0	0%	2	648.965	100%
Marche	0	0	0%	0	0	0%	4	1.006.205	100%
Molise	0	0	0%	0	0	0%	1	300.000	100%
Piemonte	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Puglia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sicilia	5	2.192.216	83%	0	0	0%	1	447.252	17%
Toscana	1	276.398	73%	0	0	0%	1	100.000	27%
Umbria	0	0	0%	0	0	0%	2	626.991	100%
Trentino A.A.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Veneto	2	806.081	60%	0	0	0%	2	548.111	40%
Totale	18	7.272.386	52%	0	0	0%	27	6.666.098	48%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

(a) Interventi in fase di attivazione della procedura di attuazione o in fase di esame della progettazione ai fini della valutazione della coerenza

(b) interventi con documento di attuazione sottoscritto

(c) interventi in fase di affidamento o di esecuzione lavori compresi gli ultimati

**RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE EROGAZIONI DEI MUTUI
INTERO PROGRAMMA – La ripartizione degli interventi programmati per fase esecutiva**

Regione	Gara affidamento lavori			Stipula contratto di mutuo			Lavori ultimati		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	139	20.222.820	69%	148	22.502.025	77%	75	9.810.023	34%
Basilicata	6	2.901.972	15%	21	15.622.706	79%	2	1.039.994	5%
Calabria	185	26.422.420	31%	435	70.301.445	83%	43	5.341.384	6%
Campania	22	12.017.568	13%	56	29.500.481	31%	3	1.200.000	1%
Emilia Romagna	20	4.975.370	30%	57	10.427.436	62%	4	635.593	4%
Friuli V.G.	4	7.204.717	51%	7	11.613.935	83%	3	5.244.740	37%
Lazio	55	21.604.550	59%	63	24.823.812	68%	16	6.289.990	17%
Liguria	10	2.439.244	84%	8	2.071.454	72%	5	1.142.473	39%
Lombardia	3	694.664	33%	4	1.444.688	69%	1	244.997	12%
Marche	41	15.351.654	67%	53	20.925.437	92%	18	7.824.115	34%
Molise	10	7.909.082	84%	11	8.209.082	88%	5	2.860.912	31%
Piemonte	1	1.053.727	44%	3	2.411.011	100%	1	1.053.727	44%
Puglia	12	5.541.018	50%	20	10.449.965	94%	1	440.995	4%
Sicilia	50	19.563.741	25%	120	53.396.237	67%	20	7.261.793	9%
Toscana	12	3.898.383	11%	52	12.750.141	35%	7	778.396	2%
Umbria	25	14.694.609	84%	26	15.153.243	87%	12	5.897.572	34%
Trentino A.A.	2	883.950	100%	2	883.950	100%	1	441.975	50%
Veneto	35	6.051.885	76%	30	5.063.988	64%	30	4.741.145	59%
Totale	632	173.431.373	35%	1.116	317.551.036	65%	247	62.249.825	13%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE EROGAZIONI DEI MUTUI**PRIMO PROGRAMMA STRALCIO – La ripartizione degli interventi programmati per fase esecutiva**

Regione	Gara affidamento lavori			Stipula contratto di mutuo			Lavori ultimati		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	64	8.642.000	92%	69	9.106.420	97%	45	4.970.000	53%
Basilicata	1	550.000	7%	8	7.577.000	100%	1	550.000	7%
Calabria	108	12.780.000	36%	228	31.440.000	89%	34	3.940.000	11%
Campania	17	9.303.000	32%	41	19.387.000	67%	3	1.200.000	4%
Emilia Romagna	11	2.349.000	41%	35	4.626.000	81%	1	28.000	0%
Friuli V.G.	3	5.244.740	86%	4	6.077.000	100%	3	5.244.740	86%
Lazio	28	10.515.000	75%	28	10.515.000	75%	13	5.457.000	39%
Liguria	4	1.211.000	100%	4	1.211.000	100%	3	1.011.816	84%
Lombardia	0	0	0%	1	450.000	100%	0	0	0%
Marche	21	6.850.306	79%	23	8.692.678	100%	13	4.598.530	53%
Molise	5	2.776.000	85%	6	3.076.000	94%	2	315.000	10%
Piemonte	1	1.053.727	100%	1	1.053.727	100%	1	1.053.727	100%
Puglia	7	2.731.000	86%	8	3.181.000	100%	0	0	0%
Sicilia	30	12.130.452	46%	53	22.793.728	87%	11	5.468.414	21%
Toscana	9	2.448.000	22%	29	5.828.000	52%	5	455.000	4%
Umbria	11	6.732.000	100%	11	6.732.000	100%	8	3.457.000	51%
Trentino A.A.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Veneto	17	2.751.748	100%	15	2.713.170	99%	17	2.751.748	100%
Totale	337	88.067.973	51%	564	144.459.723	84%	160	40.500.975	24%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

**RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE EROGAZIONI DEI MUTUI
SECONDO PROGRAMMA STRALCIO – La ripartizione degli interventi programmati per fase esecutiva**

Regione	Gara affidamento lavori			Stipula contratto di mutuo			Lavori ultimati		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	73	11.380.820	64%	79	13.395.605	75%	29	4.770.023	27%
Basilicata	5	2.351.972	19%	13	8.045.706	65%	1	489.994	4%
Calabria	77	13.642.420	28%	207	38.861.445	79%	9	1.401.384	3%
Campania	5	2.714.568	4%	15	10.113.481	16%	0	0	0%
Emilia Romagna	7	2.337.273	23%	20	5.512.339	53%	1	318.496	3%
Friuli V.G.	1	1.959.977	25%	3	5.536.935	69%	0	0	0%
Lazio	27	11.089.550	49%	35	14.308.812	64%	3	832.990	4%
Liguria	6	1.228.244	73%	4	860.454	51%	2	130.657	8%
Lombardia	2	308.696	31%	3	994.688	100%	1	244.997	25%
Marche	20	8.501.348	65%	30	12.232.759	93%	5	3.225.585	25%
Molise	5	5.133.082	89%	5	5.133.082	89%	3	2.545.912	44%
Piemonte	0	0	0%	2	1.357.284	100%	0	0	0%
Puglia	5	2.810.018	35%	12	7.268.965	91%	1	440.995	6%
Sicilia	20	7.433.289	15%	66	30.155.257	60%	9	1.793.379	4%
Toscana	3	1.450.383	6%	23	6.922.141	27%	2	323.396	1%
Umbria	14	7.962.609	79%	15	8.421.243	83%	4	2.440.572	24%
Trentino A.A.	2	883.950	100%	2	883.950	100%	1	441.975	50%
Veneto	17	3.033.079	79%	15	2.350.818	61%	13	1.989.397	51%
Totale	289	84.221.277	28%	549	172.354.964	57%	84	21.389.753	7%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

RIEPILOGO REGIONALE DELLO STATO DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE EROGAZIONI DEI MUTUI**PRIMO PROGRAMMA STRALCIO DI RIMODULAZIONE - La ripartizione degli interventi programmati per fase esecutiva**

Regione	Gara affidamento lavori			Stipula contratto di mutuo			Lavori ultimati		
	N°	Importo	%	N°	Importo	%	N°	Importo	%
Abruzzo	2	200.000	10%	0	0	0%	1	70.000	4%
Basilicata	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Calabria	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Campania	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Emilia Romagna	2	289.097	36%	2	289.097	36%	2	289.097	36%
Friuli V.G.	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Lazio	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Liguria	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Lombardia	1	385.968	59%	0	0	0%	0	0	0%
Marche	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Molise	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Piemonte	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Puglia	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Sicilia	0	0	0%	1	447.252	17%	0	0	0%
Toscana	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Umbria	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Trentino A.A.	0	0	0%	0	0	100%	0	0	0%
Veneto	1	267.058	20%	0	0	0%	0	0	0%
Totale	6	1.142.123	8%	3	736.349	5%	3	359.097	3%

Fonte: elaborazione CRESME su dati MIT Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma Stralcio al 31 dicembre 2010

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	193,884 Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	489,083 Fonte: Delibera CIPE 143/2006
Costo al 30 giugno 2008	489,080 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	489,083 Fonte: Delibera CIPE 143/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2010	489,083 Fonte: Delibera CIPE 143/2006
Costo ad aprile 2011	489,080 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	489,083 Fonte: Delibera CIPE 143/2006

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	489,080 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	489,083
Fondi Legge Obiettivo	489,083 Fonte: Delibera CIPE 143/2006

Fabbisogno residuo: **0,000**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto MIT n. 512/ES
del 27 Maggio 2003
Seduta della Conferenza Unificata
del 11 Novembre 2004
Delibera CIPE 102/2004
del 20 Dicembre 2004
Seduta Conferenza unificata del 13 Ottobre 2005
Delibera CIPE 157/2005
del 2 Dicembre 2005
Seduta Commissione tecnico scientifica del 21 Luglio 2006
Seduta Commissione tecnico scientifica del 21 Luglio 2006
Delibera Regione Lazio n. 593
del 12 Settembre 2006
Seduta Commissione tecnico scientifica del 17 Ottobre 2006
Delibera Regione Lazio n. 745
del 27 Ottobre 2006
Seduta Conferenza unificata del 8 Novembre 2006
Delibera CIPE 143/2006
del 17 Novembre 2006
Delibera CIPE 17/2008
del 21 Febbraio 2008

Decreto-legge n. 137

del 1 Settembre 2008

Decreto-legge n. 185

del 29 Novembre 2008

Delibera CIPE 114/2008

del 18 Dicembre 2008

Decreto-legge n. 39

del 28 Aprile 2009

Delibera CIPE 47/2009

del 26 Giugno 2009

Delibera CIPE 61/2009

del 31 Luglio 2009

Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma stralcio al 31 Dicembre 2009 del MIT, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed Il personale, Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Dicembre 2009

Delibera CIPE 15/2010 del 13 Maggio 2010

Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma stralcio al 30 Giugno 2010 del MIT, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed Il personale, Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Giugno 2010

Delibera Corte dei Conti n. 15/2010/G

del 18 Giugno 2010

Relazione semestrale sull'avanzamento del 1° e 2° Programma stralcio al 31 Dicembre 2010 del MIT, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed Il personale, Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Dicembre 2010

Seduta CIPE del 5 Maggio 2011

1° programma stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:

Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

2° programma stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:


Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA

Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma

SCHEDA N. 182

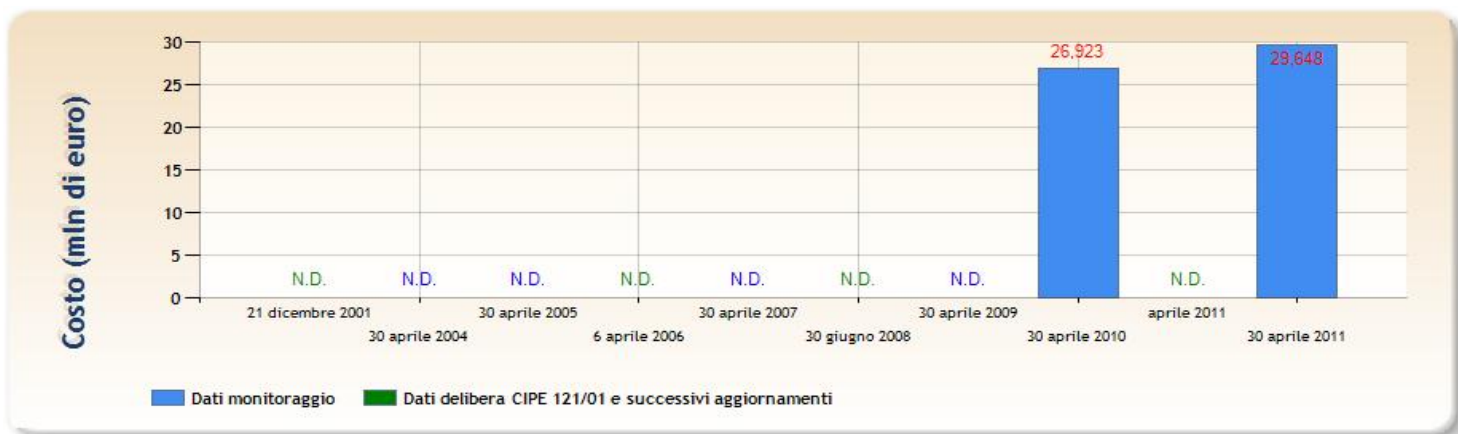

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia scolastica

Authority Società di Trasformazione Urbana Spa di Parma

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

48/2009

ULTIMAZIONE LAVORI

2012

DESCRIZIONE

La Scuola Europea di Parma, attiva dall'anno scolastico 2004/2005, comprende classi del ciclo materno, del ciclo primario e secondario con tre sezioni linguistiche ed ha ottenuto nel 2006 l'accreditamento del Consiglio Superiore delle Scuole Europee. L'area identificata per la nuova sede è situata nei pressi del campus dell'Università e, nell'ambito del vigente POC, è destinata a "Parco scientifico tecnologico". L'intervento prevede la costruzione della scuola materna, primaria e secondaria, 2 palestre, 2 mense, auditorium, biblioteca ed edificio amministrativo. La superficie minima per l'insediamento della scuola, della relativa dotazione di urbanizzazione e degli standards di parcheggio è stata quantificata in ca. 60.000 mq. E' stato individuato, nell'ambito dell'intervento complessivo, un lotto funzionale che include gli edifici della scuola materna e della scuola primaria, l'edificio amministrativo, una palestra ed una mensa per complessivi 36.700 mq.

DATI STORICI

2003

Con decisione del Consiglio Europeo del 13 dicembre Parma viene designata ad ospitare una Scuola Europea.

2004

La Scuola Europea di Parma viene istituita con il DM del MIUR n. 41 del 23 luglio.

2006

Il Comune di Parma, il 21 febbraio, stipula una convenzione con Authority Società di Trasformazione Urbana Spa per lo svolgimento delle attività finalizzate all'insediamento dell'EFSA.

L'articolo 1, comma 1342, della legge n. 296 (finanziaria 2007) autorizza la spesa di 2,8 Meuro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola Europea di Parma".

2007

Il MIUR, con nota del 22 ottobre, precisa che lo stanziamento della legge n. 296 dovrà essere decurtato di 500.000 euro l'anno per le spese di funzionamento della scuola. Risultano pertanto disponibili per la realizzazione della "Scuola per l'Europa" 6,9 Meuro.

In data 9 novembre viene sottoscritta una convenzione tra Comune e Provincia di Parma con la quale si stabilisce che la realizzazione della nuova sede sarà curata dal Comune, che sarà anche il destinatario delle risorse.

Il Comune di Parma, con delibera 19 dicembre, approva il progetto preliminare con un costo iniziale di 6,9 Meuro.

2008

Il Comune di Parma, in data 26 febbraio, invia alla Authority Società di Trasformazione Urbana Spa comunicazione riguardante l'individuazione dell'area prescelta dal Comune situata nei pressi del campus dell'Università.

2009

Il MIT, con nota del 17 giugno, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sulla nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma e, con nota del 25 giugno, fornisce chiarimenti e trasmette copia aggiornata della relazione istruttoria. Dalla relazione risulta che il Comune di Parma, dopo l'approvazione del progetto preliminare, ha confermato l'affidamento, prospettato nella convenzione con Authority Società di Trasformazione Urbana Spa, del procedimento per la realizzazione della nuova sede della Scuola Europea, il cui progetto preliminare dovrà essere trasmesso alla Provincia di Parma per la verifica e l'approvazione.

Il CIPE, con delibera n. 48, prende atto che il costo dell'intero l'intervento è stato quantificato in 26,9 Meuro, al netto degli oneri di urbanizzazione e di realizzazione delle opere esterne, e che il costo può subire una lievitazione del 10-15% per ulteriori gradi di sofisticazione impiantistica. Il Comune ha individuato un lotto funzionale che include gli edifici della scuola materna e della scuola primaria, l'edificio amministrativo, una palestra ed una mensa per complessivi 36.700 mq e ne ha quantificato il costo in 15,3 Meuro, di cui 12,1 per lavori, 3,1 per somme a disposizione dei quali 1,4 per IVA computata al 10%. Il CIPE delibera quindi l'assegnazione al Comune di Parma dell'importo di 8,4 Meuro al

fine di integrare la copertura finanziaria del lotto funzionale della nuova sede della Scuola. Tale importo è a valere sulla destinazione di 1.000 Meuro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole (delibera CIPE n. 3/2009) nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 Meuro a favore del Fondo Infrastrutture.

2010

In data 2 aprile, Authority Società di Trasformazione Urbana Spa invia alla GUCE il bando di gara per l'affidamento dei "lavori di realizzazione della nuova Scuola Europea a Parma: realizzazione di un complesso scolastico organizzato a campus composto dai seguenti edifici: direzione scolastica con biblioteca e auditorium; scuola materna; scuola primaria; scuola secondaria di 1° grado; scuola secondaria di 2° grado; mensa per 400 alunni; palestra, campi sportivi all'aperto. sono compresi i lavori di urbanizzazione dell'area e la centrale tecnologica". Il valore complessivo a base di gara è di 23,6 Meuro. Successivamente il procedimento viene interrotto e in data 16 agosto viene indetta una nuova gara.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera non è riportata.

Il 4 novembre i lavori vengono aggiudicati all'ATI composto da CO.GE. Costruzioni Generali Spa (capogruppo) con Unieco Soc.Coop. arl di Parma.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'intervento non è riportato.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, l'avanzamento dei lavori risulta del 23% e l'ultimazione è attesa per aprile 2012.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	26,923 Fonte: Delibera CIPE 48/2009
Costo ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	29,648 Fonte: Authority Società di Trasformazione Urbana Spa di Parma

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	29,648
Fondo Infrastrutture	8,360 Fonte: Delibera CIPE 48/2009
Legge n. 296/2006	6,900 Fonte: Delibera CIPE 48/2009
Fondi Pubblici	5,520 Fonte: Delibera CIPE 48/2009
Società STT Holding Spa	8,868 Fonte: Authority Società di Trasformazione Urbana Spa di Parma

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	22.991.000,00
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	2.511.225,76
Importo di aggiudicazione:	363.659,38
Nome aggiudicatario:	ATI: GPA INGEGNERIA SRL, STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI, SETIN ENGINEERING SRL, DR GEOLOGO GIANNI FOCARDI, ING. ELENA MELLACE
Codice fiscale aggiudicatario:	01315880516
Data inizio:	20/10/2009
Data fine:	06/04/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Authority Società di Trasformazione Urbana Spa di Parma
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Altro
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	45 giorni
Lavori:	503 giorni
Data bando:	16/08/2010
CIG/CUI:	0533020603
Data aggiudicazione:	04/11/2010
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI: CO.GE S.P.A., UNIECO SOC.COOP.A R.L.
Codice fiscale aggiudicatario:	00161500343
Data contratto:	22/11/2010
Quadro economico:	
Importo a base gara:	22.647.726,09
Importo oneri per la sicurezza:	991.274,09
Importo complessivo a base di gara:	23.639.000,18
Importo aggiudicazione:	23.480.444,55
Somme a disposizione:	6.008.720,02
Totale:	29.489.164,57
% Ribasso di aggiudicazione:	0,70
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 22/11/2010
Data presunta fine lavori: 07/04/2012
Stato avanzamento importo: 6.011.806,15
Stato avanzamento percentuale: 23,00
Data effettiva inizio lavori: 22/11/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 07/04/2012
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 0
Motivi: Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 22.498.506,82
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 6.158.395,24
Totale: 28.656.902,06
Note: La prima variante ha riguardato solamente l'interramento di una linea aerea di bassa tensione interferente con le lavorazioni.

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Convenzione Comune di Parma e Authority Società di Trasformazione Urbana Spa del 21 Febbraio 2006
Legge n. 296/2006
del 27 Dicembre 2006
Delibera Comune di Parma del 19 Dicembre 2007
Legge n. 133/2008
del 6 Agosto 2008
Delibera CIPE 3/2009
del 6 Marzo 2009
Delibera CIPE 48/2009
del 26 Giugno 2009
Bando di gara Authority Società di Trasformazione Urbana Spa (procedimento interrotto) del Aprile 2010


Bando di gara Authority Società di Trasformazione Urbana Spa del Agosto 2010

Avviso di aggiudicazione di gara Authority Società di Trasformazione Urbana Spa del Novembre 2010

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA

Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009

SCHEDA N. 183

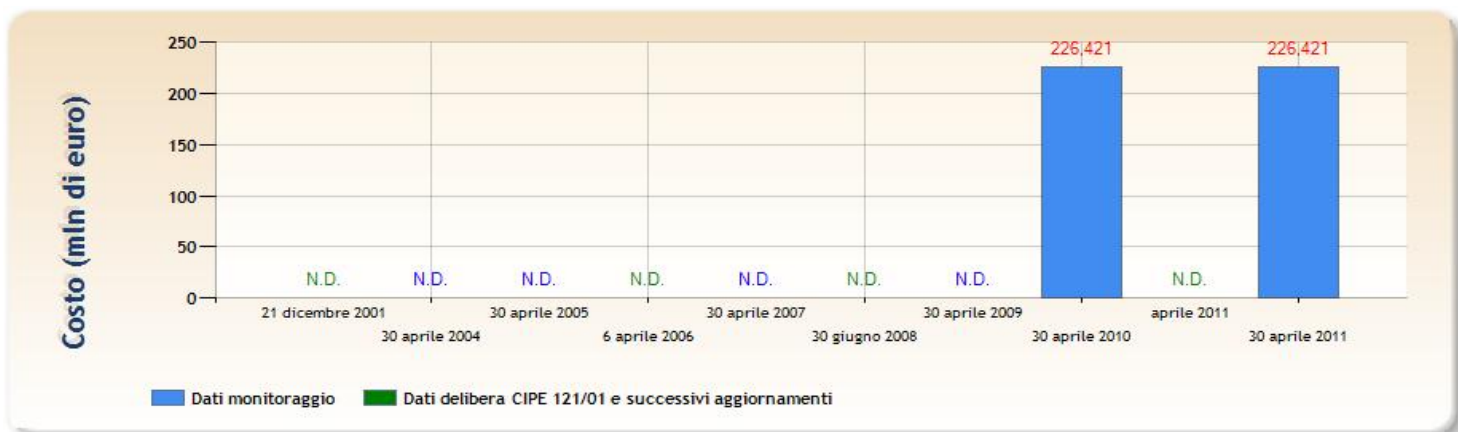

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia scolastica

Presidente Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39

STATO DI ATTUAZIONE

Stato di attuazione non classificabile

DELIBERE CIPE

47/2009

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

Gli interventi riguardano la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione Abruzzo, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2006.

Di seguito si riportano gli interventi e la stima dei fabbisogni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici colpiti dal sisma del 6.04.2009, come indicato nell'allegato alla Delibera CIPE 47/2009:

A) Edifici scolastici ubicati nel "cratere" sismico: € 144.806.900,00

Comuni della provincia di L'Aquila (€ 62.972.000,00)

Comuni della provincia di Pescara (€ 690.000,00)

Comuni della provincia di Teramo (€ 120.000,00)

Amministrazione Provinciale di L'Aquila (€ 80.864.900,00)

Amministrazione Provinciale di Teramo (€ 160.000,00)

B) Edifici Scolastici Ubicati Fuori Del "Cratere" Sismico: € 81.614.550,00

Comuni di tutte le province (€ 30.600.000,00)

Amministrazione Provinciale di L'Aquila (€ 45.873.050,00)

Amministrazione Provinciale di Pescara (€ 1.600.000,00)

Amministrazione Provinciale di Teramo (€ 3.541.500,00)

Totale Generale (A+B): € 226.421.450,00

DATI STORICI

2008

L'art. 6-quinquies del decreto legge n. 112 istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ("Fondo Infrastrutture").

L'art. 18 del decreto legge n. 185 dispone che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo Infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

Il CIPE, con delibera n. 112, assegna 7.356 Meuro al Fondo Infrastrutture per interventi di competenza del MIT.

2009

Il CIPE, con delibera n. 3, assegna 5 miliardi di euro al Fondo Infrastrutture, con una destinazione di 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 Meuro per l'edilizia carceraria.

L'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 riserva alla Regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 185/2008, e autorizza la Regione a modificare il Piano annuale 2009 di edilizia scolastica.

Il Presidente della Regione Abruzzo, con nota del 3 giugno, quantifica in 226,4 Meuro l'entità delle risorse da assegnare sulla base della documentazione predisposta dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Gli interventi risultano articolati tra quelli da realizzare nel "cratere" sismico e quelli da realizzare al di fuori e, nell'ambito di tale classificazione, tra gli interventi di competenza dei Comuni (limitatamente alle scuole dell'infanzia, elementari e medie di primo grado) e quelli delle Province (per quanto attiene agli Istituti secondari di secondo grado).

Il MIT, con nota del 22 giugno, condivide la proposta della Regione.

Il CIPE, con delibera n. 47, assegna alla Regione Abruzzo l'importo di 226,4 Meuro, al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati. L'assegnazione è a valere sulla destinazione di 1 miliardo di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la delibera n. 3 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5 miliardi di euro per il Fondo infrastrutture. Il Presidente della Regione, con cadenza semestrale e a decorrere dal 31 dicembre 2009, sottoporrà al CIPE una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione della funzionalità degli edifici scolastici. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio il Presidente della Regione si avvale, dal 1° gennaio 2010, del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE).

Il CIPE, con delibera n. 51 del 26 giugno, definisce le disponibilità del Fondo Infrastrutture e approva l'elenco degli interventi da attivare nel triennio, prevalentemente riferiti a opere strategiche, con identificazione delle relative fonti di copertura.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'intervento non è riportato.

2011

Dalla Relazione del Commissario delegato per la ricostruzione del marzo 2011, risultano messi in atto interventi per 62 Meuro, riferiti a 83 edifici scolastici. In particolare: 28 Scuole di proprietà del Comune di L'Aquila, con classifica sismica "A" e "B" ; 7 Scuole di proprietà della Provincia di L'Aquila, con classifica sismica "A" e "B" ; 35 Scuole dei Comuni del "cratere" con classifica sismica "A" e "B" ;13 Scuole dei Comuni di Avezzano e Sulmona (fuori dal "cratere").

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'intervento non è riportato.

Il 17 maggio il Commissario delegato emana il decreto n. 61, "Interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DL 39/2009", che dà avvio al piano "Scuole d'Abruzzo, il futuro in sicurezza" del valore di 221 Meuro, di cui 196 stanziati dal CIPE (dei quali 164,8 Meuro quali risorse residue relative allo stanziamento complessivo di 226,4 Meuro di cui alla delibera CIPE 47/2009) e 25 di cofinanziamento degli enti proprietari con maggiori capacità finanziarie, per rendere sicuri ed ecosostenibili 213 edifici scolastici pubblici ubicati in oltre 100 Comuni abruzzesi. Tale decreto è entrato in vigore il 1° giugno con la pubblicazione nella sezione Ricostruzione del sito internet della Regione Abruzzo.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	226,421 Fonte: Delibera CIPE 47/2009
Costo ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	226,421 Fonte: Delibera CIPE 47/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001
Risorse disponibili ad aprile 2011

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001
N.D. **Fonte:** DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	226,421
Fondo Infrastrutture	226,421 Fonte: Delibera CIPE 47/2009

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO


Delibera CIPE 112/2008
del 18 Dicembre 2007
Decreto-legge n. 112 (art. 6-quinquies)
del 25 Giugno 2008
Decreto-legge n. 185 (art. 18)
del 29 Novembre 2008
Delibera CIPE 3/2009
del 6 Marzo 2009
Decreto-legge n. 39
del 28 Aprile 2009
Decreto-legge n. 39 (art. 4, comma 4)
del 28 Aprile 2009
Delibera CIPE 47/2009
del 26 Giugno 2009
Delibera CIPE 51/2009
del 26 Giugno 2009

Commissario Delegato per la Ricostruzione del Marzo 2011

Decreto n. 61 del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 17 Maggio 2011

PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA

SCHEDA N. 184

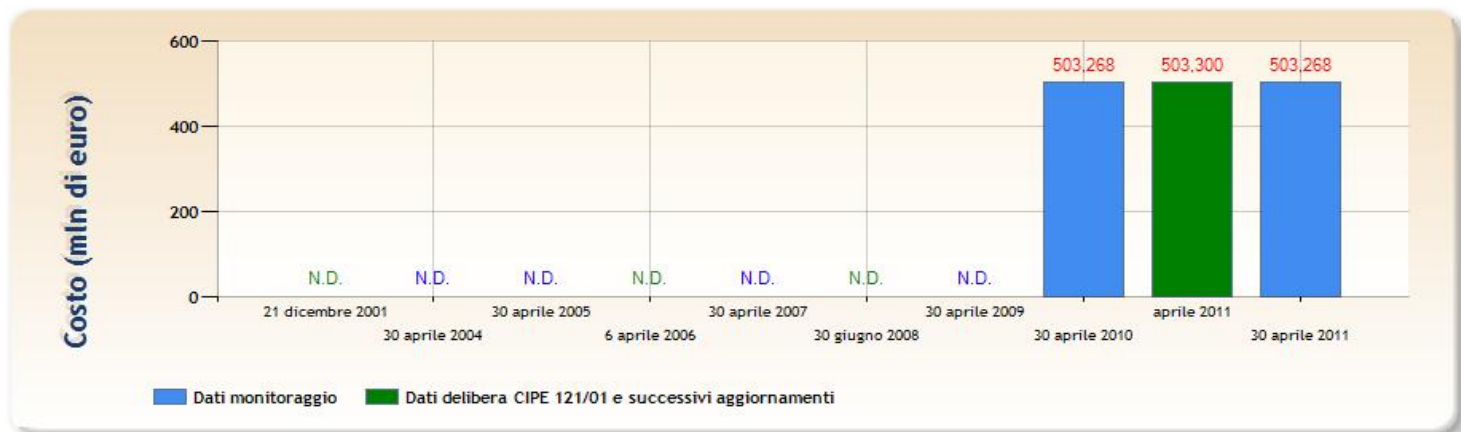

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia penitenziaria

Ministero della Giustizia

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

58/2009

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Il "Programma Carceri" è finalizzato alla costruzione dei seguenti nuovi istituti penitenziari:

- Cagliari
- Sassari
- Tempio Pausania
- Oristano
- Forlì
- Rovigo
- Savona
- Reggio Calabria

Il "Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione", elaborato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con il MIT, è volto ad aumentare la capacità totale a 2.095 "posti detenuto".

DATI STORICI

2003

Con decreto del Ministro della giustizia del 2 ottobre viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria, fatta salva la possibilità di parziali deroghe in relazione a concrete prospettive di permuta e/o locazione finanziaria: Rieti, Marsala, Savona, Rovigo, Sassari, Cagliari Tempio Pausania, Forlì, Oristano, Varese, Pordenone, Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Mistretta, Catania, Trento e Bolzano. Il decreto stabilisce che tutti gli interventi rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza e, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1097/1994, sono state dichiarate secretate le gare per l'affidamento dei lavori.

2005

Il 22 dicembre vengono affidate le gare con la procedura dell'appalto integrato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lett. b), della legge n. 109/1994, mediante gara informale tra ditte di fiducia dell'amministrazione in possesso di abilitazione di sicurezza NOS.

2008

Il CIPE, con delibera n. 112, dispone l'assegnazione di 7.356 Meuro a favore del Fondo Infrastrutture, per interventi di competenza del MIT.

2009

L'articolo 44-bis del decreto legge n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria predisponga un programma degli interventi per fronteggiare la sovrappopolazione delle carceri e che, con successivi DPCM, siano determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma che verranno inserite nella Legge Obiettivo.

Il CIPE, con delibera n. 3, dispone l'assegnazione di 5 miliardi di euro per il Fondo Infrastrutture, destinando 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole e 200 Meuro per l'edilizia carceraria.

Il MIT, con nota del 24 luglio, successivamente integrata e parzialmente rettificata con note del 28 e del 30 luglio, trasmette al CIPE il Programma straordinario, precisando che: i lavori per l'istituto di Savona sono già appaltati e saranno consegnati inizio 2010; il contratto a suo tempo stipulato per l'affidamento dei lavori relativi all'istituto di Reggio Calabria è stato rescisso e si sta procedendo a una nuova aggiudicazione. Per gli istituti di Savona e Reggio Calabria, i finanziamenti richiesti a valere sul Fondo Infrastrutture consentiranno di rendere funzionali i soli lotti in corso di realizzazione, rimanendo da finanziare, per il completamento delle opere, un fabbisogno pari rispettivamente a circa 30,5 e 10,5 Meuro, per circa complessivi 41 Meuro.

Il CIPE, con delibera n. 58, prende atto che il costo complessivo degli interventi ammonta a 503,3 Meuro e che le risorse disponibili, impegnate a valere sul capitolo 7473 del bilancio del MIT, sono pari a 262,2 Meuro. Il CIPE assegna agli interventi di edilizia penitenziaria individuati nel Programma straordinario, gli importi singolarmente specificati nel Programma, per complessivi 200 Meuro. L'assegnazione è a valere sulla dotazione di 200 Meuro

destinata al finanziamento di interventi di edilizia carceraria, già disposta con delibera n. 3/2009 nell'ambito della complessiva attribuzione di 5 miliardi di euro a favore del Fondo Infrastrutture.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 la voce "Edilizia carceraria" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 la voce "Edilizia carceraria" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	503,268 Fonte: Delibera CIPE 58/2009
Costo ad aprile 2011	503,300 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	503,268 Fonte: Delibera CIPE 58/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte:
Risorse disponibili ad aprile 2011	503,300 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	503,268
Fondi Pubblici	303,268 Fonte: DEF 2012-2014
Fondo Infrastrutture	200,000 Fonte: Delibera CIPE 58/2009

Fabbisogno residuo: **0,000**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto-legge n. 112 (art. 6-quinquies)

del 25 Giugno 2008

Decreto-legge n. 185 (art. 18)

del 29 Novembre 2008

Delibera CIPE 112/2008

del 18 Dicembre 2008

Decreto-legge n. 207 (art. 44-bis)

del 30 Dicembre 2008

Legge n. 14/2009
del 27 Febbraio 2009
Delibera CIPE 3/2009
del 6 Marzo 2009
Delibera CIPE 51/2009
del 26 Giugno 2009
Delibera CIPE 58/2009
del 31 Luglio 2009

Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione definitiva
CIPE: Si
Importo lavori: 68.329.331,94
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 510.000,00
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 1100 giorni
Data bando:
CIG/CUI: 116219734D
Data aggiudicazione: 22/12/2005
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: OPERE PUBBLICHE S.p.A / Soc. CIOTOLA S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 00600890925
Data contratto: 18/04/2006
Quadro economico:
Importo a base gara: 68.329.331,94
Importo oneri per la sicurezza: 1.931.775,02
Importo complessivo a base di gara: 70.261.106,96

Importo aggiudicazione: 61.856.599,13
Somme a disposizione: 10.669.229,42
Totale: 72.525.828,55
% Ribasso di aggiudicazione: 12,30
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: l'importo deliberato dal CIPE comprende il progetto di 1° e 2° fase nonché la realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 09/11/2006
Data presunta fine lavori: 25/09/2011
Stato avanzamento importo: 65.867.492,05
Stato avanzamento percentuale: 94,66
Data effettiva inizio lavori: 09/11/2006
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 25/09/2011
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione definitiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	64.885.575,50
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	559.771,96
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	1100 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	1161911748
Data aggiudicazione:	22/12/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ANEMONE COSTRUZIONI S.r.l./ I.G.I.T. S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	08060641001
Data contratto:	17/05/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	64.885.575,50
Importo oneri per la sicurezza:	1.115.676,23
Importo complessivo a base di gara:	66.603.837,38
Importo aggiudicazione:	60.731.692,80
Somme a disposizione:	8.884.040,20
Totale:	69.615.733,00

% Ribasso di aggiudicazione: 9,05

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: l'importo deliberato dal CIPE comprende il progetto di 1° e 2° fase nonché la realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 15/03/2007
Data presunta fine lavori: 25/06/2011
Stato avanzamento importo: 53.151.016,23
Stato avanzamento percentuale: 88,40
Data effettiva inizio lavori: 15/03/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 13/09/2011
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 80
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 59.616.016,57
Importo oneri sicurezza: 1.115.676,23
Somme a disposizione: 8.884.040,20
Totale: 69.615.733,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009

Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione definitiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	53.817.723,89
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	474.164,73
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	900 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	1161128123
Data aggiudicazione:	22/12/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	GIA.FI. S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	03515570483
Data contratto:	23/03/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	53.817.723,89
Importo oneri per la sicurezza:	1.070.950,94
Importo complessivo a base di gara:	54.888.674,83
Importo aggiudicazione:	50.118.318,65
Somme a disposizione:	7.084.681,35
Totale:	57.203.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	9,57
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	21/12/2009
Stato avanzamento importo:	48.731.624,24
Stato avanzamento percentuale:	98,00
Data effettiva inizio lavori:	06/03/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	25/06/2011
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	49.467.617,71
Importo oneri sicurezza:	1.070.950,94
Somme a disposizione:	7.164.431,34
Totale:	57.702.999,99
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

Nuovo istituto penitenziario di Oristano

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione definitiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	42.833.601,24
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	321.000,00
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	900 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	1161706E1A
Data aggiudicazione:	22/12/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	UNILAND Scarl / CIMAS S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	06031390724
Data contratto:	17/05/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	42.833.601,24
Importo oneri per la sicurezza:	819.110,96
Importo complessivo a base di gara:	43.652.712,20
Importo aggiudicazione:	38.855.348,86
Somme a disposizione:	6.157.880,54
Totale:	45.013.229,40
% Ribasso di aggiudicazione:	11,20
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 25/06/2011
Stato avanzamento importo: 43.276.331,42
Stato avanzamento percentuale: 96,00
Data effettiva inizio lavori: 12/04/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi: Richieste Amministrazione usuaria
Importo: 39.976.119,47
Importo oneri sicurezza: 819.110,97
Somme a disposizione: 6.023.880,53
Totale: 46.819.110,97
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2011

Nuovo istituto penitenziario di Forlì

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	per il dettaglio sulle fasi successive si rimanda alle schede relative ai vari lotti
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	43.909.848,33
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.462.705,00
Importo di aggiudicazione:	1.298.601,67
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	30/11/2006
Data fine:	09/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
Quadro economico:	
Importo a base gara:	
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2012
Previsione al 30/04/2011 2014

1 fase

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	4.206.952,29
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	85.002,70
Importo di aggiudicazione:	65.386,69
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	01/07/2006
Data fine:	16/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	550 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	27/12/2006
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ADANTI SpA - BUSI IMPIANTI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	01935981207
Data contratto:	17/01/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.076.389,64
Importo oneri per la sicurezza:	130.562,65
Importo complessivo a base di gara:	4.206.952,29
Importo aggiudicazione:	3.024.391,66
Somme a disposizione:	3.349.096,36
Totale:	6.373.488,02
% Ribasso di aggiudicazione:	29,01
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	3.322.544,25
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	12/03/2008
Data effettiva fine lavori:	04/06/2010
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	collaudo in attesa di rilascio

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	1
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	2
Totale giorni sospensione:	114
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	150
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	3.196.191,08
Importo oneri sicurezza:	141.054,65
Somme a disposizione:	4.218.802,92
Totale:	7.556.048,65
Note:	l'importo totale invariato è pari ad € 7.556.048,65

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2010

1° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	27.237.500,00
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.902.092,32
Importo di aggiudicazione:	1.463.147,94
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588-0042
Data inizio:	30/11/2006
Data fine:	02/07/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1350 giorni
Data bando:	19/10/2007
CIG/CUI:	0081617878
Data aggiudicazione:	18/12/2007
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	CIR Costruzioni SpA - IMET SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	01675900383
Data contratto:	16/10/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	26.450.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	787.500,00
Importo complessivo a base di gara:	27.237.500,00
Importo aggiudicazione:	18.121.118,57
Somme a disposizione:	4.459.685,00
Totale:	22.580.803,57
% Ribasso di aggiudicazione:	34,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	

Data presunta fine lavori: 18/12/2013
Stato avanzamento importo: 165.000,00
Stato avanzamento percentuale: 1,00
Data effettiva inizio lavori: 07/04/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire: 8
Note: non è stata avviata la procedura di accordo bonario in quanto parte delle riserve è manifestamente infondata

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2013

2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:**Note:****Progettazione esecutiva**

CIPE: No
Importo lavori: 13.061.318,90
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 258.867,69
Importo di aggiudicazione: 199.128,99
Nome aggiudicatario: ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 29/01/2010
Data fine: 30/03/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:**Progettazione:**

Lavori: 730 giorni
Data bando: 25/03/2011
CIG/CUI: 12499871E7

Data aggiudicazione:**Tipo aggiudicatario:****Nome aggiudicatario:****Codice fiscale aggiudicatario:****Data contratto:****Quadro economico:****Importo a base gara:****Importo oneri per la sicurezza:****Importo complessivo a base di gara:****Importo aggiudicazione:****Somme a disposizione:****Totale:** 0,00**% Ribasso di aggiudicazione:****% Rialzo di aggiudicazione:****Note:****ESECUZIONE LAVORI:****Stato avanzamento lavori:****Data presunta inizio lavori:****Data presunta fine lavori:****Stato avanzamento importo:****Stato avanzamento percentuale:****Data effettiva inizio lavori:****Data effettiva fine lavori:****Data presunta fine lavori varianti:****Tempi realizzazione:**

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2014

Nuovo istituto penitenziario di Rovigo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2012
Previsione al 30/04/2011 2014

1° lotto e 2° lotto 1° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: La gara prevedeva la compilazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di tutto l'intervento.
Per la limitazione del finanziamento previsto con il D.M. B3/2/743 del 19.04.2005, in un primo momento è stato realizzato il progetto preliminare complessivo, il progetto definitivo complessivo ed il progetto esecutivo del I° stralcio.
In gara non è stato inserito l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, cui si è provveduto mediante atto aggiuntivo dell'importo di €.132.759,16-. L'adeguamento della parcella all'effettivo importo progettuale ha comportato una maggiore spesa di €.62.420,14-. Pertanto l'importo totale della progettazione, con il progetto esecutivo del solo I° stralcio, è pari a €. 1.447.252,30-.
A seguito dello stanziamento di ulteriori fondi, con apposito atto aggiuntivo al contratto, è stato affidato allo stesso RTI, a fronte di una miglioria del 5% dell'offerta originaria, l'incarico di compilazione del progetto esecutivo di II° stralcio, che per motivi di esecuzione è stato suddiviso in due sub stralci, il I° sub stralcio relativo alle opere intramoenia ed il II° sub stralcio relativo alle opere extramoenia. L'importo della progettazione esecutiva del II° stralcio, I° substralcio opere intramoenia, è pari a €.157.628,21- e quindi l'importo totale della progettazione preliminare e definitiva dell'intero intervento ed esecutiva delle opere intramoenia ammonta ad €.1.604.880,51-.
La progettazione esecutiva del II° stralcio I° sub stralcio è iniziata il 15.07.2010 e si è conclusa il 16.09.2010 con un importo lordo di lavori indicato nel progetto pari a €.8.577.102,43-. L'importo totale delle opere intramoenia progettato è quindi pari a €.29.687.571,68-.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori:	21.110.469,25
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.433.031,00
Importo di aggiudicazione:	1.252.073,00
Nome aggiudicatario:	R.T.I PLANARCH Srl - SVEI Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	03/10/2005
Data fine:	07/09/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Magistrato alle Acque - provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di venezia
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1095 giorni
Data bando:	20/11/2006
CIG/CUI:	0798030B2D
Data aggiudicazione:	20/12/2006
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	S.A.C.A.I.M. Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	03134600273
Data contratto:	18/04/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	20.696.538,48
Importo oneri per la sicurezza:	413.930,77
Importo complessivo a base di gara:	21.110.469,25
Importo aggiudicazione:	17.730.742,52
Somme a disposizione:	6.940.130,75
Totale:	24.670.873,27
% Ribasso di aggiudicazione:	0,16
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: Gara indetta mediante procedura speciale – gara informale, seduta unica - trattativa privata - ricorrendo gli estremi di cui all'art. 17 D.Lgs. n.163/2006. L'affidamento dei lavori del I° stralcio è avvenuto tenendo conto della insufficienza della somma stanziata con D.M. B3/2/743 del 19.04.2005. A seguito di successivo stanziamento di fondi, si è ritenuto necessario affidare, per univocità di responsabilità, i lavori intramoenia (II° stralcio - I° sub stralcio) agli stessi operatori (impresa e responsabile della sicurezza) che stavano eseguendo i lavori e servizi del I° stralcio, a fronte di una miglioria del 6,00% del ribasso originariamente offerto (16,33%), quindi per un ribasso complessivo del 22,33%. E' stato pertanto formalizzato l'atto aggiuntivo di netti €6.720.997,08- (compresi gli oneri di sicurezza), con un ulteriore tempo per eseguire i lavori di gg.450-, che è stato inserito nella sezione varianti.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	23/07/2007
Data presunta fine lavori:	22/07/2010
Stato avanzamento importo:	20.033.949,69

Stato avanzamento percentuale: 0,73
Data effettiva inizio lavori: 23/07/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 07/05/2012
Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: A seguito dell'atto aggiuntivo relativo ai lavori di II° stralcio I° sub stralcio opere intramoenia, è stato automaticamente esteso l'incarico di collaudo, sia statico che tecnico amministrativo.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2

Totale giorni sospensione: 175

Note: Per procedere sia alla bonifica da ordigni residuati bellici sia, successivamente, alle verifiche imposte dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Padova, i lavori sono stati sospesi del 31.10.2007 al 31.03.2008 per gg. 152.
In attesa della registrazione dell'atto aggiuntivo relativo al II° stralcio, I° sub stralcio opere intramoenia, i lavori, consegnati sotto riserva di legge, sono stati sospesi dal 04.04.2011 al 27.04.2011 per gg. 23.

Varianti:

Numero totale: 3

Giorni proroga totali: 480

Motivi:

Altri motivi: Durante il corso dei lavori del I° stralcio sono state predisposte due perizie suppletive e di variante che hanno comportato la prima una riduzione del tempo contrattuale di gg. 30 e la seconda un aumento del tempo contrattuale di gg. 30. E' stata anche concessa una proroga di gg. 30. Con l'atto aggiuntivo dei lavori di II° stralcio I° sub stralcio opere intramoenia è stato concesso un ulteriore tempo per eseguire i lavori di gg.450.

Importo: 26.828.602,90

Importo oneri sicurezza: 678.873,09

Somme a disposizione: 8.893.124,01

Totale: 36.400.600,00

Note:

Durante il corso dei lavori del I° stralcio sono state predisposte due perizie suppletive e di variante, anche per le modifiche al progetto richieste dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, relativamente agli impianti ed alle specifiche di sicurezza penitenziaria (grate celle, porte celle, serrature celle, impiantistica celle, ecc).

Tali varianti hanno comportato un importo per lavori netto di € 20.372.548,14-, un importo per oneri sicurezza di € 413.930,77- e per somme a disposizione di € 7.264.121,09-.

A seguito di successivo stanziamento di fondi, si è ritenuto necessario affidare, per univocità di responsabilità, i lavori intramoenia (II° stralcio - I° sub stralcio) agli stessi operatori (impresa e responsabile della sicurezza) che stavano eseguendo i lavori e servizi del I° stralcio, a fronte di una miglioria del 6,00% del ribasso originariamente offerto (16,33%), quindi per un ribasso complessivo del 22,33%.

Tali lavori hanno comportato un aumento dell'importo per lavori netto di € 6.456.054,76- un importo per oneri sicurezza di € 264.942,32- e per somme a disposizione di € 1.629.002,92, elevando l'importo complessivo del quadro economico dei due progetti assemblati da € 28.050.600,00- a € 36.400.600,00-.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2012

2° lotto - 2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Conclusa

Note:

La gara del I° lotto prevedeva la compilazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di tutto l'intervento. Per la limitazione del finanziamento previsto con il D.M. B3/2/743 del 19.04.2005, in un primo momento è stato realizzato il progetto preliminare complessivo, il progetto definitivo complessivo ed il progetto esecutivo del I° stralcio. In gara non è stato inserito l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, cui si è provveduto mediante atto aggiuntivo dell'importo di € 132.759,16-. L'adeguamento della parcella all'effettivo importo progettuale ha comportato una maggiore spesa di € 62.420,14-. Pertanto l'importo totale della progettazione, con il progetto esecutivo del solo I° stralcio, è pari a € 1.447.252,30-. A seguito dello stanziamento di ulteriori fondi, con apposito atto aggiuntivo al contratto, è stato affidato allo stesso RTI, a fronte di una miglioria del 5% dell'offerta originaria, l'incarico di compilazione del progetto esecutivo di II° stralcio, che per motivi di esecuzione è stato suddiviso in due sub stralci, il I° sub stralcio relativo alle opere intramoenia ed il II° sub stralcio relativo alle opere extramoenia. L'importo della progettazione esecutiva del II° stralcio, I° substralcio opere intramoenia, è pari a € 157.628,21- e quindi l'importo totale della progettazione preliminare e definitiva dell'intero intervento ed esecutiva delle opere intramoenia ammonta ad € 1.604.880,51-. La scheda attuale si riferisce alla progettazione esecutiva del II° stralcio II° sub stralcio (opere extra moenia) già contrattualizzata con l'atto aggiuntivo già citato.

Progettazione esecutiva

CIPE:

Si

Importo lavori:

11.116.522,00

Servizio:

Esterno

Importo a base gara:

311.566,03

Importo di aggiudicazione:	200.549,40
Nome aggiudicatario:	R.T.I PLANARCH Srl - SVEI Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	15/07/2010
Data fine:	12/09/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Magistrato alle Acque - provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di venezia
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	450 giorni
Data bando:	08/06/2011
CIG/CUI:	26888079B8
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
Quadro economico:	
Importo a base gara:	10.819.238,54
Importo oneri per la sicurezza:	297.313,46
Importo complessivo a base di gara:	11.116.552,00
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	2.133.448,00
Totale:	13.250.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2014

Nuovo istituto penitenziario di Savona

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: L'importo dei lavori andati in gara è inferiore a quello dei lavori progettati per riduzione del finanziamento.

Progettazione definitiva

CIPE: No
Importo lavori: 32.000.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 935.124,34
Importo di aggiudicazione: 935.124,34
Nome aggiudicatario: ATP CRAVEDI, GHILLANI, ZATTERA
Codice fiscale aggiudicatario: CRVGRG41L19G337R
Data inizio: 13/09/2004
Data fine: 17/12/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	120 giorni
Lavori:	1095 giorni
Data bando:	08/11/2006
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	24/07/2008
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI IM.A.C.IMPRESA APPALTI COSTRUZIONI SRL - EDILCONTRACT SRL - GESTECOS SRL - SO.IN.C. SRL - STUDIO LATINI SRL - ESE ENGINEERING SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	04013060589
Data contratto:	23/12/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	23.256.650,00
Importo oneri per la sicurezza:	1.295.010,18
Importo complessivo a base di gara:	24.551.660,18
Importo aggiudicazione:	22.200.412,86
Somme a disposizione:	5.414.900,02
Totale:	27.615.312,88
% Ribasso di aggiudicazione:	10,11
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'importo degli oneri di sicurezza è comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso pari ad € 525.228,36. Trattasi di appalto riservato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010 2014

Previsione al 30/04/2011 2014

Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:

Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011

Lotto 1

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: La progettazione del 1° stralcio è stata effettuata dal Nucleo Operativo di Reggio Calabria sulla base del progetto generale redatto dal RTI CMC - PIZZAROTTI.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 4.336.186,99
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 43.361,87
Data inizio: 27/08/1995
Data fine: 19/10/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 70 giorni
Lavori: 720 giorni
Data bando: 07/02/1992

CIG/CUI:

Data aggiudicazione: 23/04/1992
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CMC - PIZZAROTTI SPA
Codice fiscale aggiudicatario: 00084280395
Data contratto: 06/03/1996

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.119.888,97
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara: 4.119.888,97
Importo aggiudicazione: 3.924.194,24
Somme a disposizione: 1.044.680,02
Totale: 4.968.874,26
% Ribasso di aggiudicazione: 4,75
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

Per la realizzazione dell'opera era stato prescelto il sistema della concessione di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Previa gara esplorativa veniva individuato il RTI CMC (capogruppo). PIZZAROTTI SPA con il ribasso del 4,75%. A seguito dei divieti imposti dalla subentrata Legge 109/94, tale sistema veniva scartato e sostituito con contratto a trattativa privata con il RTI che si era assicurata la concessione.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 18/04/1996
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 3.500.077,00
Stato avanzamento percentuale: 84,14
Data effettiva inizio lavori: 18/04/1996
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 02/10/2000
Tempi realizzazione: In ritardo - L'impresa ha abbandonato i lavori spontaneamente, senza mai riavviarli nonostante 14 ordini di servizio. Successivamente ha avviato arbitrato per rescissione del contratto.

Data collaudo statico:**Data collaudo tecnico-amministrativo:****Note:**

I collaudi Statico e tecnico-amministrativo sono in corso

Contenzioso:**Totale riserve definite:****Importo totale riserve definite:****Totale riserve da definire:****Note:**

Tutte le riserve apposte dal RTI sul registro di contabilità (nr. 12) sono state oggetto di arbitrato.

Sospensione lavori:**Numero totale:**

3

Totale giorni sospensione:

579

Note:

La sospensione nr. 1 di giorni 486 si è resa necessaria perchè la Corte dei conti di Catanzaro ha ricusato il visto sul contratto a trattativa privata del 6/3/1996 nr. 1502.

La sospensione nr. 2 di giorni 51 per inaccessibilità dei mezzi pesanti della strada di accesso al cantiere.

la sospensione nr. 3 di giorni 42 per causa di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche).

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

Lotto 2

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Si è trattato non di gara, ma di un affidamento della progettazione sulla base del contratto a trattativa privata del 06/03/1996, le date di inizio e fine si riferiscono al D.P di incarico e al voto del CTA che ha espresso parere favorevole-L'importo dei lavori è comprensivo dell'aggiornamento dei prezzi del 6% e del ribasso di contratto del 4,75%

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 15.424.646,45
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 22.724.103,56
Importo di aggiudicazione: 22.724.103,56
Nome aggiudicatario: ATI-CMC Cooperativa Muratori e Cementisti -Ravenna-Pizzarotti & C SpA-Noceto(PR)
Codice fiscale aggiudicatario: 000084280395-017
Data inizio: 29/10/1999
Data fine: 21/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione

Critério di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 720 giorni
Data bando: 06/03/1996
CIG/CUI: -----
Data aggiudicazione: 30/12/1999
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI-CMC Cooperativa Muratori e Cementisti -Ravenna-Pizzarotti &C-
 Noceto(PR)
Codice fiscale aggiudicatario: 000084280395-017
Data contratto: 30/12/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 15.424.646,45
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 15.424.646,45
Importo aggiudicazione: 15.425.646,45
Somme a disposizione: 7.299.457,11
Totale: 22.725.103,56

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: I lavori sono stati affidati con atto aggiuntivo n.1 del 30/12/1999 n.1759 di rep.al contratto a trattativa privata del 06/03/1996 n.1502 di rep.L'importo dei lavori è comprensivo dell'aggiornamento dei prezzi del 6% e del ribasso del 4,75% come da contratto.L'importo complessivo è composto per lavori principali e lavori aggiuntivi

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 19/12/2000
Data presunta fine lavori: 08/12/2002
Stato avanzamento importo: 13.197.172,00
Stato avanzamento percentuale: 96,86
Data effettiva inizio lavori: 19/12/2000
Data effettiva fine lavori: 17/04/2003
Data presunta fine lavori varianti: 17/04/2003
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 02/07/2004
Data collaudo tecnico-amministrativo: 02/03/2007

Note: I certificati di collaudo hanno attestato la collaudabilità delle opere

Contenzioso:

Totale riserve definite: 15
Importo totale riserve definite: 0,00
Totale riserve da definire: 0

Note: Il contenzioso instaurato dall'impresa che è sfociato nella richiesta di n.2 lodi arbitrali (12/02/2003-24/10/2007),afferisce non sui lavori di secondo lotto in particolare,ma al contratto a trattativa privata iniziale e a lavori del primo lotto.

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00


Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL
150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA
Venezia - Palazzo del cinema**

SCHEDA N. 185

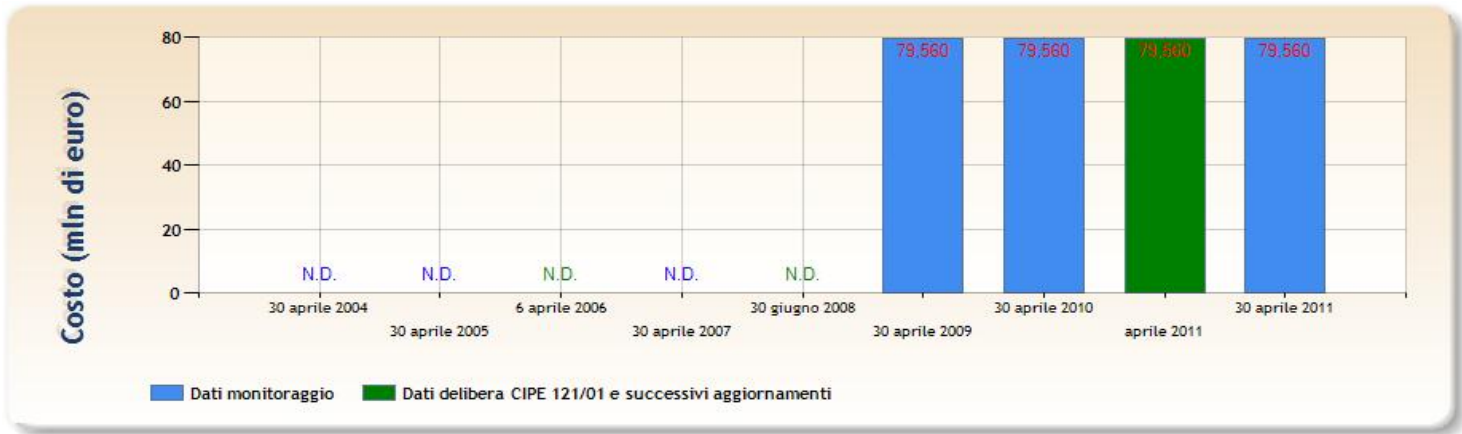

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Altra edilizia pubblica

Commissario straordinario per l'opera
"Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia"

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori sospesi

DELIBERE CIPE

105/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

Lavori sospesi

DESCRIZIONE

La realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia rappresenta una delle grandi opere per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

Il nuovo Palazzo è stato progettato dallo Studio 5+1AA Rudy Ricciotti, capofila dell'associazione di professionisti vincitrice del concorso internazionale bandito nel 2004 dalla Biennale di Venezia.

Esso rappresenta non solo un'opera tecnologicamente all'avanguardia, ma anche un intervento di riqualificazione urbana: 22.700 m2 di superficie totale, 2.700 posti a sedere in tre sale, una Piazza del Cinema coperta di oltre 3.600 m2 destinati ad area espositiva. Un volume complessivo di 137.000 metri cubi, rivestito da un mosaico di vetro color oro e sabbia.

DATI STORICI

2004

La Fondazione Biennale di Venezia pubblica il bando per il concorso internazionale di progettazione per il Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia.

2005

Il concorso viene aggiudicato allo Studio 5+1AA Rudy Ricciotti, capofila di una associazione di professionisti.

2007

L'intervento è inserito nel "Protocollo di Intesa regolante le modalità di riqualificazione dell'isola del Lido attraverso la valorizzazione delle aree dell'ex Ospedale al mare, il miglioramento dei servizi sanitari dell'isola e la costruzione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi", sottoscritto il 9 maggio dal MBAC, la Regione Veneto, il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12. La Regione e il Comune di Venezia si impegnano a cofinanziare il nuovo palazzo del cinema e dei congressi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 20 giugno, chiede l'inserimento del Programma delle opere connesse alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia nel DPEF 2008-2012, ai fini del cofinanziamento con le risorse della legge obiettivo.

Nel DPEF 2008-2012 l'intervento viene inserito nel PIS ai soli fini delle procedure di approvazione.

Il CIPE, con delibera n. 45, esprime parere favorevole sul DPEF 2008-2012 – allegato infrastrutture, nel quale, per la celebrazione per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è inserito anche il nuovo "Palazzo del cinema e dei congressi". Gli interventi sono inseriti nel PIS ai soli fini delle procedure di approvazione.

Con DPCM 13 luglio viene individuato il soggetto aggiudicatore nella persona dell'ing. Antonio Maffey, Commissario straordinario per l'opera "nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia"

La Soprintendenza per i beni architettonici di Venezia esprime parere favorevole al progetto con nota del 26 luglio.

Il CIPE, con delibera n. 87, assegna all'opera un finanziamento – in termini di volume di investimenti – di 20 Meuro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), quale anticipazione della quota di cofinanziamento statale, al fine di permettere il tempestivo avvio delle procedure.

Il giorno 21, il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria relativa al nuovo palazzo del cinema integrata con le note 27 settembre e del 3 ottobre.

Il MIT chiede al Ministro per gli affari regionali l'iscrizione all'o.d.g. della seduta del 26 settembre della Conferenza Unificata dell'intervento per la concessione dell'intesa per perfezionare l'inserimento dell'intervento nel PIS. Con nota n. 388 la richiesta di intesa viene estesa anche al finanziamento, a valere sulle risorse assegnate al PIS, degli interventi connessi alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

La Regione Veneto, con nota del 27 settembre, esprime il parere relativo alla localizzazione dell'opera, che non

necessita di VIA.

L'art. 36 del decreto legge n. 159, autorizza la spesa di 150 Meuro per l'anno 2007 per la realizzazione delle opere e delle iniziative connesse alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Con nota 1° ottobre, viene trasmessa al CIPE copia dell'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 settembre.

Il CIPE, con delibera n. 105, approva il progetto preliminare per un costo di 79,6 Meuro, di cui 60 per lavori e 19,6 per somme a disposizione, individua la copertura finanziaria e revoca il contributo quindicennale a titolo di anticipazione assegnato con delibera CIPE 87/2007.

Il 24 ottobre la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sulla GUCE il bando di gara a procedura aperta per la "Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la costruzione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia Lido", per un importo complessivo di a base di gara 75,4 Meuro, di cui 68,4 per lavori, 4,1 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 2,9 per oneri di progettazione.

Con DPCM 23 novembre, l'opera è inserita tra gli interventi prioritari afferenti alle celebrazioni per il "150° Anniversario dell'Unità d'Italia" che hanno ottenuto la dichiarazione di "Grande Evento".

2008

Il giorno 13 l'appalto integrato viene aggiudicato alla Sacaim Spa di Venezia, capofila di una associazione temporanea di imprese con Officine Tosoni Lino Spa, Intini Angelo Srl, Picalarga Srl – Gemmo Impianti.

Il 3 marzo viene stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 agosto, autorizza la realizzazione dell'intervento sulla scorta dell'esito favorevole della CdS espresso sul progetto definitivo in data 25 giugno.

Il 28 agosto viene ufficialmente aperto il cantiere ed il 13 ottobre vengono consegnati i lavori.

2009

La delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS al febbraio 2009 non include il "nuovo palazzo del Cinema e dei congressi di Venezia, considerato che nessun ulteriore adempimento è stato effettuato dopo l'approvazione del progetto preliminare di cui alla delibera n. 105/2007 e tenuto conto che l'efficacia della delibera stessa è subordinata alla stipula di apposito atto aggiuntivo con la Regione Veneto che includa esplicitamente l'opera tra le infrastrutture oggetto dell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Veneto, così come previsto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, e la cui sottoscrizione non risulta sinora comunicata al DIPE". Con OPCM n. 3746 del 12 marzo 2009 viene nominato il Commissario Delegato per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema.

Con OPCM n. 3759 del 30 aprile 2009, sono dettate disposizioni urgenti per la rapida realizzazione dell'opera. Il Commissario è autorizzato alla deroga rispetto alle valutazioni ambientali e gli oneri per il Comitato tecnico-amministrativo possono essere oggetto di anticipazione da parte del Fondo della protezione civile. Il Commissario è inoltre delegato a: "procedere, in nome e per conto del Comune di Venezia, all'espletamento delle procedure selettive accelerate finalizzate alla diminuzione e rifunzionalizzazione dell'Ospedale al Mare e alla acquisizione dei conseguenti proventi per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia".

Il 3 luglio 2009 la Commissione di Salvaguardia approva il piano di smaltimento rifiuti tossici trovati nell'area di scavo. Nel DPEF 2010-2013 l'opera è inserita nella "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" con un costo di 79,6 Meuro, con uno stato dell'arte "finanziati in corso".

Il 23 settembre si tiene la Conferenza di Servizi in cui vengono approvati i progetti preliminari per gli alberghi Des Bains ed Excelsior, Staff House, il Forte Malamocco, spiagge e Lungomare Marconi e i criteri generali del bando di gara per l'assegnazione del complesso dell'ex Ospedale al mare.

Il commissario straordinario pubblica, il 5 ottobre 2009, il bando di gara "per la realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo del compendio immobiliare dell'ex Ospedale al mare" del lido di Venezia ed aree di prossimità". Il bando prevede la vendita in 3 lotti delle aree interessate .

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 3003 in data 20 ottobre 2009, dispone di destinare al Commissario Delegato la somma complessiva di 10 meuro.

Il 6 novembre viene sottoscritto il 2° Atto aggiuntivo all'IGQ Regione del Veneto nel quale l'opera non è inserita.

A Novembre la gara viene aggiudicata all'unico concorrente, la EstCapital, per un importo di 81.040.000,00 euro. Il 10 dicembre si svolge la Conferenza di Servizi per l'approvazione dei progetti definitivi, relativi alle aree ex Ospedale a mare, presentati dal Promotore.

A seguito dell'approvazione di tutti i progetti (tranne il Parco delle rose) da parte della Conferenza di Servizi (atto di garanzia per l'acquirente, cui la stipula del rogito era subordinata), il 30 dicembre viene stipulato il contratto con il Promotore.

2010

Il direttore dei lavori del Palazzo del cinema, con nota del 24 febbraio, al fine di risolvere il problema posto dal rinvenimento di eternit, dispone la sospensione parziale dei lavori, che saranno completamente sospesi con verbale del 10 giugno.

I rapporti tra Regione e Commissario delegato per il trasferimento delle risorse vengono regolamentati da apposita convenzione, sottoscritta in data 9 giugno.

Con Ordinanza commissariale n. 21 del 13 settembre si quantifica in via provvisoria in 2,5 Meuro il maggior onere derivante dalla gestione delle terre di scavo.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "150 Anniversario Unità d'Italia - Nuovo palazzo del cinema, dei congressi di Venezia" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Il 10 gennaio viene riaperto il cantiere. La soluzione prevede l'insaccamento del terreno asportato che viene quindi avviato alle discariche autorizzate di terraferma. Ciò ha come conseguenza la lievitazione dei costi e il rallentamento dei lavori.

Il 7 marzo viene pubblicato il bando di gara per l'alienazione dell'area denominata "La Favorita" situata all'interno del compendio immobiliare dell'Ex Ospedale al Mare.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 29 marzo, la Regione prende atto degli esiti delle CdS del 30 dicembre 2010, 17 e 24 febbraio 2011, inerenti gli interventi di riqualificazione dell'isola del Lido collegati e/o connessi con la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e si attiva per gli ulteriori adempimenti di propria competenza.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "150 Anniversario Unità d'Italia - Nuovo palazzo del cinema, dei congressi di Venezia" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che: è in corso la terza sospensione dei lavori; i lavori sono in ritardo a causa del rinvenimento di amianto e della conseguente attivazione di smaltimento di terre contaminate; l'avanzamento è del 30%; l'ultimazione è prevista a luglio 2012.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	79,560 Fonte: Delibera CIPE 105/2007
Previsione di costo al 30 aprile 2010	79,560 Fonte: DPEF 2010-2013

Costo ad aprile 2011 79,560 **Fonte:** DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011 79,560 **Fonte:** DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. **Fonte:**
Risorse disponibili ad aprile 2011 79,560 **Fonte:** DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	79,560
Regione Veneto	10,000 Fonte: Delibera CIPE 105/2007
Comune di Venezia	49,560 Fonte: Delibera CIPE 105/2007
Fondi Pubblici	20,000 Fonte: Delibera CIPE 105/2007

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:

Progettazione definitiva

CIPE: No
Importo lavori: 87.850.035,78
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 2.898.726,49
Importo di aggiudicazione: 2.327.967,25
Nome aggiudicatario: ATI SACAIM
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 03/03/2008
Data fine: 28/11/2008

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Commissario straordinario per l'opera "Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia"
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Preliminare
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 90 giorni
Lavori: 780 giorni
Data bando: 19/10/2007
CIG/CUI: 88025087
Data aggiudicazione: 28/12/2007
Tipo aggiudicatario: ATI

Nome aggiudicatario:	ATI SACAIM
Codice fiscale aggiudicatario:	03134600273
Data contratto:	03/03/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	71.290.558,58
Importo oneri per la sicurezza:	4.076.330,19
Importo complessivo a base di gara:	75.366.888,77
Importo aggiudicazione:	61.329.777,79
Somme a disposizione:	19.117.899,76
Totale:	80.447.677,55
% Ribasso di aggiudicazione:	19,69
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	I SOPRA ELECANTI IMPORTI SONO DEGLI IMPEGNI DI SPESA, DI CUI SOLO UNA PARTE E' STATA EFFETTIVAMENTE RESA DISPONIBILE.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	18/07/2009
Data presunta fine lavori:	08/04/2011
Stato avanzamento importo:	31.200.000,00
Stato avanzamento percentuale:	30,00
Data effettiva inizio lavori:	18/07/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	13/07/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo - RINVENIMENTO AMIANTO E ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SMALTIMENTO TERRE CONTAMINATE
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	3
Totale giorni sospensione:	252
Note:	LA TERZA SOSPENSIONE E' IN CORSO

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	210
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	8.241.545,98
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	8.241.545,98

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Intesa Conferenza Unificata del 26 Settembre 2007

Delibera CIPE 105/2007

del 4 Ottobre 2007

Bando di gara Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo -
Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia del 24 Ottobre 2007

Avviso di aggiudicazione del 21 Febbraio 2008

OPCM n. 3746 del 12 Marzo 2009

OPCM n. 3759

del 30 Aprile 2009


2° Atto aggiuntivo all'IGQ Regione del Veneto del 6 Novembre 2009

Delibera Regione Veneto DGR n. 332 del 29 Marzo 2011

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA

Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico

SCHEDA N. 186

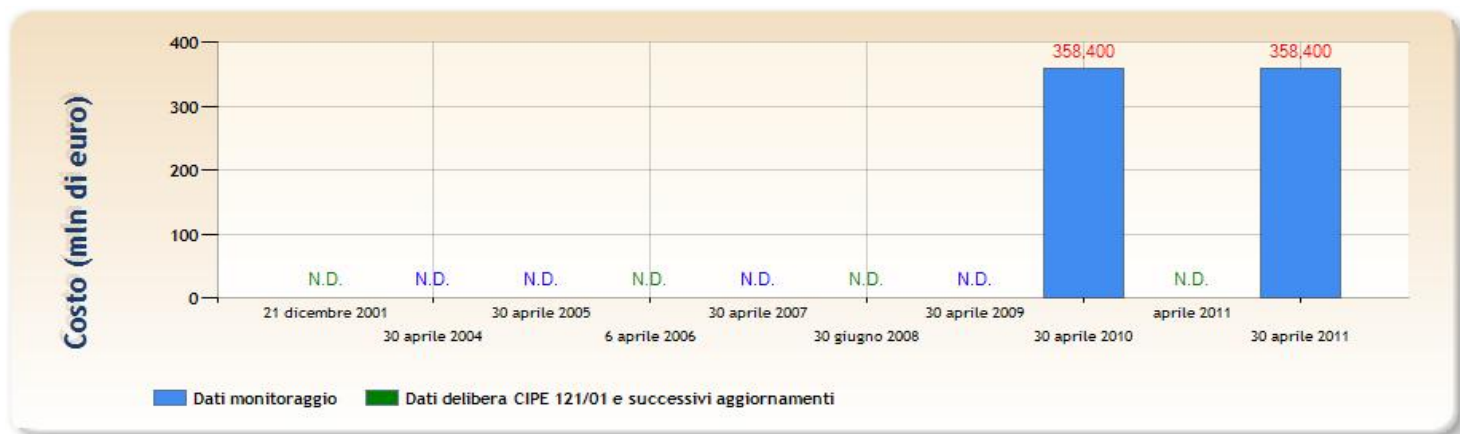

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia scolastica

Più Comuni e Province

STATO DI ATTUAZIONE

Stato di attuazione non classificabile

DELIBERE CIPE

32/2010

67/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

Nel 2010 il MIT, di concerto con il MIUR, ha predisposto un “piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico”, che prevede la realizzazione di 1.706 interventi. Si tratta di un nuovo programma di interventi, dopo il “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” e successive rimodulazioni, selezionati tra oltre 6.900 richieste degli Enti interessati, per un costo totale di oltre 950 milioni di euro.

DATI STORICI

2002

La legge n. 289 (finanziaria 2003), agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate.

2008

L'art. 6-quinquies del decreto legge n. 112 istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (“Fondo infrastrutture”).

L'art. 18 del decreto legge n. 185 dispone che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

Il CIPE, con delibera n. 112, assegna 7.356 Meuro al Fondo infrastrutture per interventi di competenza del MIT.

2009

La Conferenza Unificata del 28 gennaio sancisce l'intesa sugli indirizzi del “Piano straordinario stralcio”.

Il CIPE, con delibera n. 3, assegna 5 miliardi di euro al Fondo infrastrutture, con una destinazione di 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 Meuro per l'edilizia carceraria.

L'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 riserva alla Regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del decreto legge n. 185/2008, e autorizza la Regione a modificare il Piano annuale 2009 di edilizia scolastica.

Il CIPE, con delibera n. 51, definisce le disponibilità del Fondo infrastrutture e approva l'elenco degli interventi da attivare nel triennio, prevalentemente riferiti a opere strategiche, con identificazione delle relative fonti di copertura.

2010

Il 29 aprile la Conferenza unificata esprime il proprio parere sul Piano straordinario stralcio, parere poi rettificato con atto del 7 maggio.

Il MIT, con nota del 10 maggio n. 2223, trasmette al CIPE la versione definitiva del Piano straordinario stralcio, con allegata la relazione di sintesi e lo schema di convenzione tra Stato ed enti locali.

Il CIPE, con delibera n. 32, prende atto che, dalla Relazione di sintesi sul Piano straordinario stralcio, risultano più di 6.900 richieste, per un totale di oltre 950 Meuro, e che il MIT, di concerto con il MIUR, ha messo a punto un primo piano per la realizzazione di 1706 interventi urgenti, piano approvato dalla Conferenza Unificata. Per tali interventi è stato predisposto uno schema di convenzione tra Stato (provveditorato interregionale per le opere pubbliche) ed ente proprietario, con la possibilità per l'ente di avvalersi delle strutture dei provveditorati per la progettazione, la direzione dei lavori e le attività di supporto al responsabile del procedimento. Il CIPE assegna 358,4 Meuro - a valere sui 1.000 Meuro di cui alla delibera 3/2009 - agli enti locali proprietari degli edifici scolastici indicati nel «Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico», allegato alla delibera stessa e articolato in tabelle suddivise per regione.

Il CIPE, con delibera n. 67, rettifica l'elenco degli interventi del Piano straordinario relativi alla Regione Liguria (allegato alla delibera n. 32/2010, dal n. 516 al n. 526).

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'intervento non è riportato.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'intervento non è riportato.

PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (Allegato alla del. CIPE 32/2010)

Riepilogo		
Regione	N. interventi	Programma
Abruzzo	65	9 115 000
Basilicata	27	5 920 000
Calabria	28	12 774 000
Campania	101	38 878 000
Emilia Romagna	125	20 954 000
Friuli Venezia Giulia	5	6 218 000
Lazio	154	35 495 000
Liguria	43	7 714 000
Lombardia	152	49 890 000
Marche	42	10 510 000
Molise	15	2 007 000
P.A. di Bolzano	-	-
P.A. di Trento	-	-
Piemonte	83	28 950 000
Puglia	181	25 089 000
Sardegna	99	13 052 000
Sicilia	296	36 310 000
Toscana	64	20 133 000
Umbria	37	6 998 000
Valle d'Aosta	3	875 000
Veneto	186	27 000 000
Totale	1 706	358 422 000

Fonte: Delibera CIPE 32/2010 (Allegato)

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	358,400 Fonte:
Costo ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	358,400 Fonte: Delibera CIPE 32/2010

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	358,400
Fondo Infrastrutture	358,400 Fonte: Delibera CIPE 32/2010

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto legge n. 112 (art. 6-quinquies)

del 25 Giugno 2008

Decreto legge n. 185 (art. 18) del 29 Novembre 2008

Delibera CIPE112/2008 del 18 Dicembre 2008

Conferenza Unificata del 28 Gennaio 2009

Delibera CIPE 3/2009 del 6 Marzo 2009

Decreto legge n. 39 (art. 4, comma 4) del 28 Aprile 2009

Decreto legge n. 39 del 28 Aprile 2009

Delibera CIPE 51/2009 del 26 Giugno 2009

Conferenza Unificata del 29 Aprile 2010


Delibera CIPE 32/2010 del 13 Maggio 2010

Delibera CIPE 67/2010 del 22 Luglio 2010

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA

Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese

SCHEDA N. 187

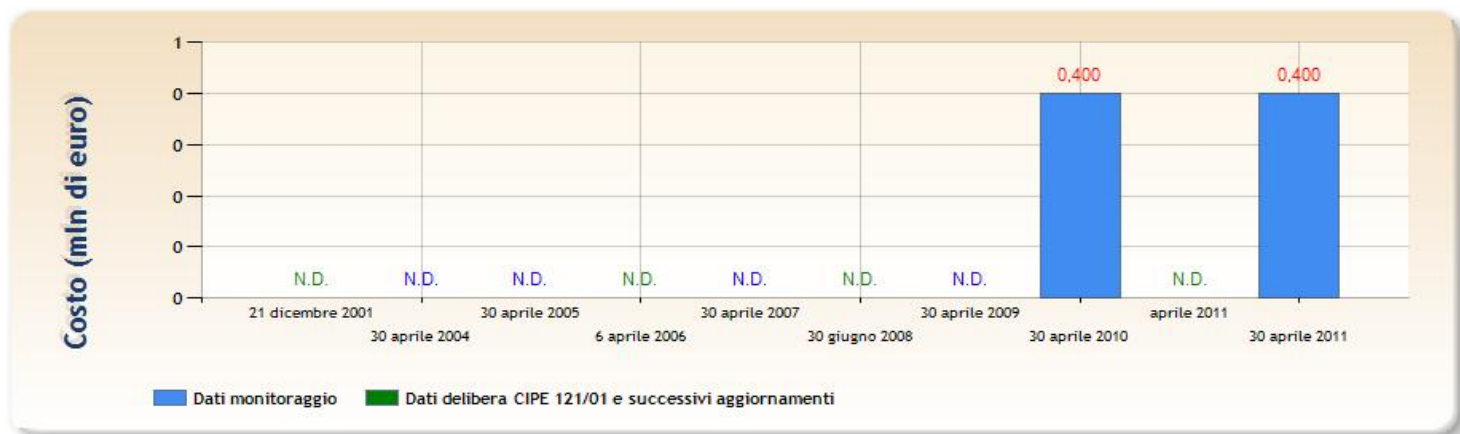

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia scolastica

Scuola Europea di Varese

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

103/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

2012

DESCRIZIONE

Le Scuole Europee sono scuole di istruzione pubblica, governate da un protocollo intergovernativo firmato dai sei Stati membri originari a Lussemburgo il 12 aprile 1957. La Scuola Europea di Varese, istituita nel 1960, è una delle 14 Scuole Europee esistenti nell'Unione europea, costruita inizialmente per ospitare ed educare i figli dei dipendenti del Centro Comune di Ricerca di Ispra. A seguito dell'allargamento dell'Unione Europea, il numero degli studenti è aumentato notevolmente. Attualmente la scuola ospita circa 1330 ragazzi di diversa nazionalità, nelle sezioni di scuola materna, elementare, media e superiore. Gli edifici, di proprietà dello stato italiano, risultano quindi inadeguati alle nuove esigenze ed è necessario sia l'ampliamento delle strutture che la manutenzione ordinaria delle sedi esistenti, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

DATI STORICI

1966

La legge n. 1270 del 29 dicembre ratifica l'Accordo tra il Governo Italiano e la Comunità Europea, firmato nel settembre 1963, con cui sono definite, tra l'altro, le condizioni di operatività della Scuola Europea di Varese. L'art.1 stabilisce che la manutenzione ordinaria degli edifici è a carico dello Stato italiano

2002

La legge n. 289 (finanziaria 2003), agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate. La stessa legge prevede che, nell'ambito della legge obiettivo, il MIT, di concerto con il MIUR, predisponga un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" nelle zone a rischio sismico (art. 80, comma 21).

2006

Il 20 aprile il vice presidente della Commissione Europea e responsabile delle Scuole Europee, Siim Kallas, in visita istituzionale in Italia, sottolinea la necessità di un adeguamento della struttura esistente e si impegna a è statointervenire in tutte le sedi competenti per la soluzione del caso. Il costo dei primi interventi necessari viene stimato in circa 1 milione 200 mila euro.

2008

L'art. 6-quinquies del decreto legge n. 112 istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ("Fondo Infrastrutture").

L'art. 18 del decreto legge n. 185 dispone che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo Infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

Il CIPE, con delibera n. 112, assegna 7.356 Meuro al Fondo Infrastrutture per interventi di competenza del MIT.

Nella "Relazione annuale della Commissione europea al Parlamento europeo sul funzionamento del sistema delle scuole europee nel 2007" si riporta che: "A Varese, l'inadeguatezza delle infrastrutture permane la maggiore difficoltà per la scuola. Nel 2006, il segretario generale delle scuole europee e il vicepresidente della Commissione Kallas sollecitano le autorità italiane a stanziare una dotazione aggiuntiva per la scuola. La necessità viene ribadita anche nelle relazioni degli anni seguenti. Purtroppo, nel 2007 le autorità non accordano la dotazione supplementare, malgrado una petizione firmata da oltre 1200 genitori, e riducono il consueto stanziamento.

2009

Il CIPE, con delibera n. 3, assegna 5 miliardi di euro al Fondo Infrastrutture, con una destinazione di 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 Meuro per l'edilizia carceraria.

In maggio il vicepresidente Kallas invia al Presidente del Consiglio una lettera, in cui si sollecita un'azione delle autorità italiane a favore della Scuola di Varese.

Il CIPE, con delibera n. 51, definisce le disponibilità del Fondo Infrastrutture e approva l'elenco degli interventi da

attivare nel triennio, prevalentemente riferiti a opere strategiche, con indicazione delle relative fonti di copertura. L'Allegato opere infrastrutturali al DPEF 2009-2013, riporta l'opera "Piano Straordinario per l'Edilizia scolastica e messa in sicurezza" nella tabella "14: La manovra Triennale 2009 – 2011".

2010

Il 31 maggio la Scuola Europea pubblica sulla GUCE i bandi di gara per l'affidamento di 3 accordi quadro con un unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria e/o ordinaria degli edifici scolastici, degli impianti e del parco.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'intervento non è riportato.

Il CIPE, con delibera n. 103, assegna 400 mila euro alla Scuola Europea di Varese, a valere sulla destinazione di 1.000 Meuro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, disposta con delibera n. 3/2009, nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 Meuro a favore del Fondo infrastrutture.

Il 1 dicembre la Scuola Europea aggiudica i tre accordi quadro.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'intervento non è riportato.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	0,400 Fonte:
Costo ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	0,400 Fonte: Delibera CIPE 103/2010

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	0,400
Fondo Infrastrutture	0,400 Fonte: Delibera CIPE 103/2010

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo tra il Governo Italiano e la Comunità Europea

del Settembre 1963

Legge n.1270

del 29 Dicembre 1966


Relazione annuale della Commissione europea al Parlamento europeo sul funzionamento del sistema delle scuole europee nel 2007 - COM (2008) 378 definitivo del 24 Giugno 2008

Delibera CIPE103/2010

del 18 Novembre 2010

**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL
150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA
Firenze - Parco della musica**

SCHEDA N. 188

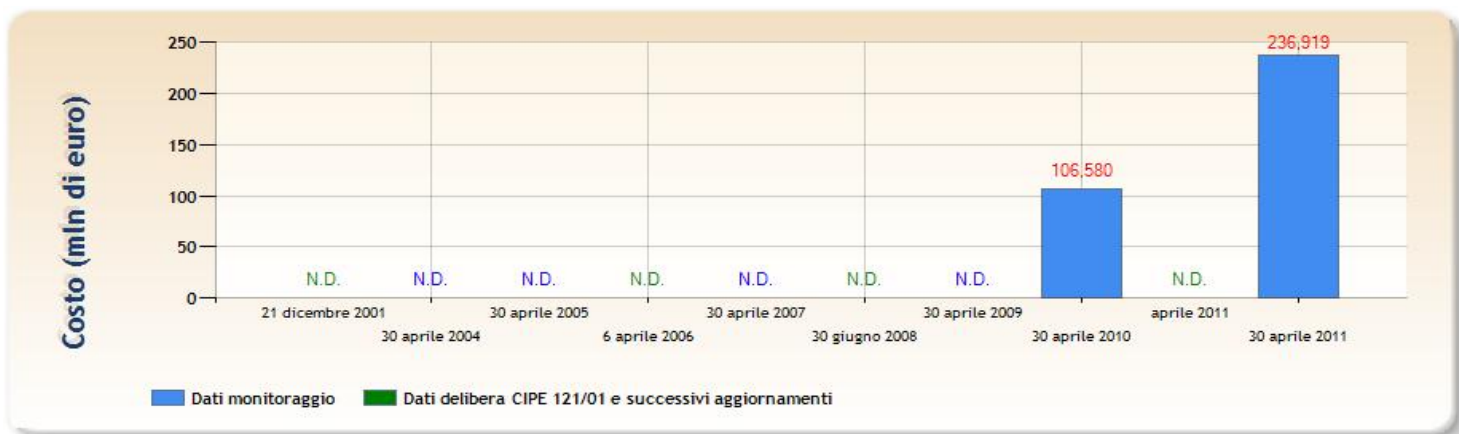

LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Altra edilizia pubblica

Commissario delegato per la realizzazione del "Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze"

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

Seduta CIPE 5 maggio 2011

ULTIMAZIONE LAVORI

DESCRIZIONE

L'intervento denominato "Firenze - Parco della musica" rientra tra quelli individuati dal "Comitato dei Ministri per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia", per la pianificazione di interventi infrastrutturali volti alla realizzazione ed al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico interessanti l'intero territorio nazionale. Il progetto riguarda la riqualificazione di un'area in disuso in prossimità della Stazione Leopolda e del Parco Reale delle Cascine e prevede la realizzazione di una Sala per l'Opera da 2000 posti, una per concerti da 1000 posti e una Arena all'aperto da 2000 posti per opera e concerti. L'intervento è accompagnato dalle sistemazioni esterne della piazza antistante e di una piccola collina artificiale intorno all'Arena.

DATI STORICI

2007

Il DPCM del 24 aprile istituisce il Comitato interministeriale, al quale sono affidate, in raccordo con le amministrazioni regionali e locali interessate, le attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità nazionale.

Con DPCM del 15 giugno è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, incaricata di fornire supporto al Comitato Interministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 20 giugno, chiede l'inserimento del Programma delle opere connesse alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia nel DPEF 2008-2012, ai fini del cofinanziamento con le risorse della Legge obiettivo.

Nel DPEF 2008-2012 l'intervento viene inserito nel PIS ai soli fini delle procedure di approvazione.

Il CIPE, con delibera n. 45, esprime parere favorevole sul DPEF 2008-2012 – allegato infrastrutture, nel quale, per la celebrazione per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è inserito anche il nuovo "Parco della musica". Gli interventi sono inseriti nel PIS ai soli fini delle procedure di approvazione.

Con provvedimento n. 80 del 18 ottobre, la Struttura di Missione indice la gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, per un importo a base d'asta per lavori a corpo e a misura di 80 Meuro. La gara d'appalto avviene sulla base del progetto preliminare, sviluppato dalla Struttura di Missione e prevede la presentazione in offerta del progetto definitivo.

Il DPCM del 23 novembre dichiara «grande evento» il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Con OPCM n. 3632 del 23 novembre, si autorizza la deroga in tema di VIA e di VAS, nonché delle direttive europee in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture. Con la stessa ordinanza è nominato Commissario delegato per l'intervento l'ing. Fabio De Santis.

La CdS sul progetto preliminare dell'intervento viene convocata in prima seduta per il 17 dicembre.

Il 31 dicembre la gara viene aggiudicata all'Associazione temporanea d'impresa S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A. – I.G.I.T. S.p.A.

2008

Il 25 febbraio il Comitato Tecnico Scientifico della Struttura di missione valuta che il progetto definitivo, presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, consente l'avvio delle fasi di 'contrattualizzazione' e di successivo approfondimento a livello esecutivo.

In data 27 febbraio viene stipulato il contratto con l'Associazione S.A.C. S.p.A. – I.G.I.T. S.p.A..

La CdS per l'approvazione del progetto definitivo inizia in data 27 marzo e si concluderà il 20 novembre.

Nel DPEF 2008-2012 l'intervento viene inserito nel PIS ai soli fini delle procedure di approvazione.

Il CIPE, con delibera n. 45, esprime parere favorevole sul DPEF 2008-2012 – allegato infrastrutture, nel quale, per la celebrazione per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'intervento è inserito ai soli fini delle procedure di approvazione.

Il MIT chiede al Ministro per gli affari regionali l'iscrizione all'o.d.g. della seduta del 26 settembre della Conferenza Unificata dell'intervento per la concessione dell'intesa per perfezionare l'inserimento dell'intervento nel PIS. Con nota n. 388 la richiesta di intesa viene estesa anche al finanziamento, a valere sulle risorse assegnate al PIS, degli interventi connessi alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

L'art. 36 del decreto legge n. 159, autorizza la spesa di 150 Meuro per l'anno 2007 per la realizzazione delle opere e delle iniziative connesse alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

La Giunta regionale, con delibera n. 745 del 29 settembre, approva lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Ferrovie dello Stato S.p.A. per la riqualificazione urbanistica delle aree ferroviarie di Porta al Prato, Belfiore, Centrale del Latte, Campo di Marte e Romito in Firenze. Nel Protocollo è prevista la cessione al Comune di Firenze delle aree per il Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze.

La firma del Protocollo d'intesa fra gli Enti territoriali coinvolti e Ferrovie dello Stato S.p.A., avviene in data 27 ottobre.

Il 5 novembre la Commissione Tecnica esprime parere favorevole sul progetto esecutivo, per la parte relativa ai lavori, e definitivo per quanto riguarda gli apparati scenotecnici e gli arredi. Il primo stralcio funzionale è comprensivo dei soli lavori.

2009

La delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS al febbraio 2009 non include l'intervento.

Il CIPE, con delibera n. 4 del 6 marzo, nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate, dispone una riserva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con finalità di programmazione strategica per il sostegno dell'economia reale e delle imprese. L'utilizzazione delle risorse deve essere deliberata dal CIPE, previo parere della Conferenza Stato Regioni su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il 30 settembre, con un atto aggiuntivo al contratto, si autorizza l'esecuzione dei lavori contemplati nel 1° stralcio funzionale (97,8 Meuro), fino alla concorrenza di circa 55 Meuro, pari all'importo del finanziamento disponibile.

Trenitalia conferma che dal 30 settembre cessa ogni attività produttiva nell'area interessata dai lavori.

Il giorno successivo è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, da effettuare in 600 giorni, con scadenza prevista per il 24 maggio 2011.

Il 24 novembre viene ufficialmente "posata la prima pietra" del nuovo Auditorium.

L'approvazione del progetto generale è ratificata con DD n.3444/09/Segr/2011 del 4 dicembre. Il progetto esecutivo presenta un importo complessivo pari a 236,9 Meuro, di cui 171,8 per lo 'stralcio' lavori. L'ulteriore 'stralcio', relativo all'attrezzatura della macchina scenica, gli arredi e l'illuminotecnica, prevede un importo complessivo di circa 65 Meuro, di cui 57,6 per lavori ed oneri di progettazione.

2010

Il 25 febbraio i soggetti cofinanziatori dell'intervento sottoscrivono un Accordo di programma per la ripartizione dei fondi necessari alla realizzazione del 1° stralcio funzionale.

A seguito dell'OPCM del 3 marzo si costituisce un nuovo ufficio tecnico, con il coordinamento del commissario Fabbri.

Il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori sono scelti dal Comune di Firenze.

Il TAR del Lazio, con sentenza n.04555/2010 REG. SEN., accoglie il ricorso della Gia.Fi. Costruzioni S.p.A, seconda classificata, e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità Nazionale al risarcimento del danno, pari ad 3,2 Meuro.

A maggio i lavori effettuati risultano circa il 30% del totale.

Il Consiglio di Stato – Sez. IV, nella Decisione n.06485/2010 REG.DEC., rileva "manifeste imperizie e negligenze" dell'amministrazione e "non chiari meccanismi di lievitazione dei costi" e trasmette quindi gli atti alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera non è riportata.

Con deliberazione n.68, approvata nell'Adunanza Consiliare del 3 novembre, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, a seguito dell'accertamento di evidenti irregolarità nella gestione dell'appalto, dispone di inviare la propria delibera al Commissario Delegato, alla Procura della Repubblica, per gli aspetti di competenza, e alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti. L'Autorità sottolinea che non c'è alcuna certezza, né temporale, né economica, sul completamento dell'opera nella sua integrità. La cifra prevista non garantisce la realizzazione completa approvata dal Comitato dei Ministri, riguardante il complesso denominato 'Nuovo Parco della Musica, ma solo un primo stralcio funzionale, costituito dalla sala teatrale principale e dagli ambienti accessori, mentre risultano necessari all'incirca altri 100 Meuro per assicurare – in un secondo momento – l'intera esecuzione del Parco della Musica e della Cultura.

2011

Il 13 gennaio viene firmato un "Protocollo di intesa per la definizione e finalizzazione di azioni condivise atte alla migliore valorizzazione dell'offerta culturale della città di Firenze", in cui il Ministro della cultura si impegna "a verificare le disponibilità nell'ambito delle proprie risorse, oppure a farsi parte diligente nei confronti del Governo, per il reperimento dei finanziamenti necessari al completamento dell'auditorium "Parco della musica e della cultura". Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera non è riportata.

Con nota dell'11 aprile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone l'assegnazione di fondi a favore dell'opera. La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 20 aprile, esprime parere favorevole.

Il CIPE, nella seduta del 5 maggio, assegna all'opera 19, 25 Meuro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la presidenza del Consiglio.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	106,580 Fonte: Struttura di Missione
Costo ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	236,919 Fonte: Delibera del Consiglio dell'AVCP n. 68

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	156,798
Comune di Firenze	42,500 Fonte: Delibera del Consiglio dell'AVCP n. 68
Regione Toscana	40,000 Fonte: Delibera del Consiglio dell'AVCP n. 68
Fondi Pubblici	74,298 Fonte: Delibera del Consiglio dell'AVCP n. 68

Fabbisogno residuo: **80,121**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-
amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

DPCM del 24 Aprile 2007

DPCM del 15 Giugno 2007

Intesa Conferenza Unificata

del 26 Settembre 2007

DPCM del 23 Novembre 2007

OPCM n. 3632 del 23 Novembre 2007

Avviso di aggiudicazione del 31 Dicembre 2007

Delibera Giunta regionale Toscana n. 745 del 29 Settembre 2008

Bando di gara Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo -

Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia del 18 Ottobre 2010

Delibera del Consiglio dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici, n. 68 del 3 Novembre 2010

Seduta CIPE del 5 Maggio 2011

