


SCHEMI IDRICI

MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento

SCHEDA N. 150



LOCALIZZAZIONE

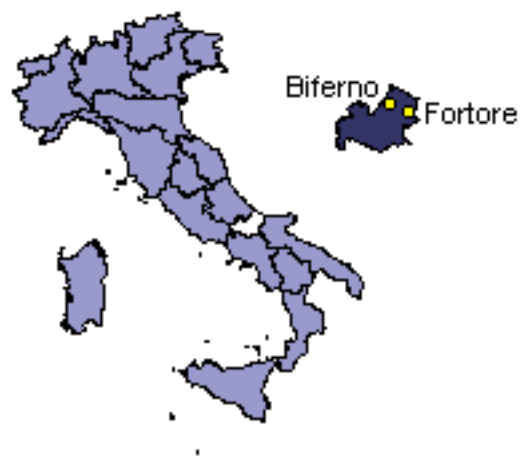

CUP:

G57H04000050001

SISTEMA INFRASTRUTTURALE:

Schemi idrici

SOGGETTO TITOLARE:

Consorzio di Bonifica Integrale
Larinense

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

ULTIMAZIONE LAVORI

2018

DESCRIZIONE

Il progetto prevede l'irrigazione, mediante l'utilizzo delle acque del fiume Biferno invasate dalla diga di Ponte Liscione, del comprensorio irriguo del Basso Molise ricadente nei Comuni di Ururi e San Martino in Pensilis tra le quote 200 e 120 metri s.l.m., nonché l'alimentazione di comprensori irrigui già eserciti ed alimentati con sollevamenti gestiti da questo Consorzio di bonifica (Piane Alte di Larino) e da quello di Termoli (contrada Saccione). In particolare, le opere previste nel 1° intervento consistono nel sifone di derivazione, nella condotta premente ed in quella adduttrice che alimenta i due distretti di nuova realizzazione ed i quattro già esistenti in agro di Larino e San Martino in Pensilis.

DELIBERE CIPE

153/2005

75/2006

99/2006

147/2006

DATI STORICI

2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 nel sottosistema "Schemi Idrici.

2003

Il Corpo Forestale dello Stato, con nota del 16 luglio, emette il nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

In data 4 dicembre si avvia il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

2004

La Regione Molise, sentiti i Comuni interessati, esprime parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione.

Il 12 gennaio si svolge la CdS. Lo stesso giorno, la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Molise esprime parere favorevole all'attraversamento dei suoli fratturali con alcune osservazioni e prescrizioni. Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR), nella seduta del 28 gennaio, esprime parere favorevole sul progetto definitivo per un importo di 77,5 Meuro, subordinatamente ad alcune prescrizioni.

Il RUP comunica che il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si è concluso con la scadenza dei termini di legge, senza osservazioni e opposizioni.

L'Assessorato all'ambiente della Regione Molise esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria sul progetto definitivo e l'integrazione alla relazione istruttoria, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del FAS.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Molise del 3 giugno.

Con la delibera n. 21, il CIPE destina i 1.130 Meuro della delibera n. 19/2004 – al netto di 23 Meuro destinati alla premialità – ed ulteriori 200 Meuro posti a disposizione dal MIT, al finanziamento di una serie di interventi tra cui figura (al decimo posto della graduatoria) l'opera "Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore" con un costo previsto di 77,5 Meuro. La delibera prevede inoltre che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta con successive delibere che dovranno definire il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende defianziato, nonché tempi e modalità di erogazioni.

L'opera, pur essendo stata inserita nell'elenco del Pre-CIPE del 20 dicembre, non figura esaminata né nella seduta del CIPE del 20 dicembre, né in quelle successive (18 marzo e 27 maggio 2005).

2005

Il Direttore generale Reti del MIT ed il Commissario ad acta per la gestione attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, in data 20 luglio, convengono che l'intervento è coerente con l'attuale programmazione del Ministero delle politiche agricole e chiedono alla Regione Molise di eseguire gli approfondimenti tecnici necessari in

sede di progettazione esecutiva, con particolare riguardo all'ottenimento di possibili economie gestionali. Chiedono, inoltre, alla stessa regione di costituire un'adeguata struttura tecnico amministrativa di supporto al soggetto aggiudicatore. La delibera CIPE n. 98, ai fini dell'ammissione al finanziamento FAS, prevede che le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole siano recepite nel progetto esecutivo entro il 31 ottobre 2005.

Il Ministero delle politiche agricole, con nota del 15 settembre, formula una serie di prescrizioni.

Il CIPE, con delibera n. 153, approva in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento del costo complessivo di 77,5 Meuro.

2006

Il CIPE, con delibera n. 75, esclude l'intervento dal finanziamento a carico dei fondi FAS, ai sensi della delibera n. 98/2005.

Il CIPE, con delibera n. 99, prende atto che il soggetto aggiudicatore è il Consorzio Bonifica Integrale Larinese e che il costo complessivo è di 77,5 Meuro. Assegna, quindi, in via programmatica al soggetto aggiudicatore un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 76 Meuro. L'effettiva assegnazione del contributo è vincolata alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatore, entro due mesi dalla data di pubblicazione nella GU della delibera, "della rimodulazione del progetto, coerentemente con le disponibilità comprensive dell'assegnazione programmatica disposta".

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il CIPE, con delibera n. 147, ridetermina il "limite di spesa" in 75 Meuro e assegna in via definitiva il finanziamento dell'intervento.

2009

Nel 1° Atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra il Governo e Regione Molise, sottoscritto il 23 gennaio, le parti concordano che "il Governo, con riferimento al periodo 2009-2013, dia impulso alle procedure approvative e individui le coperture finanziarie per complessivi 435,8 Meuro verificando i casi in cui è possibile il ricorso a strumenti finanziari che prevedano il coinvolgimento di capitali privati (Partenariato Pubblico Privato, Project Financing ecc..)" per la realizzazione del completamento irrigazione del Basso Molise, con le acque dei Fiumi Biferno e Fortore, per 120 Meuro.

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Dalla Relazione del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese sullo stato del Procedimento dell'opera "Irrigazione del Basso Molise con le Acque dei Fiumi Biferno e Fortore - 1° Intervento" al 30 dicembre 2009" si rileva, tra l'altro, che a seguito della chiusura della fase di validazione del progetto esecutivo e del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione consortile, con deliberazione del Comitato Esecutivo del 29 novembre, ha approvato il progetto esecutivo e sta predisponendo il bando di gara e i relativi allegati. Si rileva inoltre che è in fase di determinazione la procedura per l'individuazione dell'Istituto di credito erogatore del mutuo per il finanziamento dei lavori.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011 Aprile

Il 24 febbraio, il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese pubblica il bando di gara per l'affidamento dei lavori di "irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento". Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 21 aprile 2011.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE

2002-2011 (marzo).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che l'avvio dei lavori è previsto per il 15 settembre 2011 e l'ultimazione, dopo 3 anni, il 15 settembre 2014.

2011 Dicembre

La Regione Molise, con DGR n. 563 del 26 luglio 2011, approva lo schema di Nuova Intesa Generale Quadro da sottoscrivere tra il Governo e la Regione Molise che individua il nuovo quadro di priorità della Regione in materia di infrastrutture. L'opera "Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore" è inserita tra le infrastrutture strategiche della componente storica.

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è inserita nelle stesse tabelle di aprile.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risulta in corso la gara d'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori. L'inizio dei lavori viene posticipato al 31 marzo 2012 e la loro ultimazione al 31 marzo 2015.

2012 Marzo

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2012, risulta ancora in corso la gara e l'avvio dei lavori viene posticipato a maggio 2012.

2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 1, opere confermate; allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS; Documento uno "due diligence".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risulta conclusa la gara, in data 18/05/2012, con l'aggiudicazione in via definitiva. Il RUP comunica inoltre che "La stessa sarà efficace a seguito di comprova dei requisiti in fase di verifica e delle risultanze del contenzioso in atto".

2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

2013 Giugno

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

2013 Ottobre

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, risultano avviati i lavori a febbraio 2013 e la loro ultimazione è programmata per agosto 2015.

2014 Giugno

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-7 Opere esterne al Core ed al Comprehensive Network Schemi Idrici Mezzogiorno; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del DEF 2013.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2014, risultano in corso i lavori.

2016 Marzo

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, risultano in corso i lavori e la loro ultimazione è posticipata a novembre 2017.

2016 Dicembre

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, risultano in corso i lavori, con un avanzamento del 41,03%.

2018 Maggio

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta aggiornato il costo complessivo in 78,3 milioni di euro. Risultano inoltre in corso i lavori, con uno stato di avanzamento del 54,92%, e la loro ultimazione è posticipata al 31 dicembre 2018.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	77,470 Fonte: Corte dei Conti
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2010	75,000 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	75,000 Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Costo al 30 giugno 2011	75,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Costo a giugno 2012	75,000 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Costo a dicembre 2012	75,000 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	75,000 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Costo ad agosto 2014	75,000 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	75,000 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Previsione di costo al 31 marzo 2016	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Previsione di costo al 31 dicembre 2016	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Previsione di costo al 31 maggio 2017	75,000 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Previsione di costo al 31 maggio 2018	78,268 Fonte: Consorzio di Bonifica Integrale Larinese

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	75,000 Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011	75,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012	75,000 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012	75,000 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013	75,000 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014	75,000 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014	75,000 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Disponibilità al 31 maggio 2018: **75,000**

Fondi Legge Obiettivo	29,003 Fonte: Delibera CIPE 147/2006
Fondi Legge Obiettivo	45,997 Fonte: Delibera CIPE 147/2006

Fabbisogno residuo al 31 maggio 2018: **3,268**

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Progettazione esecutiva affidata allo Studio FERRAUTO in data 24/11/2004.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	54.345.779,76
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio di Bonifica Integrale Larinese
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	923 giorni
Data bando:	24/02/2011

CIG/CUI: 069824305A
Data aggiudicazione: 18/05/2012
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CONSORZIO IMPRESE RIUNITE (capogruppo)
Codice fiscale aggiudicatario: 09530091009
Data contratto: 19/12/2012

Quadro economico:

Importo a base gara: 51.983.171,38
Importo oneri per la sicurezza: 2.362.608,38
Importo complessivo a base di gara: 54.345.779,76
Importo aggiudicazione: 36.915.452,44
Somme a disposizione: 20.654.220,24
Totale: 57.569.672,68
% Ribasso di aggiudicazione: 33,53
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Lavori affidati a: ATI - CONSORZIO IMPRESE RIUNITE (capogruppo) - CONSORZIO ACQUA E AMBIENTE (mandante) - SOC. COOP. EDILE MOLISANA (mandante cooptata).
Contratto in data 19/12/2012, registrato a Campobasso in data 28/12/2012 al n. 4543 - serie 1T.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 13/08/2015
Stato avanzamento importo: 21.490.415,65
Stato avanzamento percentuale: 54,92
Data effettiva inizio lavori: 01/02/2013
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/06/2018
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: sono in realizzazione i lavori di parte dell'adduttore; vasca biferno; opera di presa e impianto di sollevamento.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire: 9
Note: è stata attivata la procedura di accordo bonario - ex art. 240 del D Lgs 163/2006

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note: Si tratta di una sospensione parziale di alcune lavorazioni in data 05/08/2015, con ripresa in data 24/06/2016

Varianti:

Numero totale: 3
Giorni proroga totali: 90

Motivi:	
Altri motivi:	con la variante n.3 si è avuta una novazione dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori fissata in data 30/06/2018.
Importo:	36.771.308,00
Importo oneri sicurezza:	2.362.608,38
Somme a disposizione:	39.133.916,38
Totale:	78.267.832,76
Note:	Variante approvata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 132 comma 3 – 2° periodo e 169 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Molise del 4 Giugno 2004

Delibera CIPE 19/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004

del 29 Settembre 2004

Pre-CIPE del 20 Ottobre 2004

Delibera CIPE 98/2005

del 29 Luglio 2005

Delibera CIPE 153/2005

del 2 Dicembre 2005

Delibera CIPE 75/2006

del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 99/2006

del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 147/2006

del 17 Novembre 2006

1° Atto aggiuntivo Intesa Generale Quadro Governo e Regione Molise del 23 Gennaio 2009

Relazione del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese sullo stato del Procedimento dell'opera "Irrigazione del Basso Molise con le Acque dei Fiumi Biferno e Fortore - 1° Intervento" del 30 Dicembre 2009

Bando di gara Consorzio di Bonifica Integrale Larinese del 24 Febbraio 2011

Delibera Regione Molise n. 563 del 26 Luglio 2011

SITI INTERNET UFFICIALI
